

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

6º BIMESTRE – 2025

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL – SAG



**PLANO
PLURI
ANUAL**
2024-2027



Governo do Distrito Federal

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Ibaneis Rocha

VICE-GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL
Celina Leão

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA
Daniel Izaías de Carvalho

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Thiago Rogério Conde

SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Luiza Almeida Londe





Publicação elaborada pela

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

SUBSECRETÁRIA

Luiza Almeida Londe

EQUIPE TÉCNICA

Alexandre Bartolomeu Côrtes Rosa
Andrea Nunes Lazzarini
Danilo Costa Macêdo
Donaldo César Rodrigues
Erinaldo da Silva Lêla
Eudóxia Maria Machado da Silva Andrade
Fabrício Santos de Sousa
Gabriel Carlos Ribeiro Antunes
Gilberto de Castro Vasconcelos Neto
Hayk Carvalho Silva
João Carvalho Leal
Kaique dos Santos Mendes
Letícia Oni Pimenta Laurentino
Luiz Carlos de Oliveira
Marco Aurélio Teixeira
Maria Auxiliadora Fernandes
Maria Raquel de Almeida Zeferino
Maria Vitória Nava Silva do Carmo
Pedro Augusto César
Raianne Paiva Nogueira Lamounier
Sharlene Goncalves de Araujo

**SUPERVISÃO DAS PRINCIPAIS
REALIZAÇÕES**

Hayk Carvalho Silva

**PESQUISA E ORGANIZAÇÃO DO
CONTEÚDO**

Gabriel Carlos Ribeiro Antunes
Gilberto de Castro Vasconcelos Neto
Kaique dos Santos Mendes
Maria Vitória Nava Silva do Carmo

REVISÃO DO CONTEÚDO

Hayk Carvalho Silva

**PROJETO GRÁFICO, CAPA E
DIAGRAMAÇÃO**

Maria Vitória Nava Silva do Carmo

Anexo do Palácio do Buriti,
10º andar,
Praça do Buriti,
Zona Cívico-Administrativa,
CEP 70075-900 / Brasília – DF
www.seec.df.gov.br

**PLANO
PLURI
ANUAL**
2024-2027



SUMÁRIO

<u>Sobre o Relatório</u>	05
<u>Análise dos Dados</u>	07
<u>Acompanhamento das Metas e Prioridades da LDO</u>	18
<u>Acompanhamento das Ações de Conservação do Patrimônio</u>	20
<u>Acompanhamento das Obras contratadas pelo GDF</u>	22
<u>Realizações em Destaque</u>	25
<u>SAG 2026 - Cronograma 1º Bimestre</u>	43

SOBRE O RELATÓRIO

A Subsecretaria de Planejamento Governamental (SUPLAN) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal a Portaria nº 80, de 28 de janeiro de 2026, dando publicidade ao Relatório de Desempenho Físico-Financeiro relativo ao 6º bimestre de 2025.

O mencionado relatório contém as ações efetivamente executadas de janeiro a dezembro de 2025, extraídas do SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental, e está disponível no site da Secretaria de Estado de Economia – SEEC.

Outrossim, contém o acompanhamento da execução física e financeira das ações de Governo previstas no Plano Plurianual – PPA 2024-2027¹ (ano-base 2025) e desdobrada na Lei Orçamentária Anual – LOA/2025², auxiliando o processo de avaliação da eficiência e da eficácia da gestão, a transparência da aplicação dos recursos públicos, além de permitir o conhecimento do conjunto de ações de governo em seus aspectos quantitativos, qualitativos, espacial e temporal.

¹ Lei n.º 7.378 de 29 de dezembro de 2023

² Lei n.º 7.650 de 30 de dezembro de 2024

Após a publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA) e detalhamento do crédito orçamentário disponível, os gestores de unidades orçamentárias, responsáveis pela execução e implementação das políticas públicas, definem o que será executado, quando e como será a execução ao longo do exercício, ou seja, quais serão as etapas (entregas) necessárias para a implementação de cada Programa de Trabalho. Os Agentes de Planejamento das Unidades Orçamentárias, bimestralmente, realizam o levantamento, a análise e a inserção das informações no Sistema de Acompanhamento Governamental (SAG).

Conforme estabelecido no Manual de cadastramento e acompanhamento de etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental (SAG), todos os Programas de Trabalho constantes da Lei Orçamentária Anual devem conter, no mínimo, uma etapa cadastrada no SAG no decorrer do exercício, à exceção daqueles inseridos por meio de emenda parlamentar que não apresentarem empenho. No entanto, no **1º bimestre** do exercício, é **facultado** às Unidades Orçamentárias cadastrar **apenas**:

- Etapas pertencentes a programas de trabalho com valores empenhados ou contratualizados (Estatais) de cunho institucional ou

oriundos de emendas parlamentares;

- Etapas procedentes de ano anterior, tratando-se das ações do tipo projeto que no 6º bimestre tenham encerrado o exercício nos estágios “NO – Andamento Normal”, “PA – Paralisada” ou “AT – Atrasada” e, deste modo, ensejam continuidade no presente exercício.

A partir do **2º bimestre**, entretanto, é **obrigatório** que todos os demais programas de trabalho institucionais contidos da LOA, independentemente da ocorrência de empenho, além de emendas parlamentares que tiverem empenho, tenham ao menos uma etapa correspondente cadastrada. Deste modo, a análise e a compreensão das informações gerenciais apresentadas a seguir deve ser realizada à luz desse contexto.

A seguir, são apresentadas informações gerenciais extraídas do SAC e as realizações em destaque no 6º bimestre de 2025, enviadas pelas respectivas unidades orçamentárias.



GDF reabre Autódromo Internacional de Brasília. Agência Brasília (27/11/2025).

ANÁLISE DOS DADOS

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS DO SAG 6º BIMESTRE DE 2025


ESTÁGIO DAS ETAPAS

Até o 6º bimestre de 2025, foram cadastradas 3.356 etapas pelas unidades orçamentárias. Cada etapa é classificada sob um estágio no SAG, que evidencia a compatibilidade entre a execução física e o cronograma previsto.

A maioria das etapas foi classificada sob o estágio “**Concluída**” (68,83%), ou seja, aquelas que tiveram sua execução física finalizada.

Em seguida, encontram-se as etapas no estágio “**Não Iniciada**” (25,21%), sendo aquelas que não apresentam execução física e que têm o prazo previsto de início expirado.

Estágios das Etapas
SAG 2025 - 6º bimestre

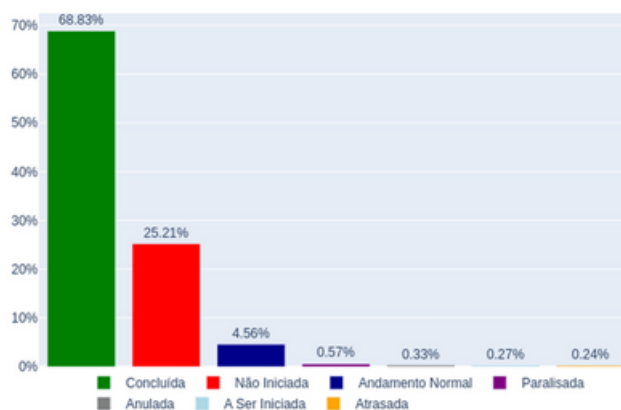

Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/12/2025


Além disso, 4,56% se caracterizam por serem aquelas com execução física compatível com o cronograma previsto, sendo classificadas sob o estágio **"Andamento Normal"**.

Por fim, os estágios **"Paralisada"** (0,57%), **"Anulada"** (0,33%), **"A Ser Iniciada"** (0,27%) e **"Atrasada"** (0,24%) representaram, em conjunto, menos de 1,41% das ocorrências.

O panorama geral demonstra que a maior parte das etapas, representando 68,83% do total, encerrou o exercício no estágio **"Concluída"**. Este comportamento está alinhado com as instruções de encerramento, uma vez que as ações classificadas como atividades e operações especiais, por sua natureza contínua, devem obrigatoriamente ser finalizadas ao término do ano, assim como os projetos fisicamente terminados. Já o percentual de 25,21% de etapas na situação **"Não Iniciada"** reflete aquelas ações que não tiveram execução física ou financeira, ou cujos empenhos foram cancelados, por exemplo. Embora seja um procedimento sistêmico válido para registrar a ausência de execução, esse volume expressivo pode demandar, nos Relatórios de Etapas Programadas em desvio e de Gestão, explicações sobre os motivos que impediram a realização dessas políticas públicas, como frustrações de receita ou impedimentos legais.


Um ponto que merece atenção especial na análise qualitativa dos Relatórios refere-se ao resíduo de 0,27% das etapas que permaneceram no estágio **"A Ser Iniciada"**. As normas de encerramento estabelecem que nenhuma etapa deveria permanecer nesta classificação no 6º bimestre, devendo ter migrado para estágios de execução ou de não início. As etapas nesse estágio foram incluídas em Nota Explicativa, a qual compõe o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro (6º bimestre), publicado no site da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.

Quanto às etapas classificadas como **"Andamento Normal"**, que somam 4,56%, a validação recai sobre a natureza da ação orçamentária. As instruções restringem o uso deste estágio no encerramento do exercício exclusivamente a projetos plurianuais iniciados que possuam dotação na LOA do exercício seguinte, não sendo aplicável a atividades contínuas. Por fim, os estágios de exceção, como **"Paralisada"** e **"Atrasada"**, representam uma parcela reduzida do conjunto e sinalizam compromissos de gestão para o próximo exercício, visto que tais etapas deverão ser objeto de novo cadastramento com datas retroativas no ano subsequente para garantir a continuidade do monitoramento.

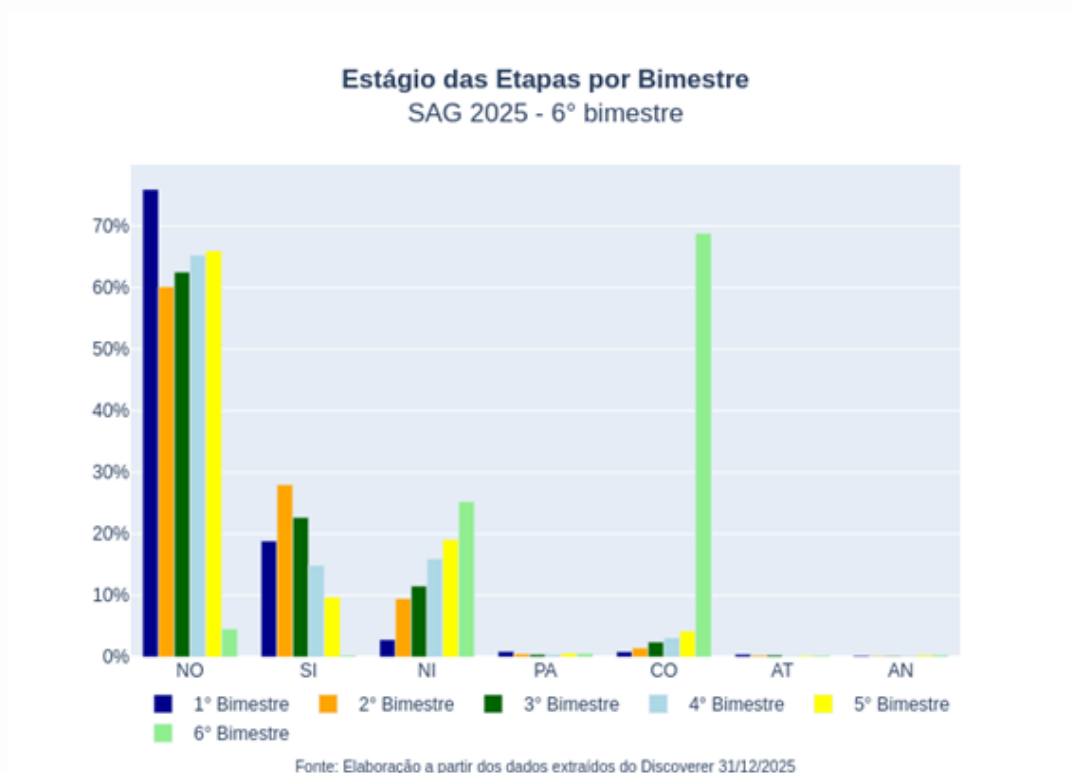

Conforme as instruções do SAG, são considerados **regulares** os estágios “A Ser Iniciada”; “Andamento Normal”; e “Concluída”.

Por outro lado, quando há descompasso entre execução física e cronograma previsto, a etapa é classificada sob um dos seguintes estágios: “Não Iniciada”, “Paralisada”, “Atrasada” ou “Anulada”. Nessa condição, há o enquadramento como **Desvio**, sendo necessário que a unidade orçamentária informe a Causa, Natureza, Origem e o Detalhamento, visando esclarecer as razões para esta incompatibilidade entre o planejado e o executado.

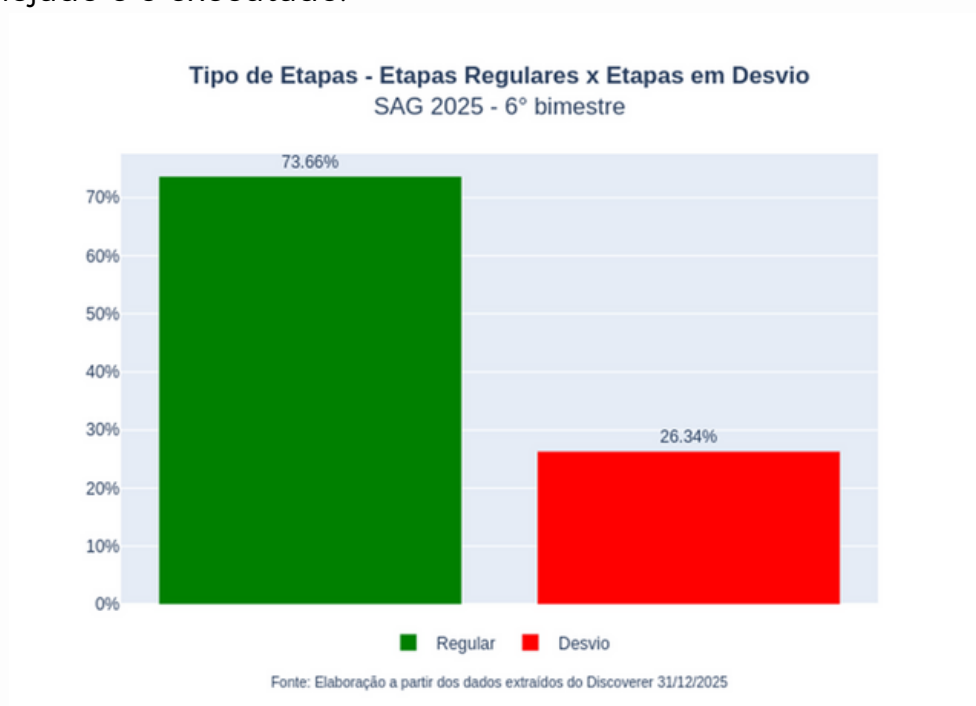


Depreende-se do gráfico que 26,34% das etapas encerraram o 6º bimestre em desvio (884 etapas), ao passo que 73,66% foram classificadas sob estágios regulares (2.472 etapas).

Ao observar o grupo da Situação Regular, composto majoritariamente pelas etapas "**Concluídas**" (68,83%), seguidas pelas em "**Andamento Normal**" (4,56%) e pelo resíduo "**A Ser Iniciada**" (0,27%), nota-se uma forte aderência às orientações da SUPLAN que exigem o encerramento das ações contínuas ao final do ano. A predominância do estágio "**Concluída**" é o comportamento esperado para o 6º bimestre, indicando que a unidade orçamentária realizou a baixa das suas atividades de manutenção e dos projetos finalizados. Já a parcela de 4,56% em "**Andamento Normal**" sugere um filtro criterioso, compatível com a regra que limita esse estágio apenas a projetos plurianuais que terão continuidade orçamentária no ano seguinte. Contudo, a presença de 0,27% de etapas como "**A Ser Iniciada**" configura uma irregularidade processual, embora não seja estágio classificado como desvio, pois as instruções vedam a permanência neste estágio no último bimestre. Embora estatisticamente irrelevante no volume total, essa fração exige atenção, pois essas etapas deveriam ter evoluído para uma situação definitiva (iniciadas ou não iniciadas).

Por outro lado, o bloco de Situação em Desvio (26,34%) é dominado quase inteiramente pelas etapas "**Não Iniciadas**" (25,21%), com participações marginais de etapas "**Paralisadas**", "**Anuladas**" ou "**Atrasadas**". A concentração expressiva em "**Não Iniciada**" sinaliza que um quarto do planejamento não saiu do papel, o que é permitido sistemicamente caso não tenha havido execução física ou financeira, mas que acende um alerta sobre a eficácia do planejamento orçamentário. Para o encerramento do exercício, esse status é tecnicamente correto para refletir o insucesso da ação ou o cancelamento de empenhos, diferenciando-se dos estágios de "**Paralisada**" e "**Atrasada**". Estes últimos, embora representem uma parcela mínima do desvio, impõem à UO a obrigação de recadastramento no exercício seguinte, mantendo o histórico de interrupção ou atraso. Portanto, a análise desses dois grandes grupos revela uma execução polarizada: o que foi iniciado tendeu a ser concluído com êxito (Regular), mas uma parcela significativa do planejamento sequer chegou a ser executada (Desvio), demandando justificativas quanto aos impedimentos encontrados.

Tipo de Etapas - Etapas Regulares x Etapas em Desvio por Bimestre
SAG 2025 - 6º bimestre

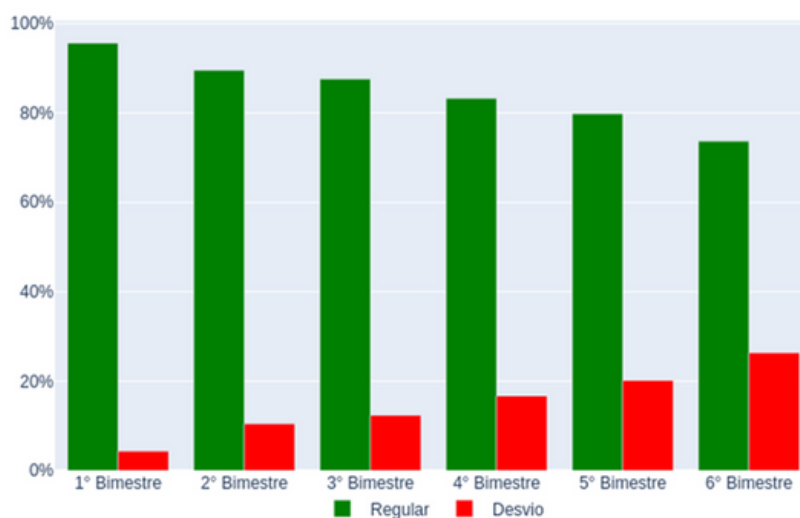


Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/12/2025

Para melhor compreensão quanto ao desvio, segue análise de suas classificações quanto à natureza e causa.


No que se refere à Natureza, a **Administrativa** foi a mais representativa, com 58,48% dos casos. Destacaram-se ainda as naturezas **Orçamentária** (19,8%) e **Técnica** (12,33%).

Além disso, as naturezas **Jurídica**, **Política**, **Financeira** e **Fenômenos Naturais** alcançaram percentual inferior a 10% do total, em conjunto.

Naturezas de Desvio das Etapas
SAG 2025 - 6º bimestre

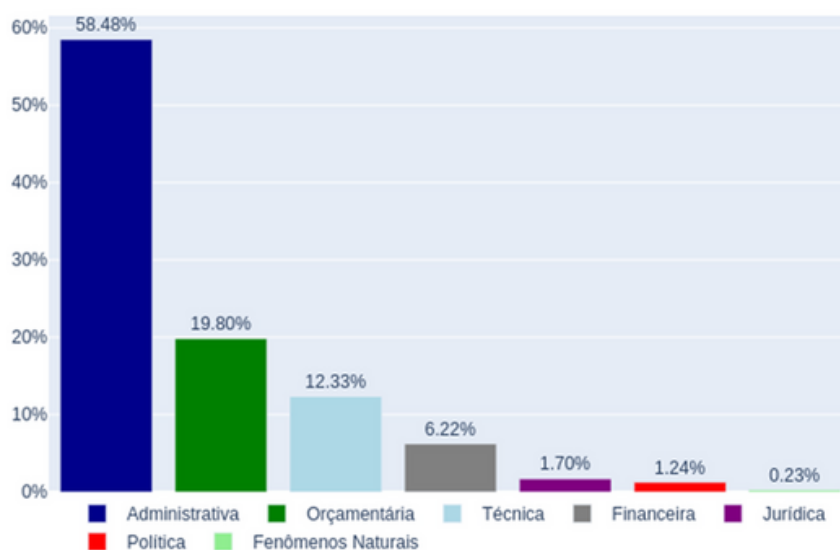

Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/12/2025

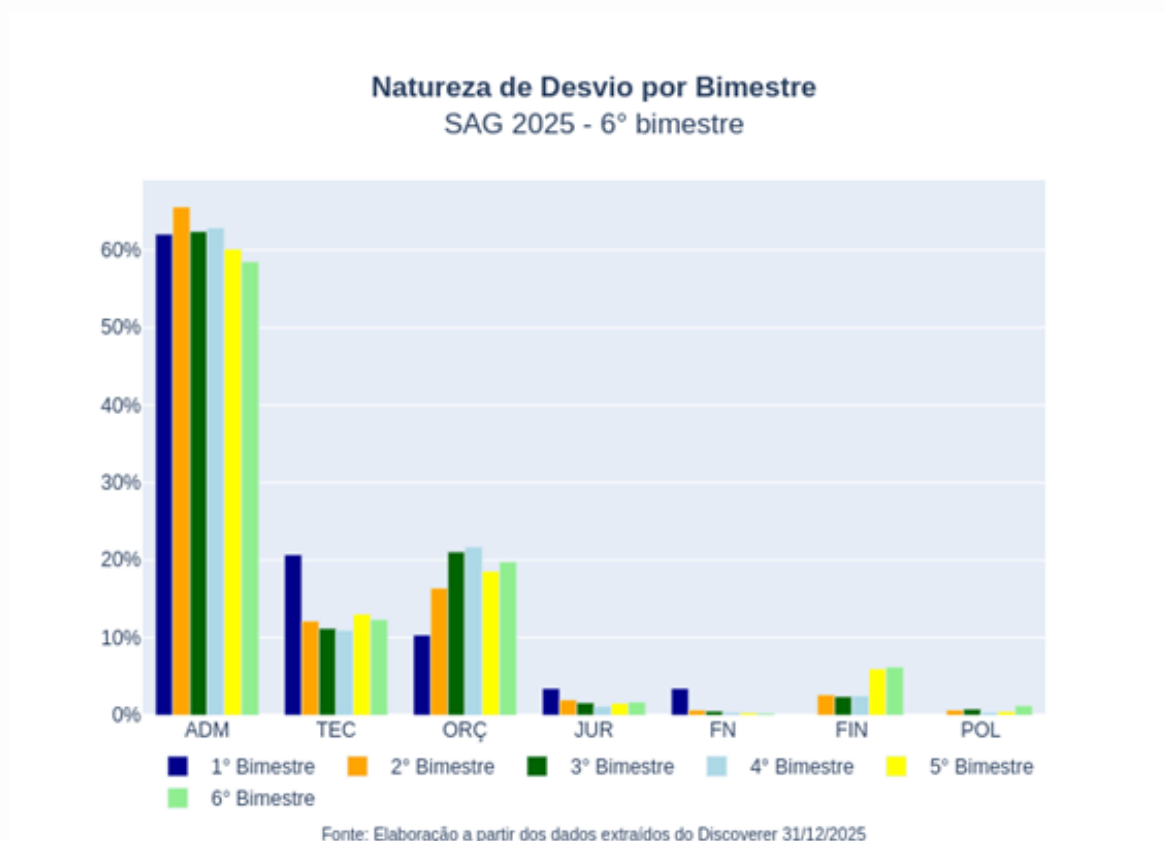


Já categorizando as etapas em desvios segmentados pelas **Causas**, as ocorrências permanecem concentradas na causa **OCD – Outras causas de desvio** (36,54%), seguida ordenadamente pelas **APU – Alteração na programação da unidade executiva** (17,19%), **ICO – Insuficiência de créditos orçamentários** (13,01%), **IRF – Insuficiência de recursos financeiros** (5,66%), **IPT – Indefinição / reavaliação de projeto técnico** (5,66%); e **CCB - Crédito contingenciado ou bloqueado** (5,54%).

Todas as outras causas de desvio representaram, em conjunto, cerca de 16% das justificações apresentadas.


A Causa **IRM – Insuficiência de Recursos Materiais** foi a única não registrada em nenhum momento dos seis bimestres.

Causas de Desvio das Etapas SAG 2025 - 6º bimestre

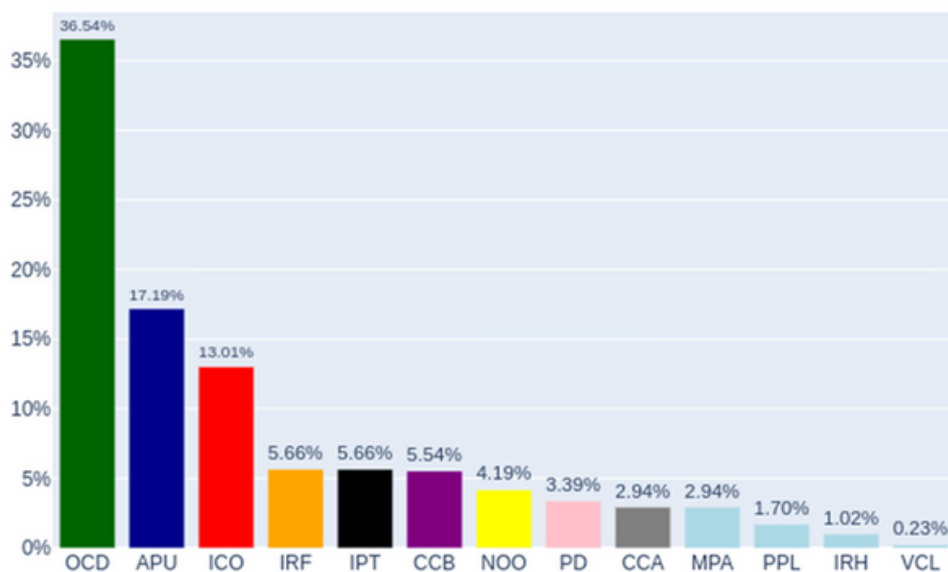

Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/12/2025

Causas de Desvio por Bimestre SAG 2025 - 6º bimestre

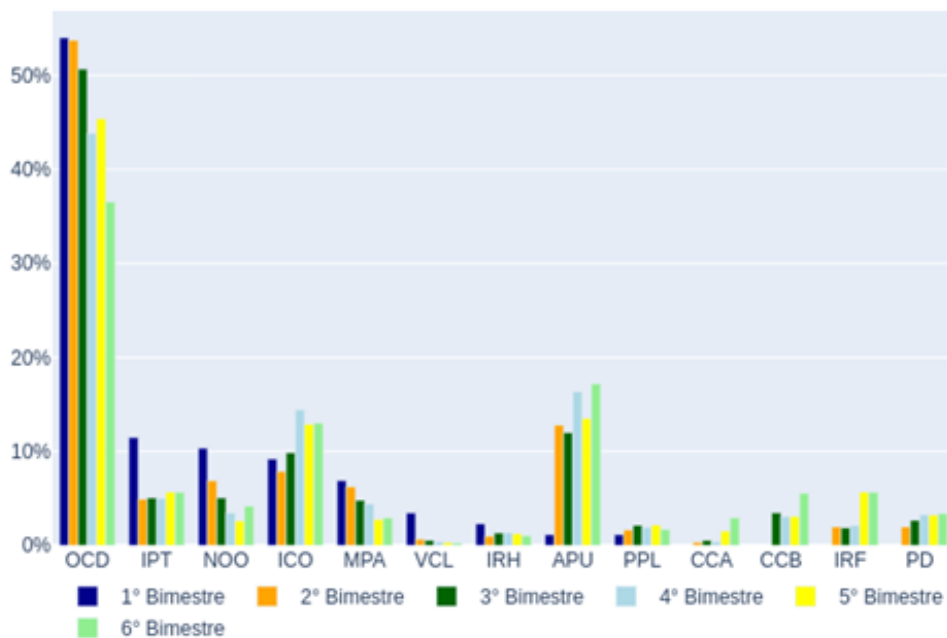


Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/12/2025

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À ESFERA ORÇAMENTÁRIA

Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) compreendem as dotações referentes à Administração Direta e Indireta, ao passo que as Estatais Independentes³ possuem parte de seus recursos contidos no Orçamento de Investimentos⁴ (OI), além de outra parte no denominado Dispêndios das Estatais Independentes.

Ressalta-se que os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) não são acompanhados no SAG, visto que não constam da Lei Orçamentária Anual - LOA.

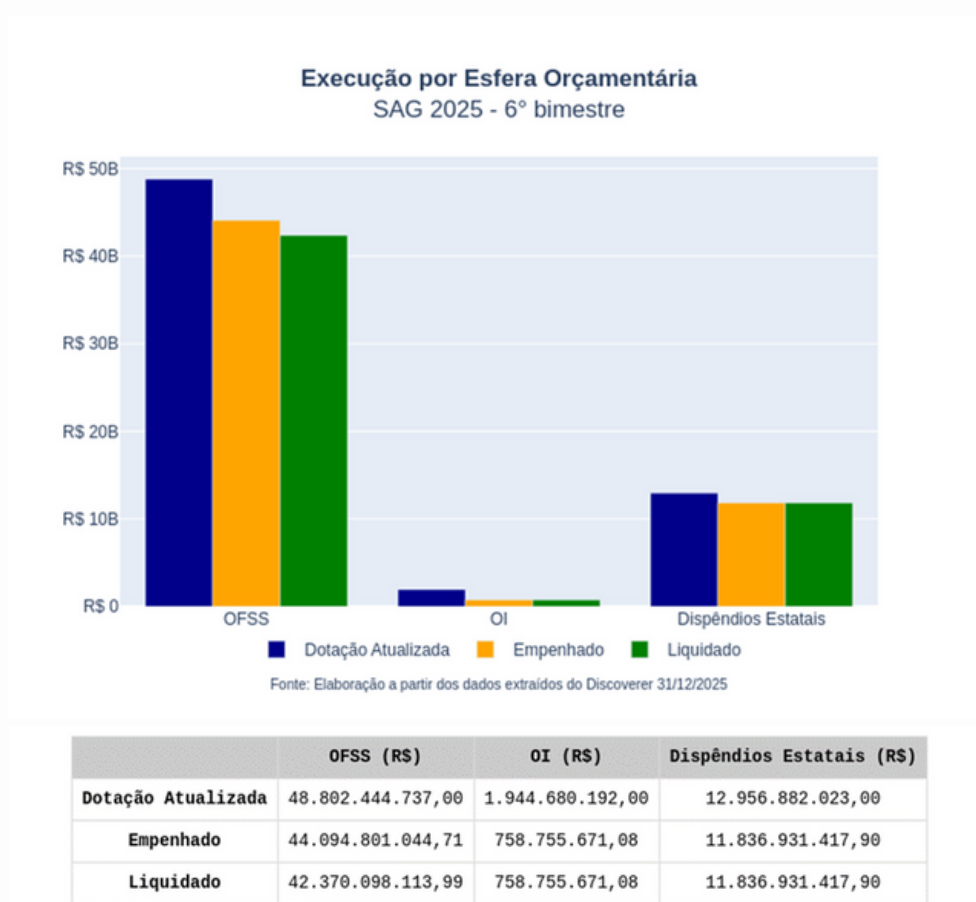


Destaca-se que os valores apresentados referem-se aos programas de trabalho cadastrados no SAG. Assim, os recursos evidenciados são de etapas cadastradas no SAG, ligeiramente menor que aqueles constantes no controle da execução orçamentária (RREQ), devido à faculdade de cadastramento de etapas nos casos de programas de trabalho relativos a emendas parlamentares sem empenho, conforme Manual.

³ Estatais independentes não possuem as fases da execução orçamentária do empenho e da liquidação, apenas a execução (similar ao estágio liquidação). Portanto, foram considerados como empenho e liquidação os valores de execução no orçamento de investimento e nos dispêndios estatais.

⁴ Parágrafo 4º do artigo 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AOS EIXOS TEMÁTICOS DO PPA

Agrupando as etapas cadastradas dos programas de trabalho relacionados aos 8 eixos temáticos do Plano Plurianual de 2024-2027 e Programa de Operações Especiais (que não contribuem para a manutenção, a expansão ou o aperfeiçoamento das ações de governo⁵), é possível constatar a composição das etapas do SAG por tipo de estágio para cada eixo, conforme demonstrado a seguir.

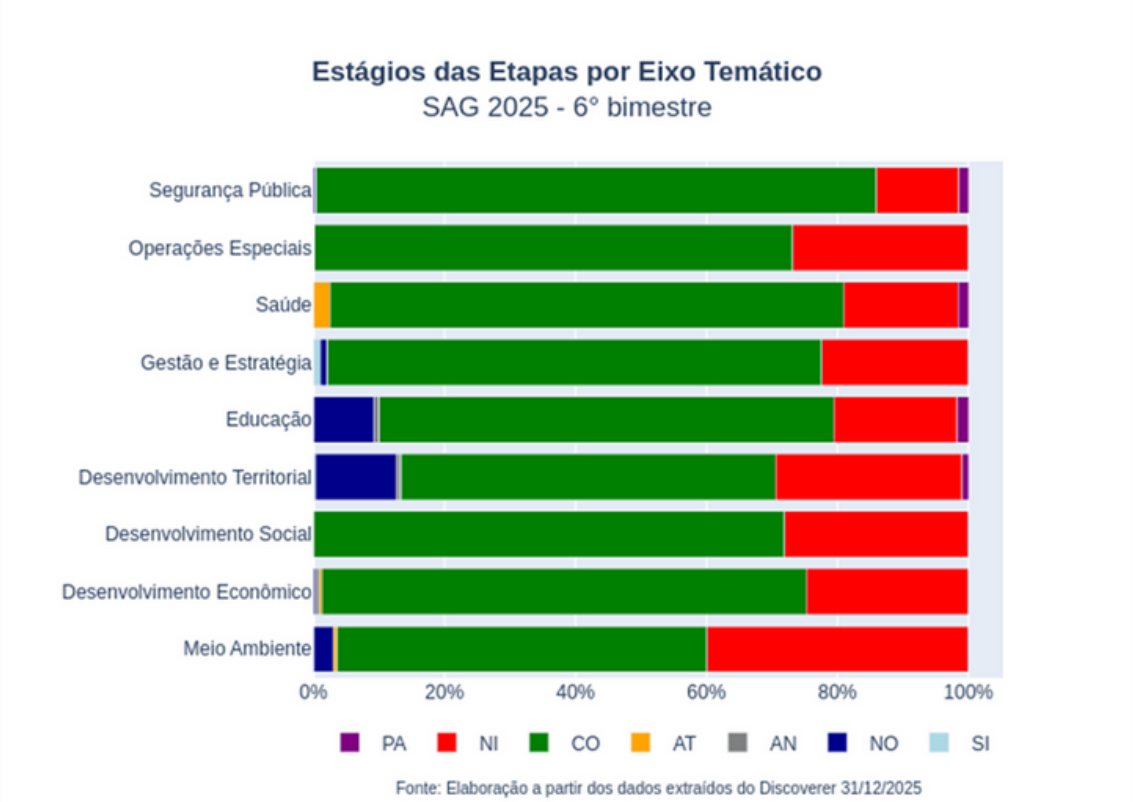

Eixo PPA	SI	NO	AN	AT	CO	NI	PA
Desenvolvimento Econômico	0,00%	0,31%	0,62%	0,31%	74,07%	24,69%	0,00%
Desenvolvimento Social	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,86%	28,14%	0,00%
Desenvolvimento Territorial	0,31%	12,32%	0,62%	0,10%	57,25%	28,47%	0,93%
Educação	0,00%	9,24%	0,84%	0,00%	69,33%	18,91%	1,68%
Gestão e Estratégia	1,00%	1,00%	0,20%	0,00%	75,35%	22,44%	0,00%
Meio Ambiente	0,00%	3,07%	0,00%	0,61%	56,44%	39,88%	0,00%
Saúde	0,00%	0,00%	0,00%	2,58%	78,35%	17,53%	1,55%
Segurança Pública	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%	85,51%	12,56%	1,45%
Operações Especiais	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	72,98%	26,81%	0,00%

⁵ Parágrafo 5º do artigo 3º da Lei 7.378/2023

Estratificando a execução orçamentária pelos eixos temáticos, é possível notar que para o **Eixo Educação**, que possui R\$ 9,27 bilhões de dotação autorizada, foram liquidados até o final do 6º bimestre mais de R\$ 8,8 bilhões. Por sua vez, no **Eixo Desenvolvimento Territorial**, com dotação autorizada de R\$ 13,51 bilhões, foram liquidados R\$ 10,79 bilhões para alcançar as metas propostas nas etapas cadastradas no SAG.

Ademais, mesmo não sendo eixo temático, as **Operações Especiais** são aquelas com a maior parte dos recursos dotados (R\$ 17,17 bilhões) e liquidados (R\$ 15,1 bilhões). Na prática é possível exemplificar a aplicação desses recursos para o cumprimento de sentenças judiciais, amortização da dívida pública, encargos financeiros.

Segue a execução orçamentária pelos oito Eixos Temáticos do Plano Plurianual de 2024-2027 e pelo Programa de Operações Especiais de todas as unidades orçamentárias do Distrito Federal até o final do 6º bimestre, considerando os Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social, além dos Orçamentos de Investimentos e Dispendios das Estatais Independentes.



Eixo PPA	Dotação Autorizada (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)
Desenvolvimento Econômico	5.019.322.306,00	4.171.220.742,59	4.074.866.037,20
Desenvolvimento Social	2.673.117.470,00	2.489.867.167,41	2.411.752.675,24
Desenvolvimento Territorial	13.511.500.477,38	11.231.722.038,36	10.788.507.877,25
Educação	9.270.468.347,00	9.058.779.245,35	8.837.626.972,44
Gestão e Estratégia	6.589.380.909,62	6.163.897.630,04	5.897.871.879,23
Meio Ambiente	429.513.071,00	337.206.936,22	326.969.214,10
Saúde	6.528.329.207,00	6.009.202.511,61	5.614.318.801,05
Segurança Pública	2.515.910.478,00	2.029.957.386,05	1.914.217.769,49
Operações Especiais	17.166.464.686,00	15.198.634.476,06	15.099.653.976,97
TOTAL	63.704.006.952,00	56.690.488.133,69	54.965.785.202,97




Equipes iniciam concretagem e instalação de bloquetes nas novas calçadas da W3 Norte. Agência Brasília (07/11/2025).

ACOMPANHAMENTO DAS METAS E PRIORIDADES DA LDO

Foram definidos 57 Programas de Trabalho, devido ao seu impacto, como metas e prioridades da administração distrital para o exercício de 2025⁶, conforme Anexo I da LDO, e estes foram desmembrados em 98 etapas cadastradas no SAG.

No 6º bimestre, dentre essas etapas, 62,24% estavam classificadas sob o estágio “**Concluída**”; cerca de 20,41% das etapas estavam sob “**Andamento Normal**”; e 17,35% classificadas em desvio, sob os estágios “**Paralisada**” (8,16%), “**Não Iniciada**” (6,12%), “**Anulada**” (2,04%) e “**Atrasada**” (1,02%).

Estágios das Etapas do Anexo I da LDO 2025 - Metas e Prioridades
SAG 2025 - 6º bimestre

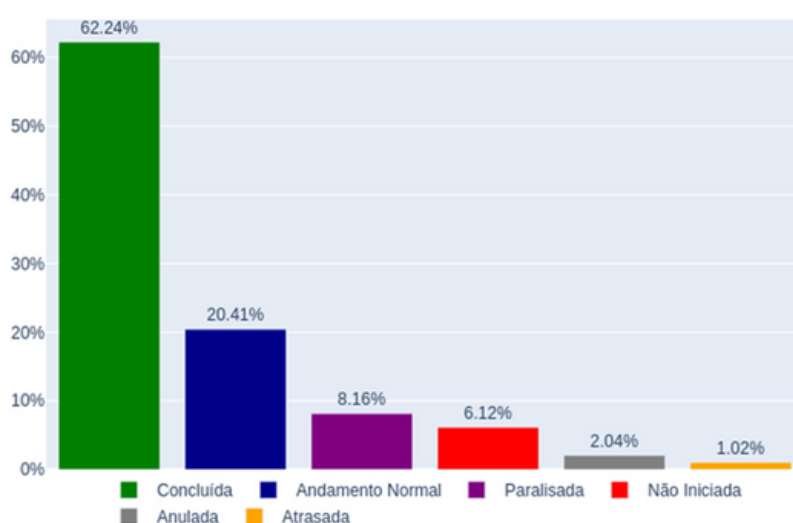

Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/12/2025

⁶ Anexo de Metas e Prioridades da LDO, publicado no Anexo I da Lei 7.549/2024, alterado pelo Anexo Único da Lei nº 7.571/2024

Em relação à execução orçamentária dessas etapas, até o 6º bimestre, foram empenhados R\$ 5,92 bilhões e liquidados R\$ 5,68 bilhões nestes programas de trabalho definidos como prioritários pelo poder público distrital.



Nova rede de captação e escoamento de água da chuva em Vicente Pires leva mais segurança para a população. Agência Brasília (13/11/2025).

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO


Conforme apresentado na seção 3 do Manual, o Orçamento Público Distrital apresenta de forma segregada os dispêndios com a Conservação do Patrimônio Público Imobiliário. A partir do rol de 14 ações orçamentárias estabelecidas, é possível estratificar os dados do SAG

quanto ao acompanhamento destas ações para a conservação do patrimônio público distrital.

No 6º bimestre, estavam cadastradas 210 etapas referentes a 187 Programas de Trabalho relacionados à Conservação do Patrimônio Público.

Destas, 70,48% encontram-se em “**Concluída**”; 28,57% como “**Não Iniciada**”; e 0,95% sob o estágio “**A Ser Iniciada**”.

Estágios das Etapas de Conservação do Patrimônio
SAG 2025 - 6º bimestre

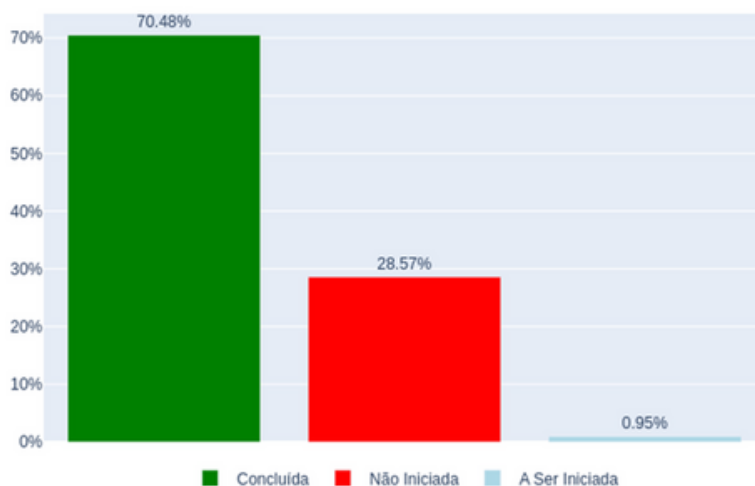

Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 31/12/2025

Analisando a execução orçamentária dessas etapas, até o final do 6º bimestre, foram empenhados R\$ 1,72 milhões e liquidados R\$ 1,63 milhões nos programas de trabalhos para Conservação do Patrimônio Público Imobiliário do Distrito Federal.




Recapeamento da DF-009 leva mais segurança ao principal acesso ao Lago Norte. Agência Brasília (16/11/2025).

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO GDF

Até o 6º bimestre, foram cadastradas no SAG 540 etapas relacionadas a Obras. Quanto aos estágios, 35,0% se encontram sob “**Concluída**”; 24,63% foram enquadradas como “**Andamento Normal**”; e 40,38% encontram-se em desvio, sendo enquadradas como: “**Não Iniciada**” (34,63%);



“**Paralisada**” (3,52%); “**Atrasada**” (1,3%); e “**Anulada**” (0,93%).

Das 540 etapas, 385 foram localizadas em mais de uma Região Administrativa (RA), como em todo Distrito Federal ou macrorregiões, consoante consta do Manual (Tabela 6 – Novas Regionalizações).

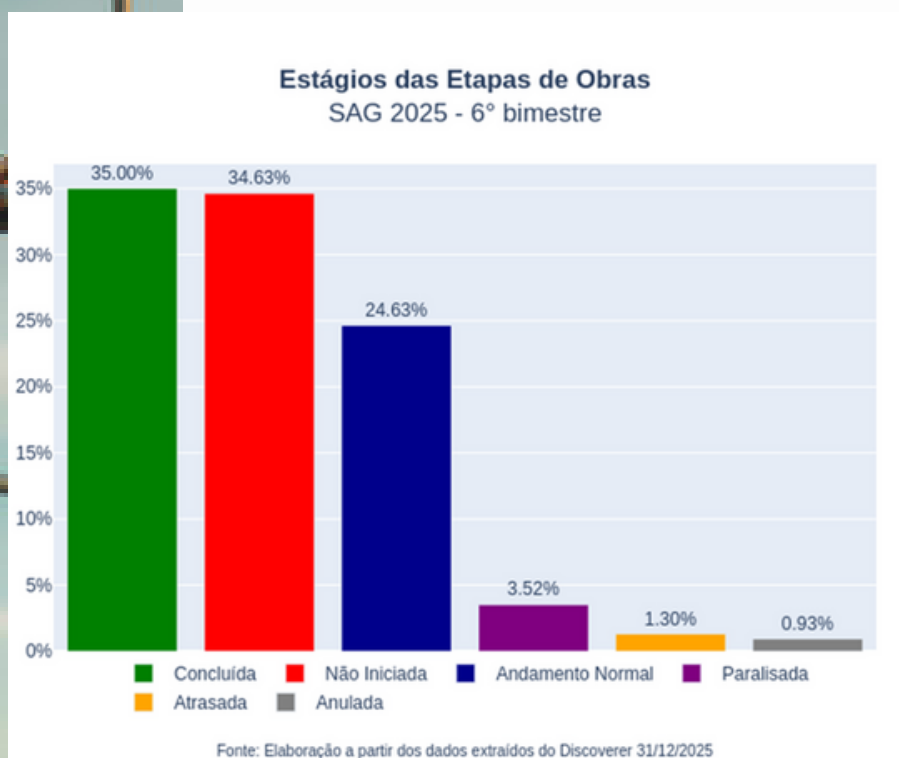

Das 155 restantes, as que mais tiveram obras cadastradas no SAG foram as Regiões Administrativas: **Plano Piloto** (RA I), com 21 etapas; **Santa Maria** (RA XIII), com 13 etapas; e **Recanto das Emas** (RA XV), **Candangolândia** (RA XIX) e **Sobradinho II** (RA XXVI), cada uma com 10 etapas.

Para facilitar a compreensão, segue mapa da distribuição geográfica das Regiões Administrativas, bem como do quantitativo das etapas relativas a obras.

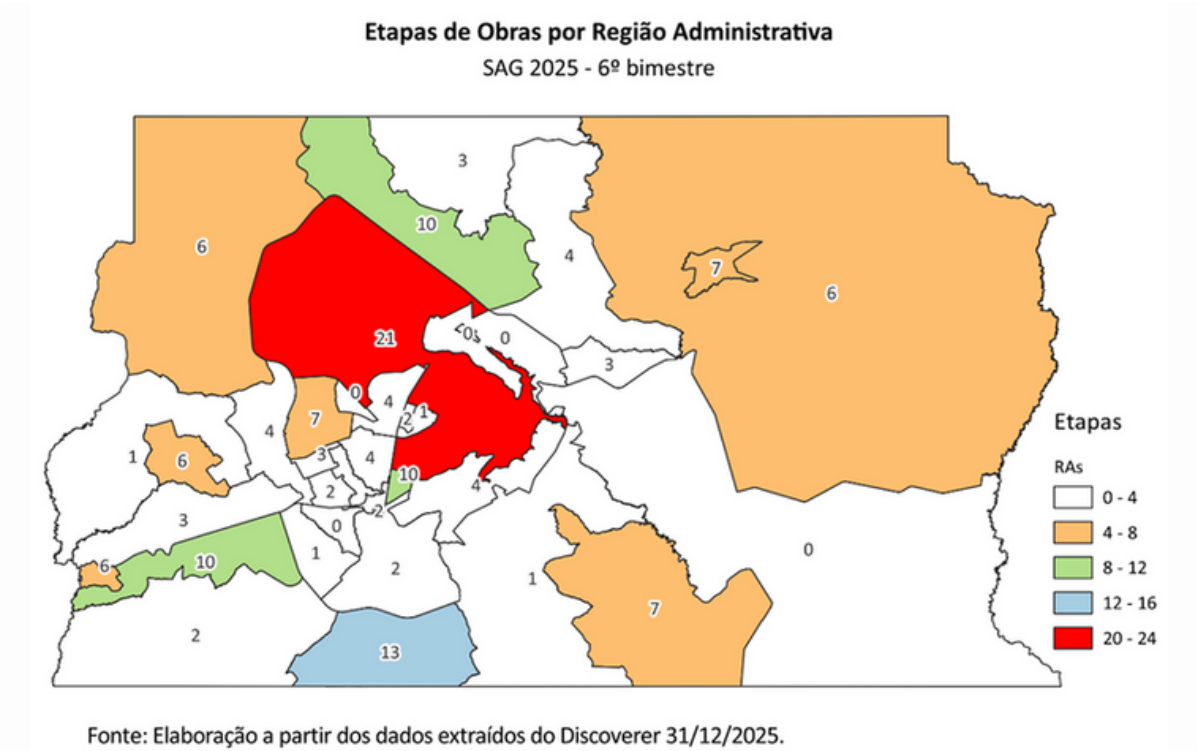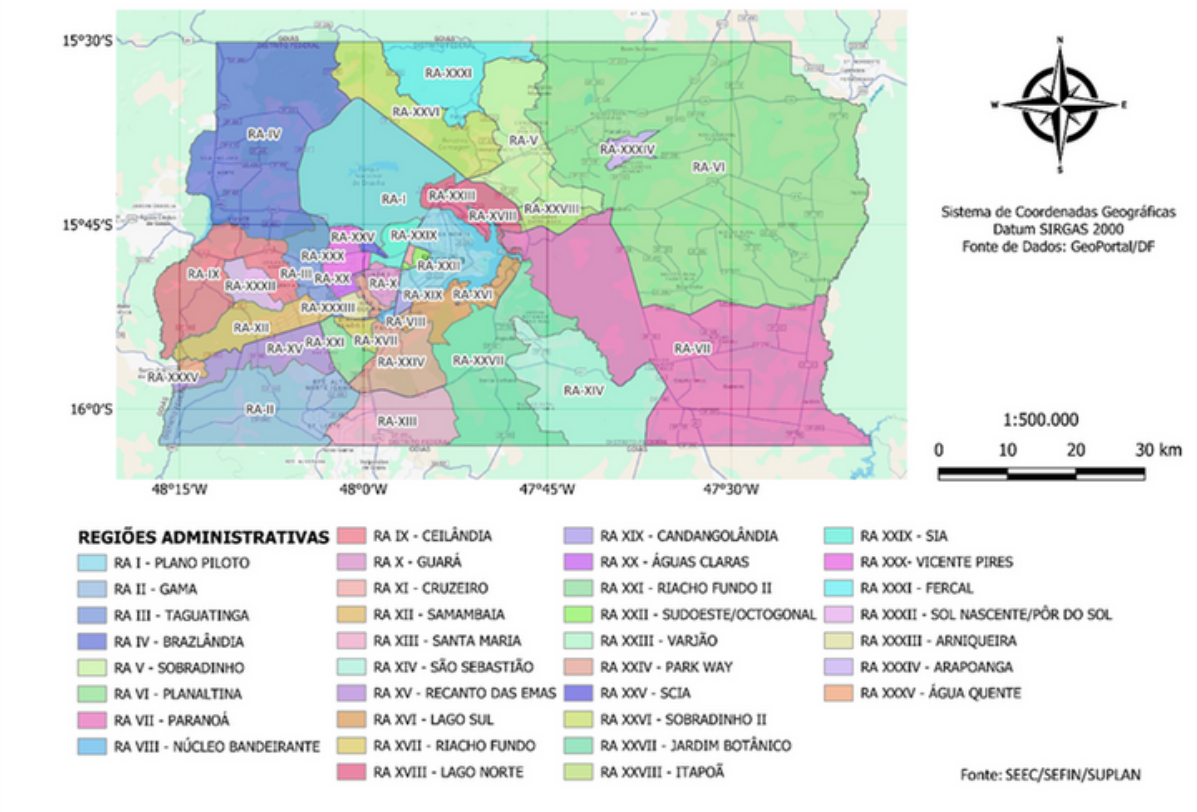

A seguir, constam os tipos de obras das etapas, conforme classificação constante no Manual (Tabela 1 – Código de Obras).

TIPO DE OBRAS	QUANTIDADE	PERCENTUAL (%)
Obras e Edificações Públicas	104	19,26%
Obras de Urbanização	99	18,33%
Obras de Transporte	86	15,93%
Obras para fins de Educação	73	13,52%
Obras para fins Desportivos e de Lazer	44	8,15%
Obras no Sistema de Saneamento	32	5,93%
Obras de Energia Elétrica e Iluminação Pública	25	4,63%
Obras para fins de Saúde	18	3,33%
Obras para fins de Preservação do Meio Ambiente	11	2,04%
Serviços de Engenharia	10	1,85%
Obras para fins de Segurança	8	1,48%
Obras para fins de Assistência Social	8	1,48%
Obras para fins Culturais	7	1,30%
Obras para fins Habitacionais	6	1,11%
Obras para fins de Desenvolvimento Econômico	5	0,93%
Obras para fins de Agricultura	2	0,37%
Obras para fins de Segurança de Trânsito	2	0,37%
TOTAL	540	100,00%

As principais unidades orçamentárias que cadastraram etapas relativas a obras no 6º bimestre estão discriminadas a seguir:

- 1) Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal: 64 etapas;
- 2) Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal: 60 etapas;
- 3) Departamento de Estradas de Rodagem: 60 etapas;
- 4) Companhia Urbanizadora da Nova Capital: 39 etapas; e
- 5) Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal: 33 etapas.



Vigas da nova ponte erguida entre Guará e Núcleo Bandeirante são içadas. Agência Brasília (01/12/2025).

REALIZAÇÕES DE DESTAQUE

A seguir, apresentamos as realizações de destaque dentre as etapas cadastradas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG no 6º bimestre de 2025, conforme apontamentos das unidades orçamentárias do Complexo Administrativo do Distrito Federal.



Drenar DF cumpre objetivo e reduz impacto das chuvas no início da Asa Norte. Agência Brasília (01/12/2025).

REALIZADA A CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA PRIMEIRA TURMA DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (GTI)

A colação de grau da primeira turma do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação (GTI) da UnDF, realizada em 16 de dezembro no Campus Norte, foi marcada por emoção, diversidade e compromisso com a educação pública. A cerimônia reuniu familiares e amigos e simbolizou um marco na trajetória da universidade. Em seu discurso, a reitoria destacou o caráter promissor da UnDF e a formação voltada à integração entre conhecimento e prática. O orador da turma ressaltou a diversidade e a força das políticas de acesso à universidade pública, enquanto a paraninfa enfatizou o compromisso ético e social dos novos gestores da tecnologia.



18.203



1º FESTIVAL DE CURTAS CAPIVARA DE OURO DA UNDF

O 1º Festival de Curtas Capivara de Ouro, realizado pela Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), teve como objetivo incentivar e premiar produções audiovisuais universitárias do Distrito Federal e do Entorno. Com o tema Cotidianos Invisíveis, o evento ocorreu entre 26 e 28 de novembro, no Campus Norte, e foi idealizado por docentes e estudantes do curso de Produção Cultural, envolvendo diferentes semestres em todas as etapas de organização.

A programação contou com exibição de curtas da UnDF e da RIDE, além de oficinas práticas nas áreas do audiovisual. O encerramento contou com apresentações musicais e o festival premiou produções em cinco categorias, com votação de júri popular e oficial. A iniciativa reforçou o papel da UnDF no fomento à cultura e na formação prática dos estudantes, fortalecendo o audiovisual universitário no DF e na RIDE.





ESCS CELEBRA FORMATURAS DE MEDICINA E ENFERMAGEM

A Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs), vinculada à Universidade do Distrito Federal (UnDF), realizou, nos dias 9 e 10 de dezembro, as cerimônias de colação de grau das turmas de Medicina e Enfermagem, no auditório da Fepecs, reunindo familiares, docentes e profissionais da saúde. A 20ª turma de Medicina formou 76 novos médicos, em uma solenidade marcada pela emoção, pelo compromisso ético e pelo reconhecimento dos desafios enfrentados desde o ingresso durante a pandemia de Covid-19.

No dia seguinte, a Escs celebrou a formatura da 14ª turma de Enfermagem, com 49 novos profissionais, destacando a importância da enfermagem para o cuidado em saúde, a resistência e a superação ao longo da formação. Discursos de representantes da instituição reforçaram a excelência acadêmica da Escs, o papel transformador da educação e a preparação humanizada dos egressos, que seguem aptos a contribuir com a saúde do Distrito Federal.



Turma de Medicina



Turma de Enfermagem

20.201



COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

CONTRATO 125/2025

Objeto: execução das obras de infraestrutura de energia elétrica do alimentador aéreo 13,8 kV e rede de distribuição de energia elétrica e iluminação das Quadras 02, 04 e a Comercial 02/04 do empreendimento Aldeias do Cerrado, na Região Administrativa de São Sebastião, RA XIV - Distrito Federal.



Rede de distribuição de energia elétrica e Iluminação –
QD. 02 – Aldeias do Cerrado.



Rede de distribuição de energia elétrica e Iluminação –
QD. 04 – Aldeias do Cerrado.

Imagens enviadas pela Terracap.

20.201



COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

CONTRATO 27/2025

Objeto: execução das obras para a implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 305, do Setor de Habitações Coletivas Noroeste, Plano Piloto / RA-I - Distrito Federal.



Construção civil da Estação Transformadora – ET 02 da quadra SQNW 305, Setor Noroeste.

Imagem enviada pela Terracap.

20.201



COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

CT 129/2024

Objeto: obras de implantação da rede de drenagem e sistema viário nas quadras residenciais 02 e 04 e na comercial 02/04 do Condomínio Aldeias do Cerrado, Região Administrativa de São Sebastião - Brasília/DF.



Vista aérea da Qd. 02 do Aldeias do Cerrado.


22.101

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SODF

ETAPA 0031/2025

Fornecimento e instalação do sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga/DF, localizado na Região Administrativa de Taguatinga/DF - RA-TAG, na Avenida Central (Boulevard), no trecho compreendido entre a EPTG (Estrada Parque Taguatinga - Rodovia DF-085) e a Avenida Elmo Serejo no Distrito Federal –Contrato nº 15/2023. Serviços concluídos no 6º Bimestre/2025.

Em razão da elevada complexidade operacional do Túnel de Taguatinga, denominado Rei Pelé, caracterizada pela diversidade de parâmetros e ações necessárias à sua operação segura e contínua, fez-se imprescindível a implantação de um sistema integrado de automação, controle e de transmissão real de dados. Esse sistema tem por finalidade auxiliar no monitoramento em tempo real, garantir a segurança dos usuários da via, reduzir o tempo de resposta em situações de emergência e reforçar a confiabilidade da operação, manutenção e continuidade dos serviços. A interrupção desses sistemas poderia comprometer significativamente a fluidez e a ligação do tráfego entre a EPTG e as Regiões Administrativas de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia.

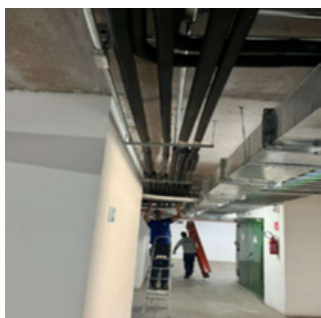

Dutos de ar condicionado



Execução de calçadas e assentamento de piso tátil e de meios-fios



Quadro de controle



Vídeo Wall de monitoramento e operação das câmeras e do supervisão do sistema de automação

Imagens enviadas pelo órgão.

22.101

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SODF

ETAPA 0072/2025

Restauração/recuperação de pavimento nos segmentos 3B e 4 da DF-009, Lago Norte – Contrato nº 14/2025. Realizado até o 6º bimestre/2025: 96,00%.

A restauração da DF-009 tem como objetivo recuperar o pavimento da rodovia, prolongando a sua vida útil e reestabelecendo as condições de segurança, conforto e trafegabilidade. Devido à extensão da rodovia, foi necessária a divisão em segmentos homogêneos, com base em critérios visuais e deflectométricos. Tais segmentos visam a melhor solução técnica/econômica para o trecho a ser implantado no valor do recurso disponibilizado para execução do objeto. A escolha do trecho, segmentos 3B e 4, busca a funcionalidade do objeto atendendo o maior fluxo de veículos que adentra o Lago Norte e cobre uma área de 19.895,08 m².



Pavimento asfáltico (flexível)



Pavimento asfáltico (flexível)



Fresagem



Pavimento asfáltico (flexível)

Imagens enviadas pelo órgão.

22.101

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SODF

ETAPA 0024/2025

Readequação da Rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG, incluindo a implantação de faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT (*Bus Rapid Transit*), viadutos, estações BRT, passagens para pedestres, infraestrutura e demais serviços e operações necessárias – Contrato nº 21/2022. Realizado até o 6º Bimestre/2025: 84,41%.

Trata-se de importante intervenção cujo escopo contempla o desenvolvimento de projetos e a execução de obras de readequação da Rodovia DF011 (EPIG), com extensão da via EPIG, aproximadamente 6 km em cada sentido, interligando a via EPTG ao Eixo Monumental. A proposta de intervenção consiste na readequação da via para implantação do corredor exclusivo para ônibus no sistema BRT (*Bus Rapid Transit*/Ônibus de trânsito Rápido) nos sentidos Taguatinga/Plano Piloto e Plano Piloto/Taguatinga. O projeto de readequação da EPIG foi desenvolvido em 2014 e contempla quatro interseções viárias, compostas de doze viadutos, além de estações BRT, sinalização vertical e horizontal, pintura de faixas de pedestres, instalações de tachões refletivos, iluminação pública e placas orientadoras de trânsito. Inclui ainda passagens e vias destinadas a pedestres e ciclistas, interligando todos os trechos e garantindo rotas contínuas e acessíveis em toda a região.



Pavimento rígido



Concretagem do pavimento rígido



Pavimento intertravado, ciclovia e plantio de grama



Pavimento rígido, assentamento de meios-fios e terraplenagem

Imagens enviadas pelo órgão.

40.101

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL SECTI/DF

PROGRAMA INCUBADORA DIGITAL

Período de execução: 11/11/2025 a 11/11/2026.

Objetivo: Projeto voltado à capacitação em empreendedorismo digital, com foco em planejamento e estratégia de negócios, marketing digital, uso de plataformas e ferramentas digitais, criação e produção de conteúdo, desenvolvimento de *soft skills* e fortalecimento de competências empreendedoras.

Relevância do projeto: O Programa Incubadora Digital decorre do Edital de Chamamento Público lançado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (SECTI), destinado à execução do Projeto de Empreendedorismo Digital. A iniciativa tem como objetivo capacitar jovens e adultos, prioritariamente em situação de vulnerabilidade social, promovendo a qualificação e o acesso ao conhecimento nas áreas de empreendedorismo digital, tráfego pago, produção de conteúdo, posicionamento estratégico nas redes sociais, bem como ações de inclusão digital. Com duração de 12 (doze) meses, o projeto será executado em todo o Distrito Federal, com previsão de atendimento direto a 9.860 participantes.

PROGRAMA TECNOLOGIA EM JOGO

Período de execução: 11/12/2025 a 11/12/2026.

Objetivo: Projeto voltado à realização de capacitação tecnológica nas áreas de desenvolvimento de jogos eletrônicos, design de jogos eletrônicos e marketing aplicado a jogos eletrônicos, com a perspectiva de alcançar até 22.400 pessoas de diferentes Regiões Administrativas do Distrito Federal, visando promover a inclusão digital, o empreendedorismo tecnológico e o fortalecimento do ecossistema de inovação do Distrito Federal.

Relevância do projeto: A iniciativa possui grande relevância educacional, social e econômica, uma vez que contribui para a formação de competências tecnológicas estratégicas, para a ampliação da inclusão digital e para o estímulo ao empreendedorismo inovador no Distrito Federal. O projeto favorece a qualificação de jovens e adultos em áreas de alta demanda do setor de tecnologia, fortalece o

40.101

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL SECTI/DF

PROGRAMA TECNOLOGIA EM JOGO

ecossistema de jogos eletrônicos e economia criativa e promove a geração de oportunidades, em consonância com as diretrizes de ciência, tecnologia e inovação adotadas pelo Governo do Distrito Federal.

CIL ONLINE

Período de execução: 04/08/2025 a 03/08/2026.

Objetivo: Solução tecnológica denominada CIL Online (Central de Intermediação da Comunicação em Libras), que contempla infraestrutura operacional e equipe humana certificada e habilitada para atender às solicitações de intermediação da comunicação entre cidadãos portadores de deficiência auditiva e servidores ouvintes do Governo do Distrito Federal. A referida solução é disponibilizada tanto para atendimentos presenciais, por meio de seus Postos de Atendimento, quanto para atendimentos no formato remoto, por intermédio do portal do GDF, e tem como objetivo ampliar o acesso a serviços públicos em programas como o Na Hora GDF, GDF Mais Perto do Cidadão, bem como em escolas, hospitais, Unidades de Pronto Atendimento – UPAs, além de iniciativas de outras pastas, a exemplo da Secretaria da Mulher, Secretaria do Esporte e Secretaria de Segurança Pública.

Relevância do projeto: A iniciativa possui grande relevância social e institucional, uma vez que contribui de forma direta para a promoção da acessibilidade comunicacional, da inclusão das pessoas surdas e da efetivação do direito fundamental ao acesso aos serviços públicos. A solução CIL Online fortalece as políticas públicas de inclusão do Governo do Distrito Federal, amplia a qualidade do atendimento ao cidadão e promove maior equidade no acesso às ações e programas governamentais, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da universalização dos serviços públicos, além de estar na sua segunda renovação contratual, uma vez que o projeto não só promove a inclusão digital, mas principalmente a social.

40.201



Principais realizações da **Assessoria de Comunicação**:

AGROTECH BRASÍLIA 2025 (27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2025)

Contemplado pelo Edital nº 08/2025 – FAPDF Realiza – Seleção Pública de Propostas para Apoio à Realização de Eventos, no valor de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), para realização do evento.

O AgroTech Brasília 2025 é um evento de grande porte voltado à apresentação, ao debate e à difusão das mais recentes inovações tecnológicas aplicadas ao setor agropecuário. Com foco na integração de soluções inovadoras, o evento tem como objetivo impulsionar a produtividade, a sustentabilidade e a competitividade de agricultores e empresários do agronegócio no Distrito Federal e no Brasil, fortalecendo a transformação digital do setor e promovendo a articulação entre pesquisa, tecnologia e mercado.

FÓRUM DA EMPREGABILIDADE E DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS SAUDÁVEIS PARA O JOVEM E O ADULTO AUTISTA (15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2025)

Contemplado pelo Edital nº 08/2025 – FAPDF Realiza – Seleção Pública de Propostas, para Apoio à Realização de Eventos, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para realização do evento.

O 1º Fórum da Empregabilidade e das Relações Profissionais Saudáveis para o Jovem e o Adulto Autista é um evento internacional, pioneiro no Brasil, dedicado a debater, construir e difundir tecnologias e estratégias eficazes para a inclusão profissional de pessoas autistas, com foco na promoção de relações profissionais mais saudáveis e inclusivas.

40.201



Principais realizações da **Assessoria de Comunicação**:

FÓRUM DA EMPREGABILIDADE E DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS SAUDÁVEIS PARA O JOVEM E O ADULTO AUTISTA (15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2025)



Imagem enviada pela fundação.

Principais realizações da **Coordenação de Bolsas e Eventos (COOBE)**:

AÇÃO: II GROUP THEORY BRAID THEORY AND RELATED ASPECTS

Contemplado no âmbito do Edital nº 06/2025 –FAPDF MOVIMENTA – Seleção Pública de Propostas de Apoio à Promoção, Realização e Organização de Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação, com um repasse de R\$ 176.064,90 (cento e setenta e seis mil sessenta e quatro reais e noventa centavos).

A Universidade de Brasília - UnB realizou, no Departamento de Matemática, o evento intitulado "*Group Theory, Braid Theory and Related Aspects*", nos dias 01 a 06 de dezembro 2025. O evento reuniu estudantes, professores e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, proporcionando um espaço de integração entre a produção científica acadêmica e a aplicação prática de pesquisas inovadoras.

Durante o evento, fortaleceu-se a formação científica de jovens pesquisadores do Distrito Federal, ampliando o interesse pela Matemática Pura e suas aplicações, bem como a pesquisa do grupo de Álgebra do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UnB. Também foram promovidas interações internacionais com potencial para gerar colaborações científicas e futuras pesquisas, além de ações de extensão e inovação acadêmica que aproximaram a comunidade do DF de atividades formativas recentes em Matemática.





Principais realizações da **Coordenação Científica (COOTEC)**:

Três eventos registrados no SAG, embora com valores não liquidados, mas inscritos em restos a pagar para execução prevista em janeiro de 2026, merecem destaque, a saber:

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025

Vinculada ao Edital nº 01/2025 - Programa Desafio DF, na qual foi contratado o projeto "Leitura em Foco: Validação de Metodologias de Gamificação e Narrativas Multimodais para Fomento à Leitura Literária na Rede Pública do Distrito Federal", no valor de R\$ 1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil reais).

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2025

Vinculada ao Edital nº 01/2025 - Programa Desafio DF, na qual foi contratado o projeto "Monitoramento Ativo e Inteligente da Jornada do Paciente", no valor de R\$ 3.886.000,00 (três milhões oitocentos e oitenta e seis mil reais).

CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2025

Vinculada ao Edital nº 01/2025 - Programa Desafio DF, na qual foi contratado o projeto "Implantação de um Centro de Tecnologias de Reabilitação Neuromotora no Distrito Federal: P&D de Exoesqueletos Inteligentes e Validação Clínica no SUS-DF", R\$ 2.912.000,00 (dois milhões novecentos e doze mil reais).

45.101

CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL CGDF

As ações selecionadas para compor o relato do sexto bimestre de 2025 foram definidas com base em critérios objetivos, voltados à abrangência do escopo institucional e ao alcance direto dos resultados junto à população. Priorizou-se, ainda, a identificação de entregas com efetiva materialização do gasto público, passíveis de verificação concreta e com potencial de impacto social mensurável. Esse recorte buscou evidenciar iniciativas que extrapolam o âmbito interno da Administração Pública e que dialogam diretamente com a missão institucional dessa Controladoria-Geral do Distrito Federal de promover transparência, controle social e integridade, de forma acessível e cidadã, conforme estabelecido no Objetivo Estratégico nº 3 - Ampliar a Transparência e a Participação Cidadã, da Perspectiva Cliente e Sociedade, do Plano Estratégico Institucional (PEI 2024-2027).

A CIDADE DO TESOIRO MÁGICO

Destaca-se a publicação e distribuição de 3.000 exemplares de livro infantil "A Cidade do Tesouro Mágico" voltado à educação para o controle social, direcionado a estudantes do ensino fundamental da rede pública do Distrito Federal. A ação materializa uma estratégia de longo prazo de formação cidadã, ao introduzir, de maneira lúdica e pedagógica, conceitos relacionados à participação social, ao uso responsável dos recursos públicos e ao papel do cidadão no acompanhamento da gestão pública. A distribuição direta nas escolas amplia significativamente o alcance da iniciativa, garantindo capilaridade territorial e impacto educacional junto a crianças em fase formativa, com reflexos potenciais duradouros na cultura de controle social.



Imagens enviadas pelo órgão.

45.101

CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL CGDF

SEMANA INTERNACIONAL DE CONTROLE E COMBATE À CORRUPÇÃO

A realização da Semana Internacional de Controle e Combate à Corrupção consolidou-se como uma ação de ampla visibilidade institucional e elevado impacto público. O evento promoveu a articulação entre órgãos de controle, instituições nacionais e internacionais, servidores públicos e sociedade civil, fomentando o debate qualificado sobre prevenção à corrupção, governança, integridade e transparência. Ao reunir diferentes atores e perspectivas, a iniciativa fortaleceu redes de cooperação, disseminou boas práticas e ampliou o alcance das ações da CGDF para além do público técnico, reafirmando seu papel estratégico como indutora de uma agenda contemporânea de integridade pública.



Imagem enviada pelo órgão.

SAG 2026

CRONOGRAMA

1º BIMESTRE

O SAG WEB - Sistema de Acompanhamento Governamental será aberto no dia 12 de fevereiro de 2026 e permanecerá disponível até o dia 12 de março de 2026, para a realização das atualizações pelas Unidades Orçamentárias referente ao 1º bimestre de 2026. Após análise de conformidade pela equipe técnica da SUPLAN, será publicado o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro do 1º Bimestre, até o dia 30 de março de 2026.

Salientamos que, no site da Secretaria de Economia, estão disponíveis o Manual de Orientações, o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro (bimestral) e demais documentos relativos ao SAG.
