

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

2º BIMESTRE - 2025

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL - SAG



**PLANO
PLURI
ANUAL**
2024-2027



Governo do Distrito Federal

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Ibaneis Rocha

VICE-GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL
Celina Leão

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA
Ney Ferraz Júnior

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Thiago Rogério Conde

SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Luiza Almeida Londe

**PLANO
PLURI
ANUAL**
2024-2027



Publicação elaborada pela

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

SUBSECRETÁRIA

Luiza Almeida Londe

EQUIPE TÉCNICA

Adriane Freitas de Oliveira Cotias e Silva
Alexandre Bartolomeu Côrtes Rosa
Andrea Nunes Lazzarini
Camila Cristina Ferreira
Danilo Costa Macêdo
Donaldo César Rodrigues
Erinaldo da Silva Lêla
Eudóxia Maria Machado da Silva Andrade
Fabrício Santos de Sousa
Gabriel Carlos Ribeiro Antunes
Hayk Carvalho Silva
João Carvalho Leal
Kaique dos Santos Mendes
Letícia Oni Pimenta Laurentino
Luiz Carlos de Oliveira
Marco Aurélio Teixeira
Maria Auxiliadora Fernandes
Maria Raquel de Almeida Zeferino
Maria Vitória Nava Silva do Carmo
Pedro Augusto César
Rafael Duarte de Paula Silva
Raianne Paiva Nogueira Lamounier
Sharlene Goncalves de Araujo
Wallefer Riches Marques da Costa

SUPERVISÃO DAS PRINCIPAIS
REALIZAÇÕES

Danilo Costa Macêdo

PESQUISA E ORGANIZAÇÃO DO
CONTEÚDO

Gabriel Carlos Ribeiro Antunes
Hayk Carvalho Silva

REVISÃO DO CONTEÚDO

Gabriel Carlos Ribeiro Antunes
Hayk Carvalho Silva
Danilo Costa Macêdo

PROJETO GRÁFICO, CAPA E
DIAGRAMAÇÃO

Sharlene Gonçalves de Araújo

Anexo do Palácio do Buriti,
10º andar,
Praça do Buriti,
Zona Cívico-Administrativa,
CEP 70075-900 / Brasília - DF
www.seec.df.gov.br

**PLANO
PLURI
ANUAL**
2024-2027



SUMÁRIO

<u>Sobre o Relatório</u>	05
<u>Análise dos dados</u>	07
<u>Acompanhamento das metas e prioridades da LDO</u>	15
<u>Acompanhamento das ações de conservação do patrimônio</u>	17
<u>Acompanhamento das obras contratadas pelo GDF</u>	19
<u>Realizações de destaque</u>	22
<u>SAG 2025 - Cronograma 3º Bimestre</u>	38

SOBRE O RELATÓRIO

A SUPLAN publicou no Diário Oficial do Distrito Federal a Portaria nº 428, de 27 de maio de 2025, dando publicidade ao Relatório de Desempenho Físico-Financeiro relativo ao 2º Bimestre de 2025.

O mencionado relatório contém as ações efetivamente executadas de janeiro a abril de 2025, extraídas do SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental, e está disponível no site da [Secretaria de Estado de Economia – SEEC](#).

Outrossim, contém o acompanhamento da execução física e financeira das ações de Governo previstas no Plano Plurianual-PPA 2024-2027¹ (ano-base 2025) e desdobrada na Lei Orçamentária Anual – LOA/2025², auxiliando o processo de avaliação da eficiência e da eficácia da gestão, a transparência da aplicação dos recursos públicos, além de permitir o conhecimento do conjunto de ações de governo em seus aspectos quantitativos, qualitativos, espacial e temporal.

¹ Lei n.º 7.378 de 29 de dezembro de 2023

² Lei n.º 7.650 de 30 de dezembro de 2024

Após a publicação da LOA e detalhamento do crédito orçamentário disponível, os gestores de unidades orçamentárias, responsáveis pela execução e implementação das políticas públicas, definem o que será executado, quando e como será a execução ao longo do exercício, ou seja, quais serão as etapas (entregas) necessárias para a implementação de cada Programa de Trabalho. Os Agentes de Planejamento das Unidades Orçamentárias, bimestralmente, realizam o levantamento, a análise e a inserção das informações no Sistema de Acompanhamento Governamental (SAG).

Conforme estabelecido no [Manual](#) de cadastramento e acompanhamento de etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental (SAG), todos os Programas de Trabalho constantes da Lei Orçamentária Anual devem conter, no mínimo, uma etapa cadastrada no SAG no decorrer do exercício, à exceção daqueles inseridos por meio de emenda parlamentar que não apresentarem empenho. No entanto, no **1º bimestre** do exercício, é **facultado** às Unidades Orçamentárias cadastrar **apenas**:

- Etapas pertencentes a programas de trabalho com valores empenhados ou contratualizados

- (Estatais) de cunho institucional ou oriundos de emendas parlamentares;
- Etapas procedentes de ano anterior, tratando-se das ações do tipo projeto que no 6º bimestre tenham encerrado o exercício nos estágios “NO – Andamento Normal”, “PA – Paralisada” ou “AT – Atrasada” e, deste modo, ensejam continuidade no presente exercício.

A partir do **2º bimestre**, entretanto, é **obrigatório** que todos os demais programas de trabalho institucionais contidos da Lei Orçamentária Anual, independentemente da ocorrência de empenho, além de emendas parlamentares que tiverem empenho, tenham ao menos uma etapa correspondente cadastrada. Deste modo, a análise e a compreensão das informações gerenciais apresentadas a seguir deve ser realizada à luz desse contexto.

A seguir, são apresentadas informações gerenciais extraídas do SAG e as realizações em destaque no 2º Bimestre de 2025, enviadas pelas respectivas unidades orçamentárias.



Vias principais do Sol Nascente recebem pavimentação após conclusão das obras de drenagem. Agência Brasília

ANÁLISE DOS DADOS

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS DO SAG 2º BIMESTRE 2025

ESTÁGIO DAS ETAPAS


Até o 2º bimestre de 2025, foram cadastradas 2.926 etapas pelas unidades orçamentárias.

Cada etapa é classificada sob um estágio no SAG, que evidencia a compatibilidade entre a execução física e o cronograma previsto.

A maioria das etapas foram classificadas sob o estágio “**Andamento Normal**” (60,01%), ou seja, com execução física compatível com o cronograma previsto.

Em seguida, encontram-se as etapas no estágio “**A Ser Iniciada**” (28,09%),

Estágio das etapas
SAG 2025 - 2º bimestre

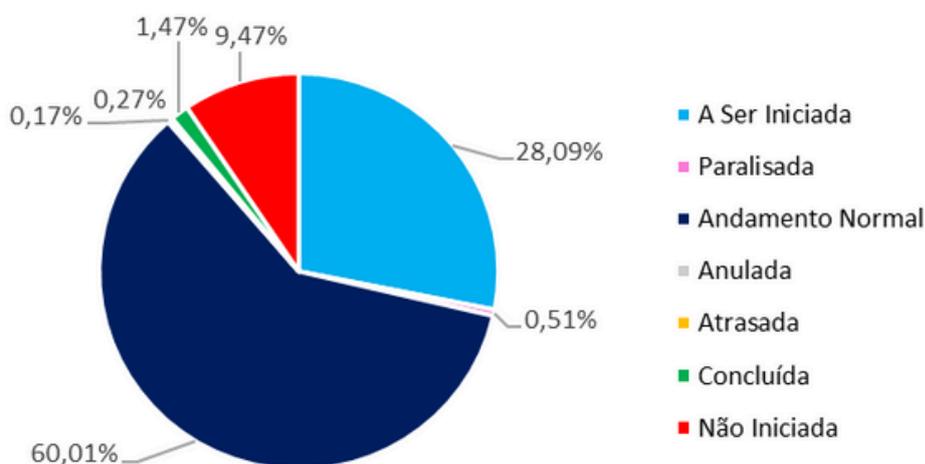


Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 30/04/2025

sendo aquelas que não apresentaram execução física até o bimestre, mas possuem previsão de início para bimestres subsequentes, ou seja, ainda respeitam o prazo estipulado.

Além disso, 9,47% também não apresentaram execução física, porém a previsão de início da execução física expirou. Deste modo, foram classificadas sob o estágio “**Não Iniciada**” por estarem em desacordo com o cronograma previsto.


Por fim, os estágios “**Concluída**” (1,47%), “**Paralisada**” (0,51%), “**Anulada**” (0,17%) e “**Atrasada**” (0,27%) representaram, em conjunto, menos de 3% das ocorrências.

A redução da proporção das etapas em “Andamento Normal” em relação ao bimestre anterior se deve a obrigatoriedade de cadastramento de ao menos uma etapa referente a cada programa de trabalho institucional no 2º bimestre, oportunidade em que se observa que a maioria é cadastrada sob o estágio “A Ser Iniciada”.

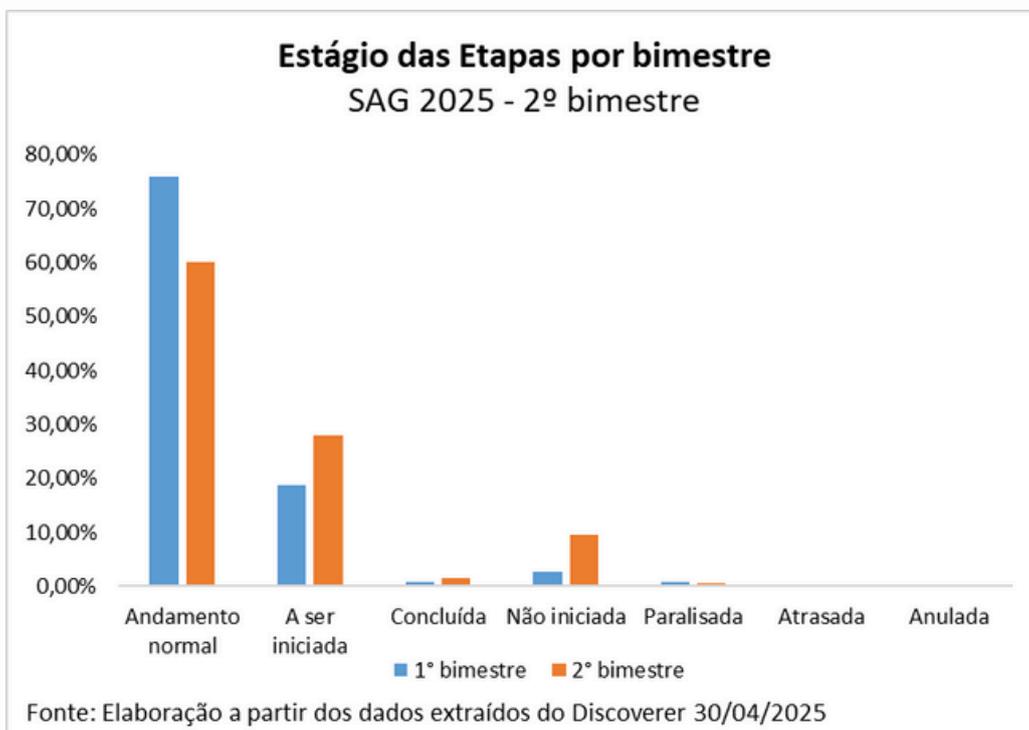


Outrossim, são considerados regulares os estágios “A Ser Iniciada”; “Andamento Normal”; e “Concluída”.

Por outro lado, quando há descompasso entre execução física e cronograma previsto, a etapa é classificada sob um dos seguintes estágios: “Não Iniciada”, “Paralisada”, “Atrasada” ou “Anulada”. Nessa condição, há o enquadramento como Desvio, sendo necessário que a unidade orçamentária informe a Causa, Natureza, Origem e o Detalhamento, visando esclarecer as razões para esta incompatibilidade entre o planejado e o executado.

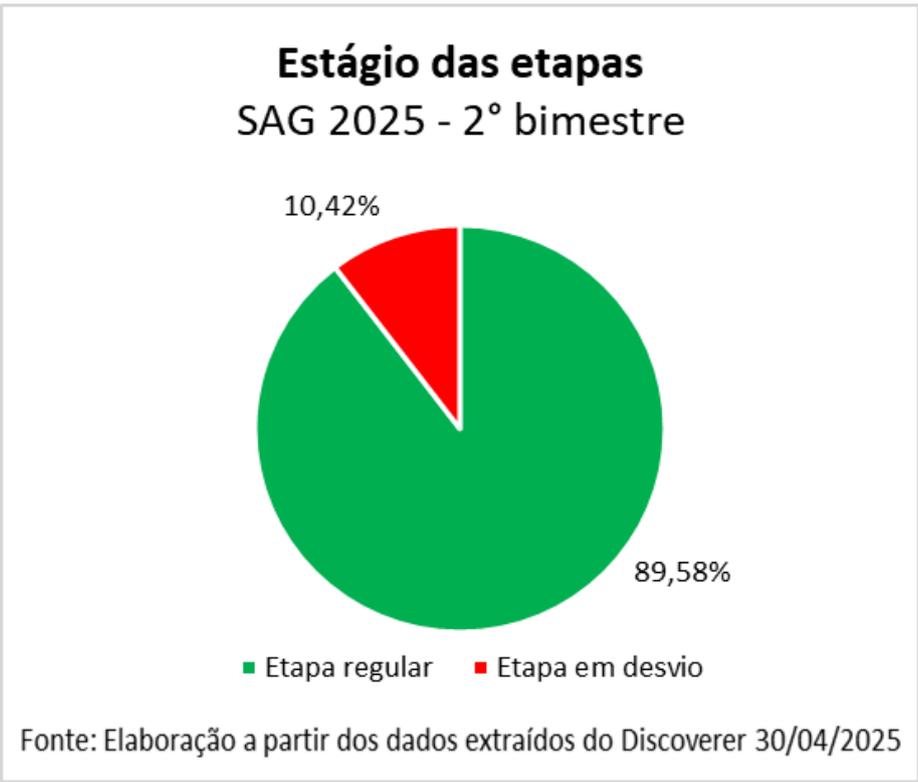

Depreende-se do gráfico que 10,42% das etapas encerraram o 2º bimestre em desvio (305 etapas), ao passo que 89,58% foram classificadas sob estágios regulares (2.616 etapas).


Ao colacionar os dois bimestres, verifica-se aumento das etapas em desvio e redução das etapas regulares, visto que representavam no 1º bimestre 4,36% e 95,64%, respectivamente.

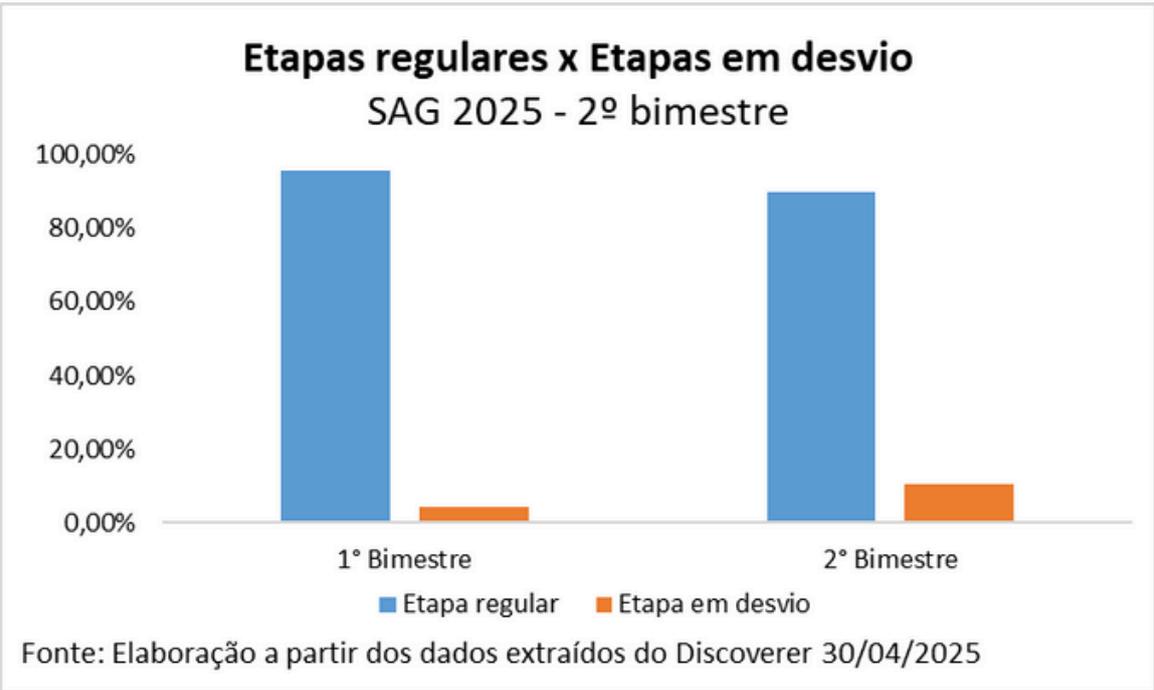


Para melhor compreensão quanto ao desvio, segue análise de suas classificações quanto à natureza e causa.

No que se refere à **Natureza**, a **Administrativa** foi a mais representativa, com 65,57% dos casos. Destacaram-se ainda as naturezas **Orçamentária** (16,39%) e **Técnica** (12,13%).

Além disso, as naturezas **Jurídica**, **Política**, **Financeira** e **Fenômenos Naturais** alcançaram percentual inferior a 6% do total, em conjunto.

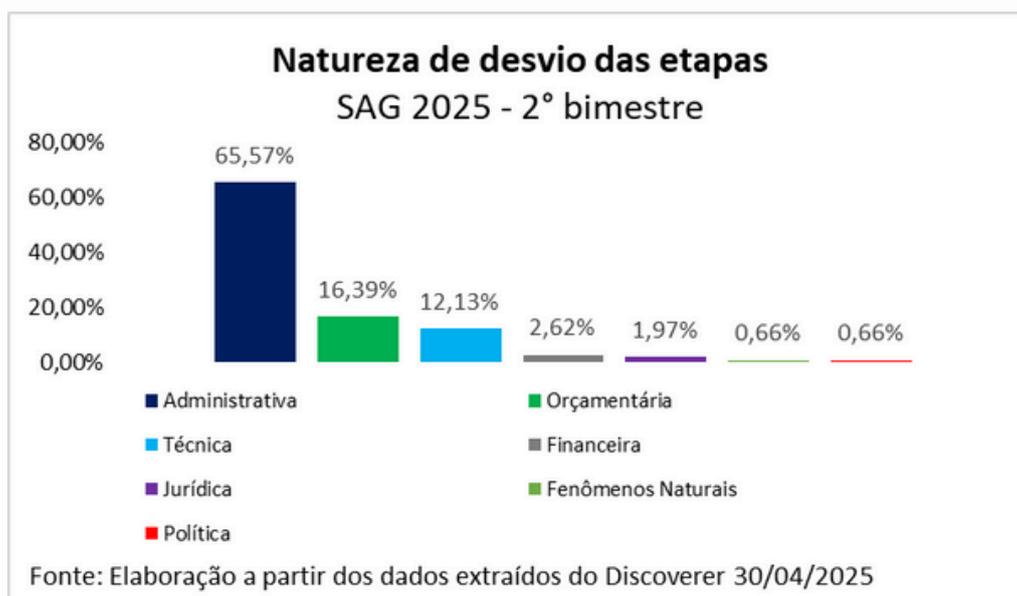


Não obstante, é possível constatar que mesmo variando os percentuais, a hierarquia se apresenta similar ao bimestre anterior, com “inversão de posições” entre as naturezas **Técnica** e **Orçamentária**.

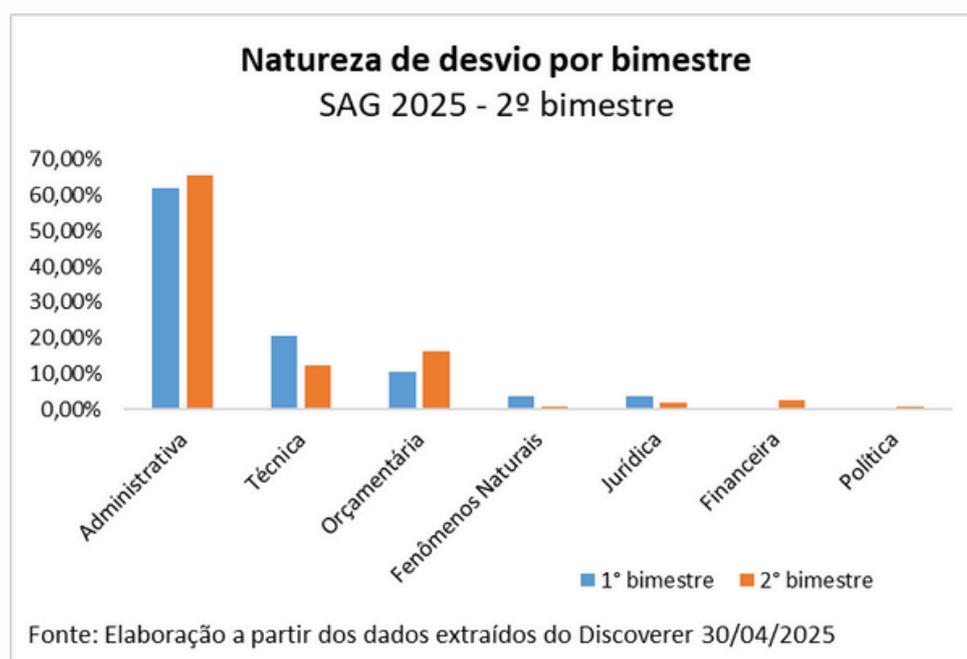


Já categorizando as etapas em desvios segmentados pelas **Causas**, as ocorrências permanecem concentradas na causa **OCD – Outras Causas de Desvio** (53,77%), seguida ordenadamente pelas **APU – Alteração na Programação da Unidade Executiva** (12,79%), **ICO – Insuficiência de Créditos Orçamentárias** (7,87%), **NOO – Necessidade da Ação de Outros Órgãos** (6,89%), **MPA – Morosidade em Procedimentos Administrativos** (6,23%); e **IPT – Indefinição/Reavaliação de Projeto Técnico** (4,92%).

Todas as outras causas de desvio representaram, em conjunto, menos de 8% das justificações apresentadas.

As Causas CCB – Crédito Contingenciado ou Bloqueado; e IRM – Insuficiência de Recursos Materiais não tiveram ocorrências nos dois primeiros bimestres.

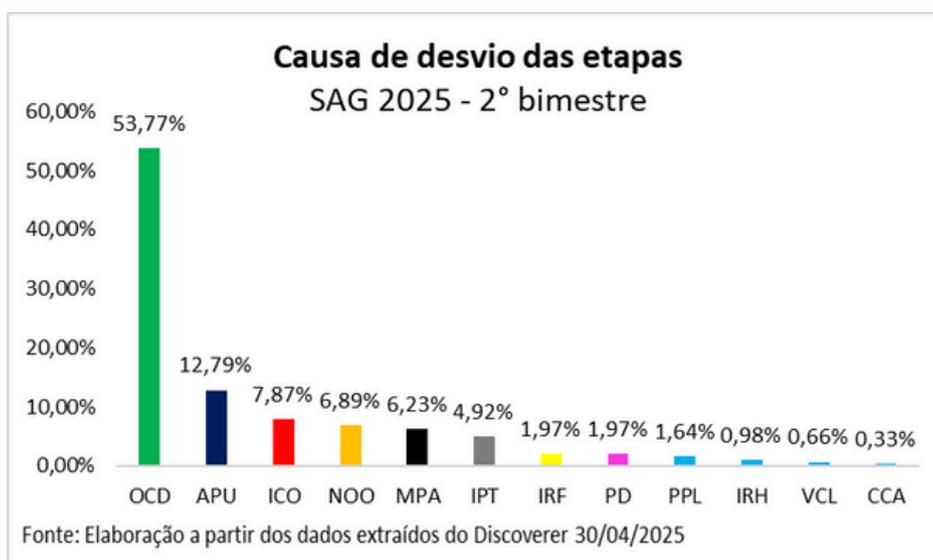


Por sua vez, seguindo a mesma linha da natureza, a evolução da causa do desvio apresentou pouca variação em relação ao 1º bimestre, exceto para **APU – Alteração na Programação da Unidade Executiva**, a qual passou a compor o percentual de 12,79%, enquanto no 1º bimestre apresentou apenas 1,15% das causas dos desvios.

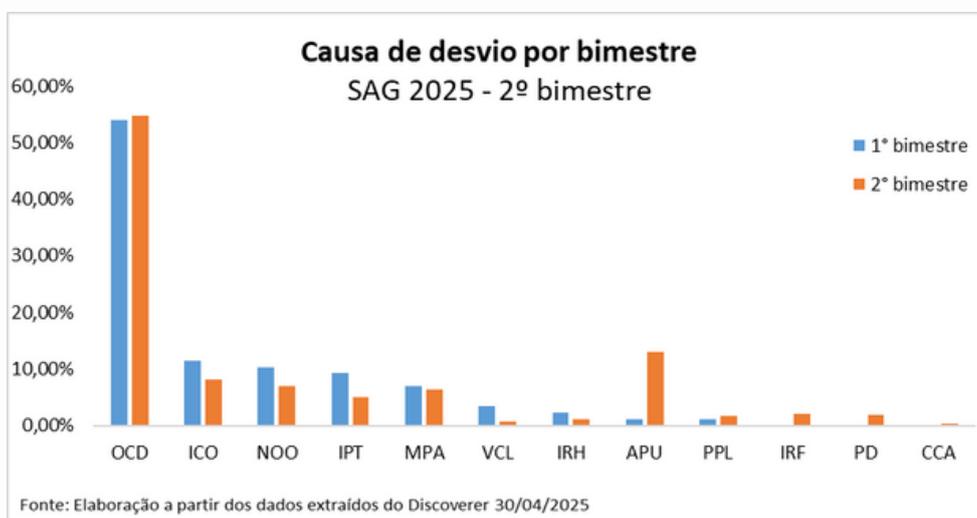

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À ESFERA ORÇAMENTÁRIA

Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) compreendem as dotações referentes à Administração Direta e Indireta, ao passo que as Estatais Independentes³ possuem parte de seus recursos contidos no Orçamento de Investimentos (OI),⁴ além de outra parte no denominado Dispêndios das Estatais Independentes.

Ressalta-se que os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) não são acompanhados no SAG, visto que não constam da Lei Orçamentária Anual - LOA.

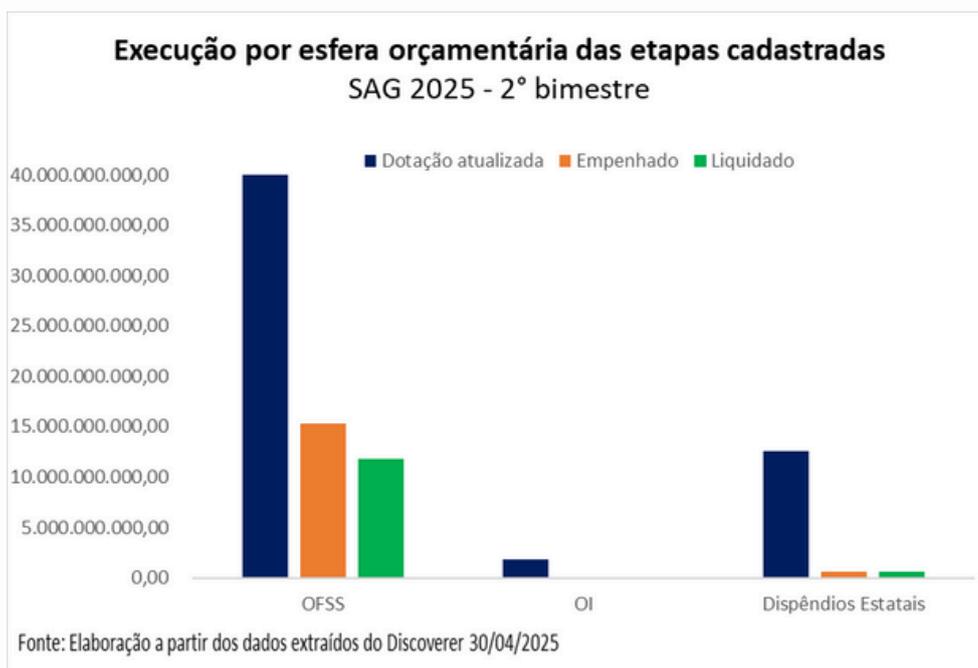

	OFSS	OI	DISPÊNDIOS ESTATAIS
Dotação atualizada	R\$ 40.420.197.317,16	R\$ 1.790.022.871,00	R\$ 12.621.228.888,00
Empenhado	R\$ 15.361.601.433,85	R\$ 60.461.544,06	R\$ 562.310.614,11
Liquidado	R\$ 11.844.881.568,69	R\$ 60.461.544,06	R\$ 562.310.614,11


Destaca-se que os valores apresentados referem-se aos programas de trabalho cadastrados no SAG. Assim, os recursos evidenciados são de etapas cadastradas no SAG, ligeiramente menor que aqueles constantes no controle da execução orçamentária (RREQO), devido à faculdade de cadastramento de etapas nos casos de programas de trabalho relativos a emendas parlamentares sem empenho, conforme Manual.

³ Estatais independentes não possuem as fases da execução orçamentária do empenho e da liquidação, apenas a execução (similar ao estágio liquidação). Portanto, foram considerados como empenho e liquidação os valores de execução no orçamento de investimento e nos dispêndios estatais.

⁴ Parágrafo 4º do artigo 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AOS EIXOS TEMÁTICOS DO PPA

Agrupando as etapas cadastradas dos programas de trabalho relacionados aos 8 eixos temáticos do Plano Plurianual de 2024-2027 e Programa de Operações Especiais (que não contribuem para a manutenção, a expansão ou o aperfeiçoamento das ações de governo)⁵, é possível constatar a composição das etapas do SAG por tipo de estágio para cada eixo, conforme demonstrado a seguir.

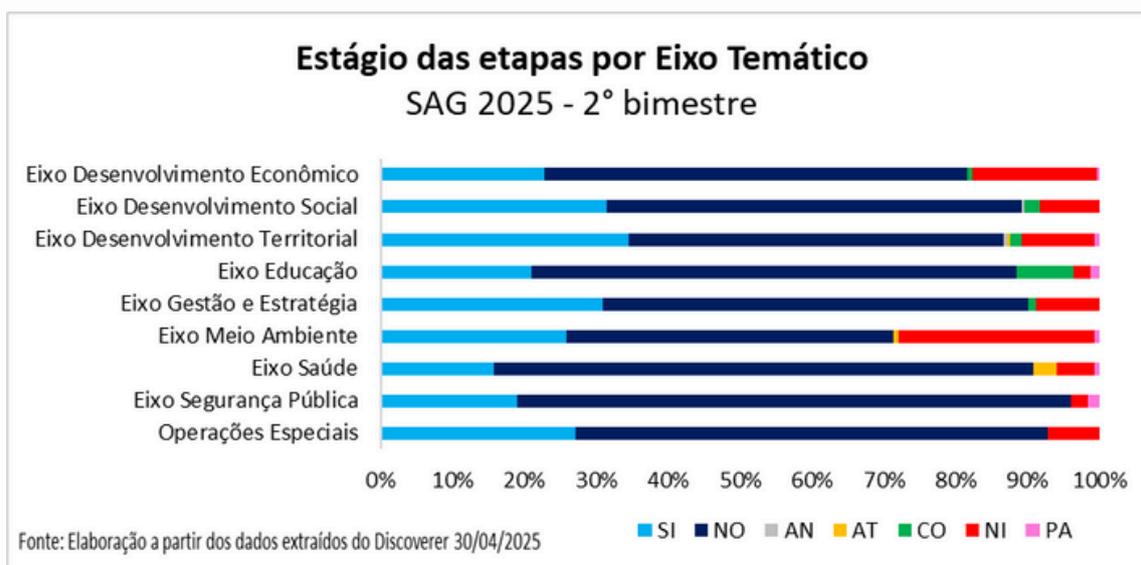


Eixo	SI	NO	AN	AT	CO	NI	PA
Desenvolvimento Econômico	22,69%	58,85%	0,00%	0,00%	0,77%	17,31%	0,38%
Desenvolvimento Social	31,80%	57,74%	0,42%	0,00%	2,09%	8,37%	0,00%
Desenvolvimento Territorial	34,57%	52,17%	0,50%	0,25%	1,61%	10,16%	0,74%
Educação	20,98%	67,41%	0,00%	0,00%	8,04%	2,23%	1,34%
Gestão e Estratégia	30,82%	59,27%	0,00%	0,00%	1,08%	8,84%	0,00%
Meio Ambiente	25,87%	45,45%	0,00%	0,70%	0,00%	27,27%	0,70%
Saúde	15,69%	75,16%	0,00%	3,27%	0,00%	5,23%	0,65%
Segurança Pública	18,99%	77,09%	0,00%	0,00%	0,00%	2,23%	1,68%
Operações Especiais	27,13%	65,65%	0,00%	0,00%	0,00%	7,22%	0,00%

Estratificando a execução orçamentária pelos eixos temáticos, é possível notar que, para o Eixo Educação, que possuía R\$ 7,9 bilhões de dotação autorizada, foram liquidados até o final do 2º bimestre mais de R\$ 2,49 bilhões. Por sua vez, no Eixo de Desenvolvimento Territorial, com dotação autorizada de R\$ 10,6 bilhões, foram liquidados R\$ 2,66 bilhões para alcançar as metas propostas nas etapas cadastradas no SAG.

⁵ Parágrafo 5º do artigo 3º da Lei 7.378/2023

Ademais, mesmo não sendo eixo temático, as **Operações Especiais** são aquelas com maiores recursos dotados (R\$ 16,23 bilhões) e liquidados (R\$ 2,84 bilhões). Segue a execução orçamentária pelos 8 eixos temáticos do Plano Plurianual de 2024-2027 e pelo Programa de Operações Especiais de todas unidades orçamentárias do Distrito Federal até o final do 1º bimestre, considerando os Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social, além dos Orçamentos de Investimentos e Dispêndios das Estatais Independentes.

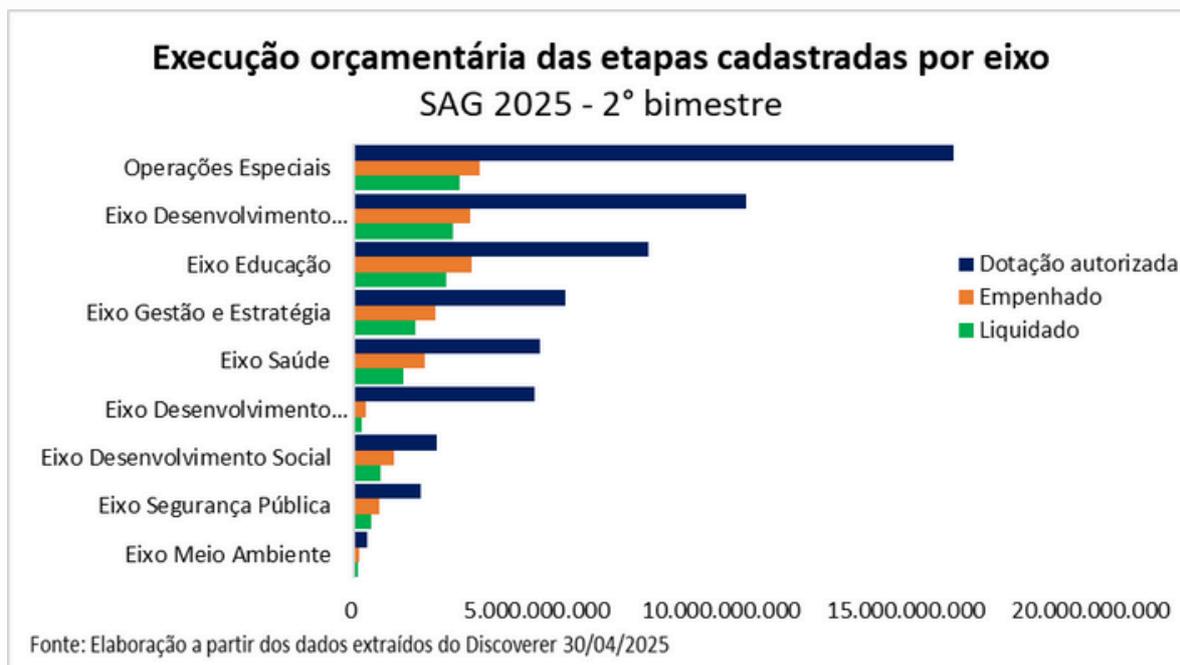

Eixo	Dotação autorizada	Empenhado	Liquidado
Operações Especiais	R\$ 16.231.144.541,02	R\$ 3.387.223.413,66	R\$ 2.838.453.569,04
Desenvolvimento Territorial	R\$ 10.596.434.839,06	R\$ 3.135.763.314,84	R\$ 2.656.108.597,60
Educação	R\$ 7.970.666.508,00	R\$ 3.166.957.055,77	R\$ 2.490.076.796,56
Gestão e Estratégia	R\$ 5.734.665.092,02	R\$ 2.187.284.110,70	R\$ 1.643.669.843,31
Saúde	R\$ 5.024.885.511,98	R\$ 1.902.190.250,02	R\$ 1.346.931.884,21
Desenvolvimento Econômico	R\$ 4.896.218.617,00	R\$ 320.639.535,21	R\$ 226.404.012,92
Desenvolvimento Social	R\$ 2.227.270.666,04	R\$ 1.071.411.801,14	R\$ 703.420.900,50
Segurança Pública	R\$ 1.806.282.984,04	R\$ 691.322.019,09	R\$ 478.072.038,20
Meio Ambiente	R\$ 343.880.317,00	R\$ 121.582.091,59	R\$ 84.516.084,52

ACOMPANHAMENTO DAS METAS E PRIORIDADES DA LDO


Foram definidos 56 Programas de Trabalho, devido ao seu impacto, como metas e prioridades da administração distrital para o exercício de 2025⁶, conforme Anexo I da LDO, e estes foram desmembrados em 89 etapas cadastradas no SAG.

No 2º bimestre, dentre essas estavam classificadas sob o estágio “**Concluída**”; cerca de 74,16% das etapas estavam sob “**Andamento Normal**”; e 7,87% sob o estágio “**A Ser Iniciada**”.

As etapas em desvio totalizaram 8,98%, com a seguinte composição: “**Paralisada**” (6,74%); “**Atrasada**” (1,12%); e “**Anulada**” (1,12%).

Estágio das etapas do Anexo I - Metas e Prioridades LDO 2025


SAG 2025 - 2º bimestre

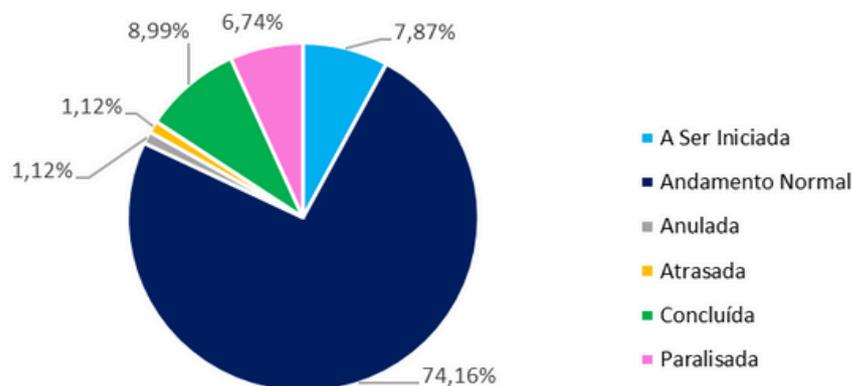

Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 30/04/2025

Até o 2º bimestre, foram empenhados R\$ 1,94 bilhão e liquidados R\$ 1,21 bilhão nestes programas de trabalho definidos como prioritários pelo poder público distrital.

⁶ Anexo de Metas e Prioridades da LDO, publicado no Anexo I da Lei 7.549/2024, alterado pelo Anexo Único da Lei nº 7.571/2024

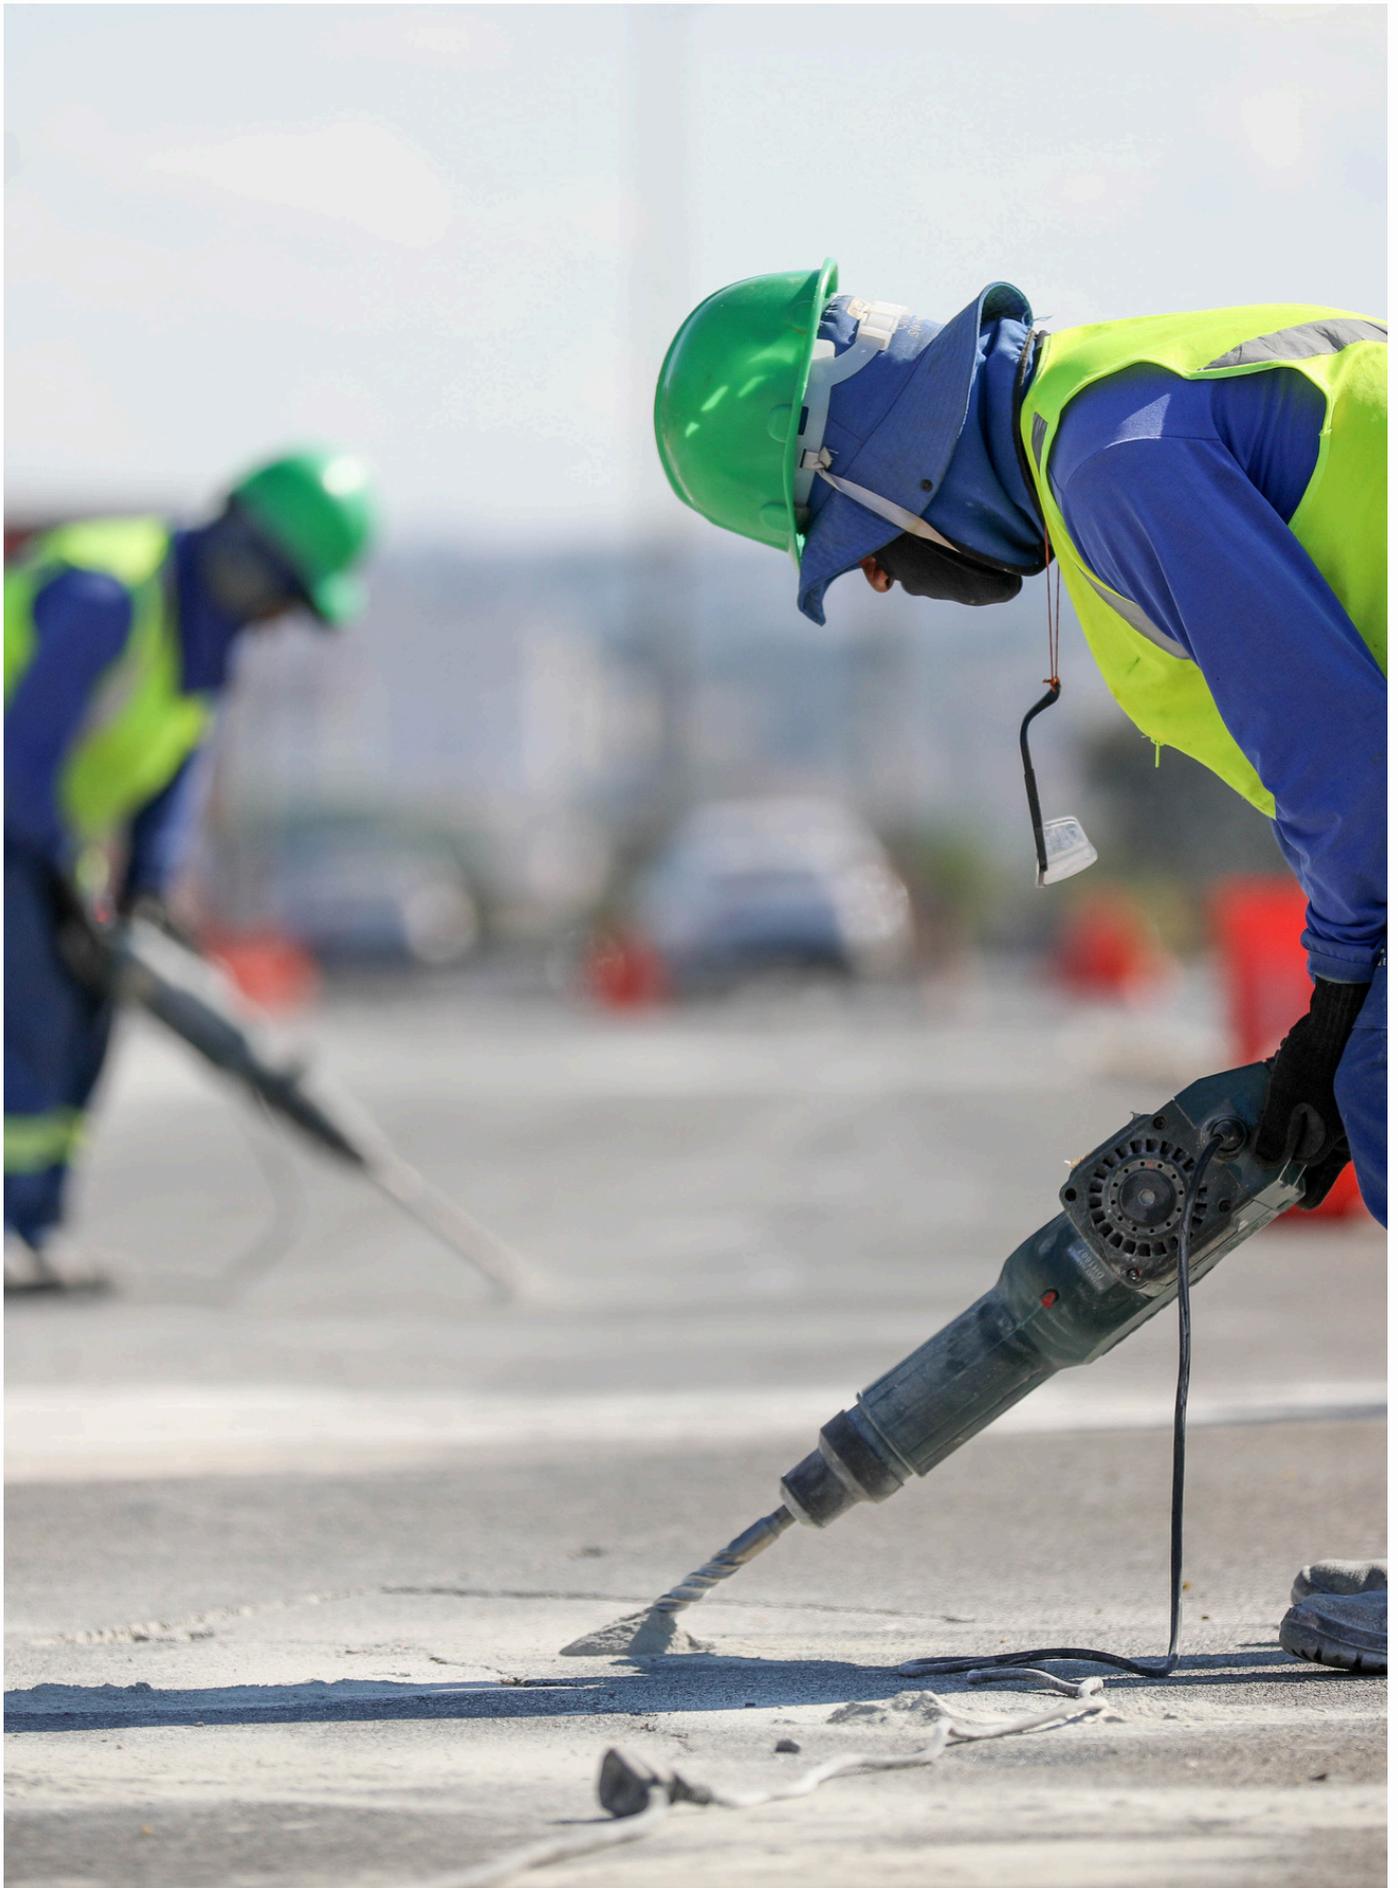

Manutenção do pavimento rígido da faixa exclusiva da EPTC. Agência Brasília


ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Conforme apresentado na seção 3 Manual, o Orçamento Público Distrital apresenta de forma segregada os dispêndios com a Conservação do Patrimônio Público Imobiliário. A partir do rol de 14 ações orçamentárias estabelecidas, é possível estratificar os dados do SAG quanto ao acompanha

mento destas ações para a conservação do patrimônio público distrital.

No 2º bimestre, estavam cadastradas 179 etapas referentes a 162 Programas de Trabalho relacionados à Conservação do Patrimônio Público. Destas, 55,87% encontram-se em “**Andamento Normal**”; 31,28% como “**A Ser Iniciada**”; e 12,85% sob o estágio “**Não Iniciada**”.

Estágio das etapas de Conservação do Patrimônio SAG 2025 - 2º bimestre

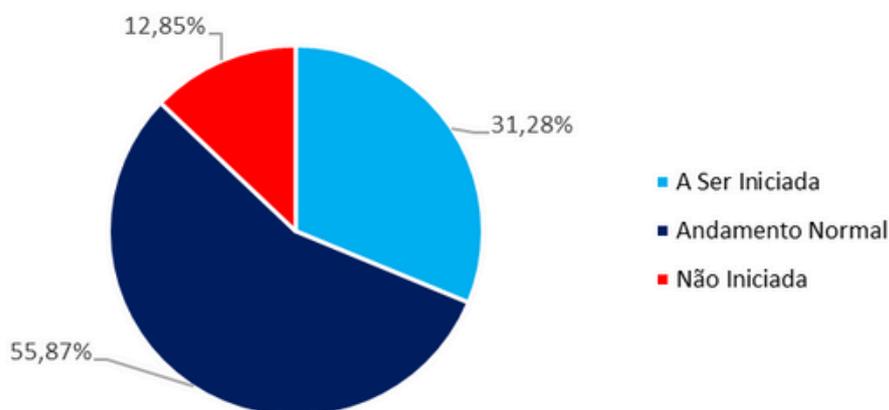

Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 30/04/2025

Até o final do 2º bimestre, foram empenhados R\$ 645 milhões e liquidados R\$ 503 milhões nos programas de trabalhos para Conservação do Patrimônio Público Imobiliário do Distrito Federal.




Espaços esportivos da QE 38 do Guará são reformados pelo RenovaDF. Agência Brasília


ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO GDF

No 2º bimestre, foram cadastradas no SAG 458 etapas relacionadas a Obras. Quanto ao estágio, 40,83% se encontram sob “**Andamento Normal**”; 37,99% foram enquadradas como “**A Ser Iniciada**”; “**Não Iniciada**” representa 8,30%; “**Concluída**” consiste em 8,08%. Os demais estágios representaram menos de 5% do total.

Das 458 etapas, 317 foram localizadas em mais de uma Região Administrativa (RA), como em todo Distrito Federal ou macrorregiões, consoante consta do Manual (Tabela 6 – Novas Regionalizações). Das 141 restantes, as que mais tiveram obras cadastradas no SAG foram as Regiões Administrativas do **Plano Piloto** (RA I), com 19 etapas; **Santa Maria** (RA XIII), 12, seguida de **Sobradinho II** (RA XXVI), 10.

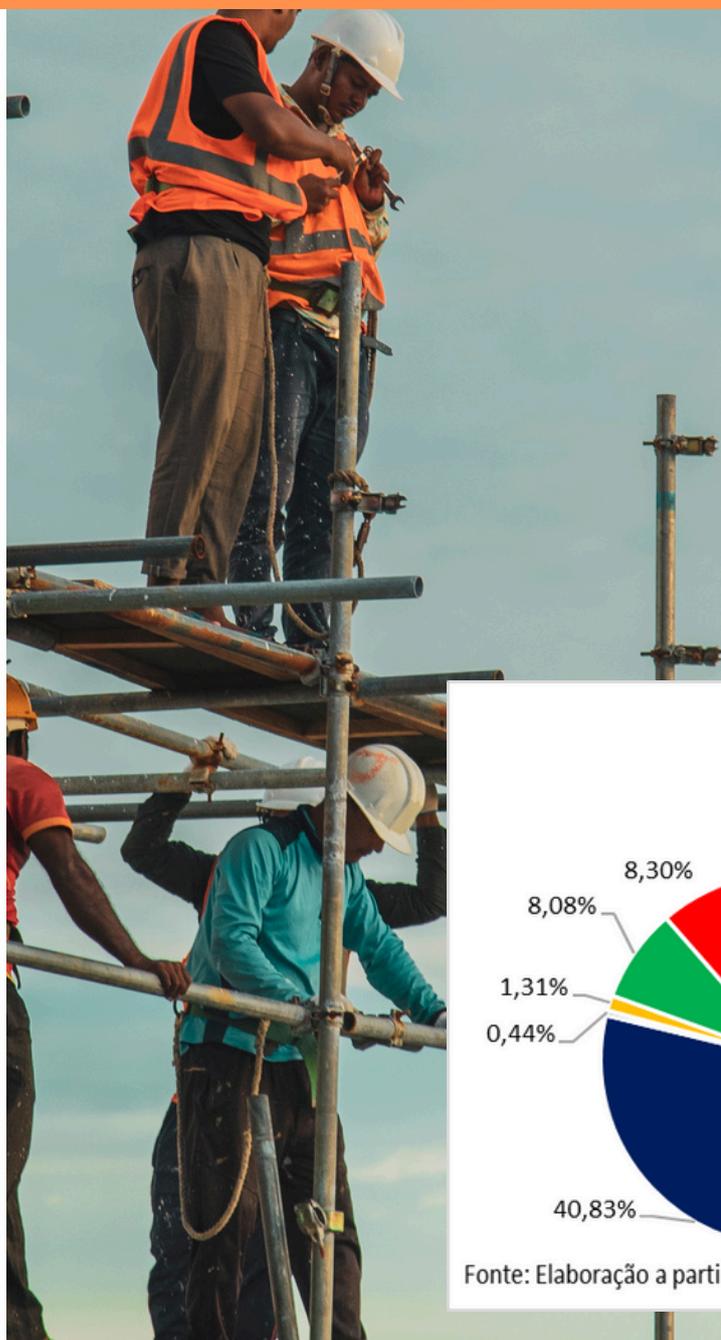


**Estágio das etapas de obras
SAG 2025 - 2º bimestre**

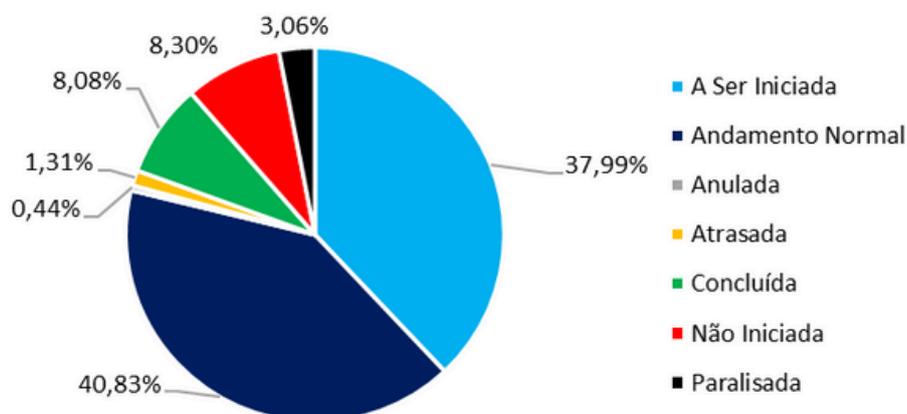

Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 30/04/2025


Para facilitar a compreensão, segue mapa da distribuição geográfica das Regiões Administrativas, bem como do quantitativo das etapas relativas a obras.

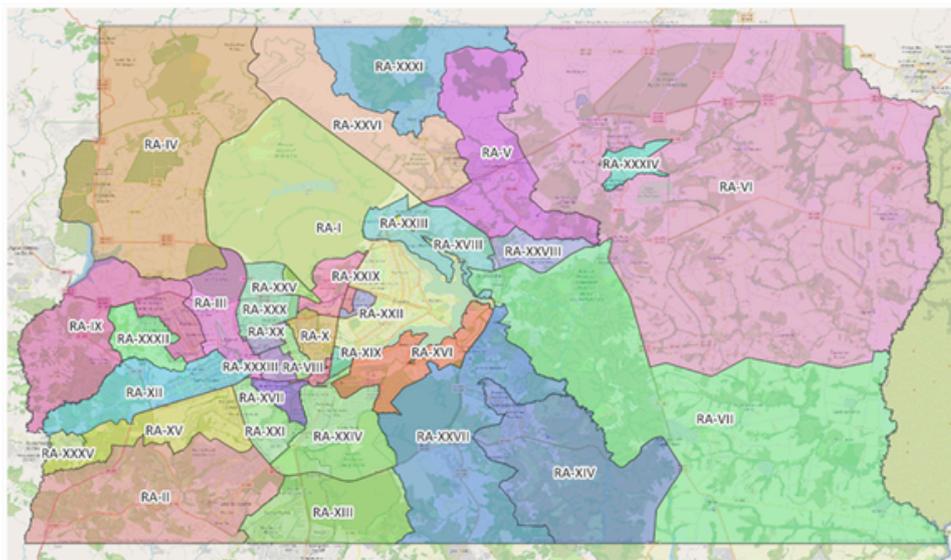

REGIÕES ADMINISTRATIVAS		
RA I - PLANO PILOTO	RA X - GUARÁ	RA XX - ÁGUAS CLARAS
RA II - GAMA	RA XI - CRUZEIRO	RA XXI - RIACHO FUNDO II
RA III - TAGUATINGA	RA XII - SAMABAIA	RA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL
RA IV - BRAZLÂNDIA	RA XIII - SANTA MARIA	RA XXIII - VARJÃO
RA V - SOBRADINHO	RA XIV - SÃO SEBASTIÃO	RA XXIV - PARK WAY
RA VI - PLANALTINA	RA XV - RECANTO DAS EMAS	RA XXV - SCIA
RA VII - PARANOÁ	RA XVI - LAGO SUL	RA XXVI - SOBRADINHO II
RA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	RA XVII - RIACHO FUNDO	RA XXVII - JARDIM BOTÂNICO
RA IX - CEILÂNDIA	RA XVIII - LAGO NORTE	RA XXVIII - ITAPOÃ
	RA XIX - CANDANGOLÂNDIA	RA XXIX - SIA
		RA XXX - VICENTE PIRES
		RA XXXI - FERICAL
		RA XXXII - SOL NASCENTE/PÔR DO SOL
		RA XXXIII - ARNIQUEIRA
		RA XXXIV - ARAPOANGA
		RA XXXV - ÁGUA QUENTE

Fonte: SEEC/SEFIN/SUPLAN.

Etapas de Obras por Região Administrativa SAG 2025 - 2º bimestre

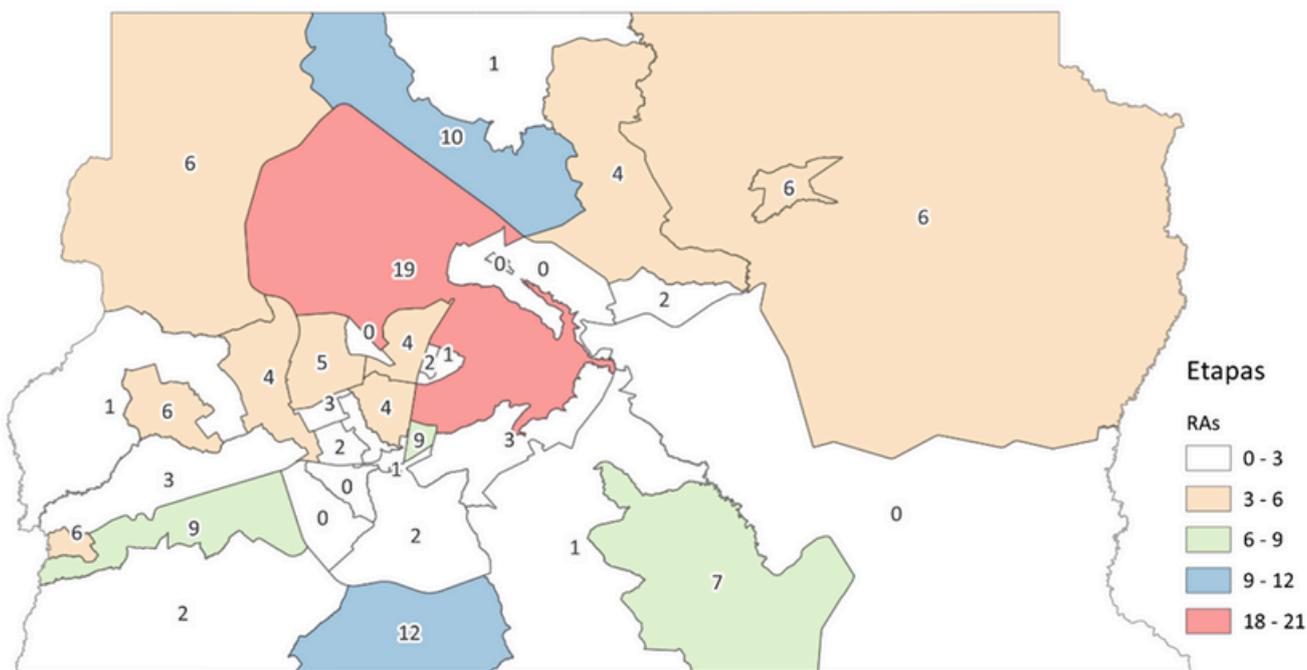

Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 30/04/2025.

A seguir, constam os tipos de obras das etapas, conforme classificação constante no Manual (Tabela 1 - Código de Obras).

TIPO DE OBRAS	QUANTIDADE
Obras no sistema de Saneamento	28
Obras de energia elétrica e iluminação pública	17
Obras de urbanização	75
Obras e edificações públicas	92
Obras para fins desportivos e de lazer	39
Obras para fins culturais	6
Obras para fins de educação	72
Obras para fins de saúde	16
Obras para fins de segurança	6
Obras para fins de assistência social	8
Obras de transporte	64
Obras para fins de segurança de trânsito	2
Obras para fins habitacionais	6
Obras para fins de preservação do meio ambiente	10
Obras para fins de agricultura	2
Obras para fins de desenvolvimento econômico	5
Serviços de Engenharia	10
TOTAL	458

As principais unidades orçamentárias que cadastraram etapas relativas a obras no 2º bimestre estão discriminadas a seguir:

- 1) Secretaria de Educação: 62 etapas;
- 2) Secretaria de Obras: 45 etapas;
- 3) DER: 40 etapas.
- 4) Caesb: 28 etapas; e
- 5) Terracap: 21 etapas.

REALIZAÇÕES DE DESTAQUE

A seguir, apresentamos as realizações de destaque dentre as etapas cadastradas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG no 2º Bimestre de 2025, conforme apontamentos das unidades orçamentárias do Complexo Administrativo do Distrito Federal.



Etapa de pavimentação da reforma da Praça do Relógio em Taguatinga. Agência Brasília.

15101

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SECOM

65 ANOS BRASÍLIA

A Secretaria realizou a campanha publicitária de divulgação das festividades e ações comemorativas do Aniversário de 65 Anos de Brasília, incluindo a criação da arte destinada a promoção do referido aniversário.



VAI DE GRAÇA

Ademais, o Órgão realizou a campanha publicitária de divulgação do Programa Vai de Graça, que oferece transporte gratuito aos domingos e feriados, promovendo a mobilidade da população do Distrito Federal.



SELEÇÃO ESTUDANTIL DA UNDF ABRE VAGAS PARA NOVOS CURSOS EM 2025: PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO E ECONOMIA

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) publicou, em 30/04, no Diário Oficial do DF, o edital do Processo Seletivo Estudantil 2025. A principal novidade deste ano é a inclusão dos cursos de Psicologia, Nutrição e Economia, ampliando para 17 o total de graduações ofertadas, entre licenciaturas, bacharelados e cursos tecnológicos.

Como nas edições anteriores, a seleção será baseada na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), podendo o candidato utilizar o resultado de qualquer uma das últimas cinco edições: 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024. A escolha da nota a ser utilizada ficará a critério do próprio candidato.

QUADRO DE VAGAS						
TURNO	LOCAL	CURSO	TIPOS DE GRADUAÇÃO	PERÍODO DE DURAÇÃO MÍNIMA DO CURSO (EM SEMESTRES)	VAGAS	
MANHÃ		PSICOLOGIA	LICENCIATURA	03	40	
		MATEMÁTICA	LICENCIATURA	03	40	
		LETRAS - PORTUGUÊS	LICENCIATURA	03	40	
		ENGENHARIA DE SOFTWARE	BACHARELADO	03	40	
		ENGENHARIA DE INFORMÁTICA	BACHARELADO	03	40	
TARDE	CAMPUS MIXTE	CURSO AMBIENTAL	TECNOLÓGICO	04	40	
		CURSO AMBIENTAL	TECNOLÓGICO	04	40	
		LETRAS - INGLÊS	LICENCIATURA	03	40	
		CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	TECNOLÓGICO	03	30	
		BIOTECNIA	TECNOLÓGICO	03	30	
NOITE	CAMPUS EQUINOCTIAL	PRODUÇÃO CULTURAL	TECNOLÓGICO	03	40	
		LETRAS - PORTUGUÊS	LICENCIATURA	03	40	
		SERVIÇO SOCIAL	BACHARELADO	03	40	
		RECURSOS HUMANOS	BACHARELADO	03	40	
		CURSO PÚBLICA	TECNOLÓGICO	03	40	
		CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TECNOLÓGICO	03	40	
		ECONOMIA	BACHARELADO	03	40	
CAMPUS EQUINOCTIAL	CAMPUS EQUINOCTIAL	NUTRIÇÃO	BACHARELADO	04	40	
		PSICOLOGIA	BACHARELADO	04	40	
TOTAL DE VAGAS					740	


18.203



UNDF LANÇOU A PRIMEIRA EDIÇÃO DO E-BOOK " VOCÊ SABIA?"

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), por meio da Diretoria de Avaliação (DIAV), lançou a primeira edição do e-book "Você sabia?". Destinada aos estudantes da instituição, a publicação reúne e esclarece as principais dúvidas sobre os recursos e apoios disponíveis para a comunidade acadêmica, com base nas demandas identificadas na Avaliação Institucional.

Durante a análise, constatou-se que muitas das demandas mencionadas já haviam sido atendidas ou estavam em fase de implementação. O e-book foi elaborado com o objetivo de acolher as demandas apresentadas e, simultaneamente, divulgar de forma mais acessível os recursos e serviços já disponíveis na instituição, promovendo a aproximação entre a universidade e seus estudantes.



18.203



UNDF PARTICIPA DO CICLO 2025 DO SELO ODS EDUCAÇÃO

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), por meio da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Regional e Sustentável (PRODRS), garantiu a inscrição institucional no ciclo de certificação 2025 do Selo ODS Educação, promovido pelo Instituto Selo Social.

Após a homologação da inscrição, docentes da UnDF poderão registrar suas iniciativas diretamente com o apoio da PRODRS. O Selo ODS Educação tem como objetivo fomentar a participação ativa das instituições de ensino no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030.

Na edição de 2024, a UnDF foi certificada pelo projeto de extensão Sala Verde, do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. O projeto visou promover atividades de extensão, envolvendo ações de Cidadania, Sustentabilidade e Educação Ambiental, junto à comunidade universitária e a sociedade em geral.

Um dos critérios para certificação das instituições de ensino superior no Selo ODS Educação são de propiciar atividades e espaços de discussão sobre os ODS na Universidade e realizar pelo menos um evento sobre os ODS (como grupos de estudo, palestras, seminários, workshops, aulas temáticas, entre outros).




20.201



COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANEL VIÁRIO DO PARQUE BURLE MARX DO NOROESTE E NO PARQUE SUL DE ÁGUAS CLARAS – BRASÍLIA/DISTRITO FEDERAL

Instalação de 62 postes de iluminação pública no Anel Viário do Parque Burle Marx e 14 postes de iluminação pública no Parque Sul de Águas Claras.

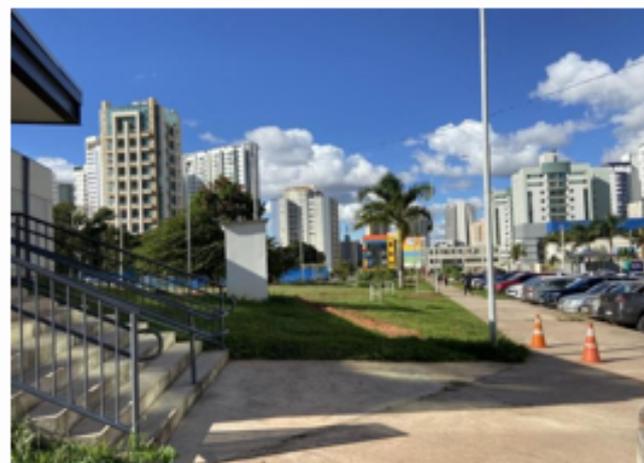

Imagens enviadas pelo órgão.

20.201



COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CERCAMENTO COM MURO NAS QUADRAS 2 E 4 DO RESIDENCIAL ALDEIAS DO CERRADO. (CONTRATO 81/2024)

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, COM AS REDES, POÇOS DE VISITA, CAPTAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS DOIS RESERVATÓRIOS, LANÇAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS PROJETADAS, JUNTAMENTE COM A IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, ESTACIONAMENTOS, MEIOS-FIOS, PASSEIOS, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES, NAS QUADRAS RESIDENCIAIS 02 E 04 E A COMERCIAL 02/04 DO CONDOMÍNIO ALDEIAS DO CERRADO (CONTRATO 129/2024)



Imagem enviada pelo órgão.

21.208

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM

BRASÍLIA AMBIENTAL



HARPIA

O sistema de peticionamento eletrônico representa uma ação estratégica voltada à modernização da administração pública, com foco na eficiência, acessibilidade e integração dos serviços prestados ao cidadão.

O peticionamento eletrônico elimina barreiras físicas e temporais ao permitir que o cidadão encaminhe suas demandas diretamente por formulários eletrônicos pela internet, de forma simples e rápida, sem a necessidade de comparecimento presencial. Isso reduz significativamente o tempo gasto na formulação de pedidos, representando um ganho de eficiência para o usuário que, muitas vezes, depende de respostas ágeis para resolver questões de junto ao Brasília Ambiental.

Além disso, ao evitar deslocamentos, o sistema contribui para a democratização do acesso aos serviços e políticas públicas, principalmente para cidadãos residentes em áreas mais distantes ou com dificuldades de mobilidade. Tal medida está alinhada com os princípios constitucionais da eficiência e da ampla acessibilidade aos serviços públicos.

O peticionamento eletrônico proporciona um ganho substancial de tempo e organização no atendimento, uma vez que os pedidos podem ser triados, classificados e processados de forma mais ágil e automatizada, com registro digital desde a entrada até a conclusão da demanda. Isso reduz gargalos operacionais, elimina retrabalhos e promove uma atuação mais responsiva e eficaz por parte dos órgãos responsáveis.

Por fim, o uso de soluções tecnológicas como esta fortalece a integração entre os diversos sistemas e setores da administração pública, favorecendo a interoperabilidade e a transparência. A inovação, nesse contexto, facilita a relação entre o cidadão e o poder público, reforçando a confiança nas instituições e consolidando um modelo de gestão pública centrado no cidadão, mais eficiente, moderno, inclusivo e transparente.

21.208

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM BRASÍLIA AMBIENTAL



DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

A digitalização de documentos em formato físico no âmbito desta instituição, como medida de modernização, eficiência e ampliação do acesso aos serviços públicos.

Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, torna-se imprescindível a adoção de soluções digitais que substituam procedimentos manuais, de modo a atender às exigências de agilidade, rastreabilidade, segurança e economicidade nos fluxos administrativos.

A digitalização permitirá que o cidadão formule suas consultas de demandas a administração pública com maior rapidez e autonomia, reduzindo o tempo gasto na elaboração e entrega de documentos físicos. Adicionalmente, elimina-se a necessidade de deslocamento até os órgãos públicos, o que representa um avanço significativo na inclusão digital e na acessibilidade aos serviços por parte de populações que enfrentam restrições de mobilidade ou barreiras geográficas.

A transformação de documentos físicos em digitais reduz a burocracia, melhora o controle dos processos e amplia a capacidade de resposta às necessidades da população. Além disso, promove a padronização dos procedimentos, facilita a gestão documental e reduz custos com papel, transporte, arquivamento e espaço físico.

A digitalização também está alinhada com os princípios da eficiência e da inovação, conforme estabelecido na Lei nº 14.129/2021 (Lei do Governo Digital), ao permitir a integração entre sistemas e bases de dados institucionais, promovendo a interoperabilidade e a transparência na atuação pública.

Nesse contexto, a iniciativa contribui diretamente para a melhoria da relação entre o cidadão e o Estado, fortalecendo a confiança institucional e consolidando uma gestão pública mais moderna, eficaz e orientada por resultados.

22.101

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SODF

ETAPA 0016

INFRAESTRUTURA URBANA REMANESCENTES DO SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE, TRECHO 03 - LOTE 02 - CONTRATO Nº 023/2022

A intervenção consistena execução dos serviços de pavimentação, drenagem pluvial, meios fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e bacias de retenção no Trecho 03 - Lote 02 do Setor Habitacional Sol Nascente.

- % executada até o 2º bimestre/2025: 84,00%.
- Principais serviços executados no 2º bimestre:
 - o Drenagem pluvial: 800m;
 - o Pavimentação asfáltica: 12.000 m²;
 - o Pavimentação em intertravado: 15.000 m²;
 - o Implantação de calçadas: 8.000 m²; e
 - o Assentamento de meios fios: 22.000 m.



Execução de drenagem pluvial – Galeria de águas pluviais.



Execução de pavimento asfáltico



Execução de pavimento intertravado.



Assentamento de meios fios.

Imagens enviadas pelo órgão.

22.101

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SODF

ETAPA 0033

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REMOÇÃO DE REDES ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS NA RUA 1 E NA RUA PRINCIPAL DO ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 13/2024:

A intervenção visa garantir os parâmetros mínimos de segurança e qualidade no fornecimento de energia elétrica regular na região, ocupada de forma desordenada com consequente expansão de redes de distribuição de energia elétrica implantadas sem o devido dimensionamento e atenção às normas técnicas da concessionária local. A execução dos serviços restringe-se aos trechos de rede localizados na Rua Principal, DF-001 e Rua 01 do Assentamento.

- % executado até o 2º bimestre/2025: 68,30%.
- Principais serviços executados no 2º bimestre:
 - o Aquisição de materiais: 3,30%;
 - o Implantação, energização e transferência de rede de distribuição: 10,50%.



Materiais elétricos.



Materiais elétricos.

Imagens enviadas pelo órgão.

22.101

**SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
SODF**

ETAPA 0033

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REMOÇÃO DE REDES ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS NA RUA 1 E NA RUA PRINCIPAL DO ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO - CONTRATO Nº 13/2024:



Implantação, energização e transferência de rede de distribuição.



Implantação, energização e transferência de rede de distribuição.

Imagens enviadas pelo órgão.

22.101

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL SODF

ETAPA 0030

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO NOS SEGMENTOS 3A E 12 DA RODOVIA DF-009, LOCALIZADA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE - RA XVIII - CONTRATO Nº 9/2024:

A restauração da DF-009, com área aproximada de 21.505,24m², tem como objetivo recuperar o pavimento da rodovia, prolongando a sua vida útil e reestabelecendo as condições de segurança, conforto e trafegabilidade.

- % executado até o 2º bimestre/2025: 96,00%.
- Principais serviços executados no 2º bimestre:
 - o Fresagem: 396 m³; e
 - o Pavimento flexível: 14.562 m².



Pavimentação asfáltica sobre a DF-009.



Pavimentação asfáltica sobre a DF-009.



Pavimentação asfáltica sobre a DF-009.



Pavimentação asfáltica sobre a DF-009.

Imagens enviadas pelo órgão.

23.901

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

FS-DF

UBS DE SANTA MARIA TERÁ ESTRUTURA MODERNA E CAPACIDADE PARA 300 ATENDIMENTOS DIÁRIOS

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) está finalizando as obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) de Santa Maria, localizada no comércio local da Quadra 109. A unidade terá capacidade para atender até 300 pacientes por dia, representando um desafogo da rede pública de saúde da região administrativa. A construção ocorre em cooperação com a Secretaria de Saúde (SES-DF).

A UBS de Santa Maria segue o modelo Modular Tipo II, com uma estrutura ampla e moderna. O espaço contará com recepção, banheiros públicos adaptados, farmácia, salas para atividades educativas, consultórios odontológicos e áreas específicas para exames, curativos, imunização, aplicação de medicamentos, inalação e esterilização. A unidade também terá setores técnicos e administrativos, além de sanitários funcionais e depósitos de material de limpeza.

A coordenadora de Atenção Primária da Secretaria de Saúde, Sandra Araújo, celebra: “A entrega da nova UBS representa um avanço fundamental para nossa comunidade. Com estrutura moderna, equipes integradas e serviços de promoção, prevenção e cuidado contínuo, garantiremos atendimento mais ágil, acolhedor e resolutivo, fortalecendo a rede do SUS e oferecendo à população um ponto de referência de saúde próximo, humanizado e capaz de responder às necessidades de cada família”.



Imagem enviada pelo órgão.

23.901

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

FS-DF

AVANÇAM REVITALIZAÇÕES EM PEDIATRIA DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA

As adequações no setor pediátrico do Hospital Regional de Ceilândia (HRC) estão avançadas. Três enfermarias já passaram por revitalização e a quarta está em andamento. Haverá, ainda, revitalizações nos banheiros, recepção, salas de triagem, área de espera e corredores. Os serviços devem ser concluídos ainda no primeiro semestre deste ano.

Em adição às melhorias físicas, a Secretaria de Saúde (SES-DF) investiu em itens para o setor. Em dezembro, foram adquiridas 342 cadeiras - para uso de pacientes, servidores e acompanhantes em todos os setores do HRC. Também foram recebidos biombos e carrinhos para o transporte de medicamentos e materiais.

As revitalizações atendem tanto aos requisitos de proporcionar mais conforto a pacientes, acompanhantes e servidores quanto às normas previstas para unidades hospitalares. Em cada área são modernizadas as redes elétrica, hidráulica e de gases, o que inclui rede de vácuo, fornecimento de gás comprimido e de oxigênio.



Imagem enviada pelo órgão.

26.205

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

DER-DF

DUPLICAÇÃO DA DF-140

O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou a duplicação da DF-140, localizada nas proximidades de São Sebastião e do Jardim Botânico, e a nova ponte sobre o Ribeirão Santana. A DF-140 passa por diversos condomínios do Jardim Botânico e do Setor Habitacional Tororó, além de funcionar como principal rota de acesso a São Sebastião e uma das portas de entrada para motoristas vindos de municípios goianos, como Cidade Ocidental e Luziânia. A obra ampliou a capacidade da via em toda a sua extensão de 14,8 km, para melhorar a segurança e a fluidez no tráfego dos cerca de 20 mil motoristas que utilizam a rodovia diariamente. O investimento foi de R\$ 22 milhões, com geração de 200 empregos.

O serviço, executado pelo DER-DF, contou com terraplanagem, pavimentação, restauração dos pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, ações complementares e paisagismo. A pista antiga foi totalmente recapeada para oferecer conforto e segurança em todo o trajeto. Além disso, rodovia ganhou novos abrigos de ônibus. Ao todo, 19 paradas tipo C (tamanho padrão com três módulos feitos de concreto) em 17 locais da rodovia pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob).



Imagens enviadas pelo órgão.

SAG 2025 CRONOGRAMA 3º BIMESTRE

O SAG WEB - Sistema de Acompanhamento Governamental foi aberto no dia 12 de junho de 2025 e permanecerá disponível até o dia 14 de julho de 2025, para a realização das atualizações pelas Unidades Orçamentárias referente ao 3º bimestre. Após análise de conformidade pela equipe técnica da SUPLAN, será publicado o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro do 3º Bimestre, até o dia 30 de julho de 2025.

Salientamos que, no site da Secretaria de Economia, estão disponíveis o Manual de Orientações, o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro (bimestral) e demais documentos relativos ao SAG.
