



Secretaria de Estado  
de Economia

# Sistema de Acompanhamento Governamental

Acompanhamento da Execução Físico-Financeira das Ações  
Governamentais  
via sistema SAG WEB

SAG Novo

1. Planejamento e execução governamental...3-5
2. Acompanhamento da execução físico-financeira da ação governamental: definição...6
3. Apoio técnico...7
4. Fundamentação legal...8
5. Subsídios – 1º ao 5º Bimestre...9
6. Conceitos
  - 6.1 Cronograma...10
  - 6.2 Objeto do acompanhamento da execução governamental...11
  - 6.3 Ações orçamentárias: definição, tipos e identificação, etapas procedentes. ...12-15
  - 6.4 Execução física, orçamentária e financeira: identificação ...16
  - 6.5 Estágios: classificações, transições não autorizadas e regularidade...17-18
  - 6.6 Desvios: estágios não regulares, cadastramento e atualização... 19-21
7. Novo SAG
  - 7.1 Propostas...23
  - 7.2 Poka Yoke...24
  - 7.3 Inovação...25
  - 7.4 Foco... 26
  - 7.5 Elementos-chave da estrutura do sistema: processos e ações ...27-28
  - 7.6. Aspectos técnicos e operacionais...29
    - 7.6.1 Login...30-32
    - 7.6.2 Tela Listar Etapa Programada...33
    - 7.6.3 Subtítulos: quais cadastrar e quando ...34
    - 7.6.4 Cadastrar etapa ... 35-39
    - 7.6.5 Alterar / Detalhar etapa programada...40-43
    - 7.6.6 Atualizar Etapa Programada...44-52
    - 7.6.7 Relatórios ... 53-58
8. Links úteis...59
9. Contato...60




# PROGRAMAÇÃO

# PLANEJAMENTO

SAG Novo


## e Execução Governamental



# PLANEJAMENTO

**SAG** Novo


## e Execução Governamental

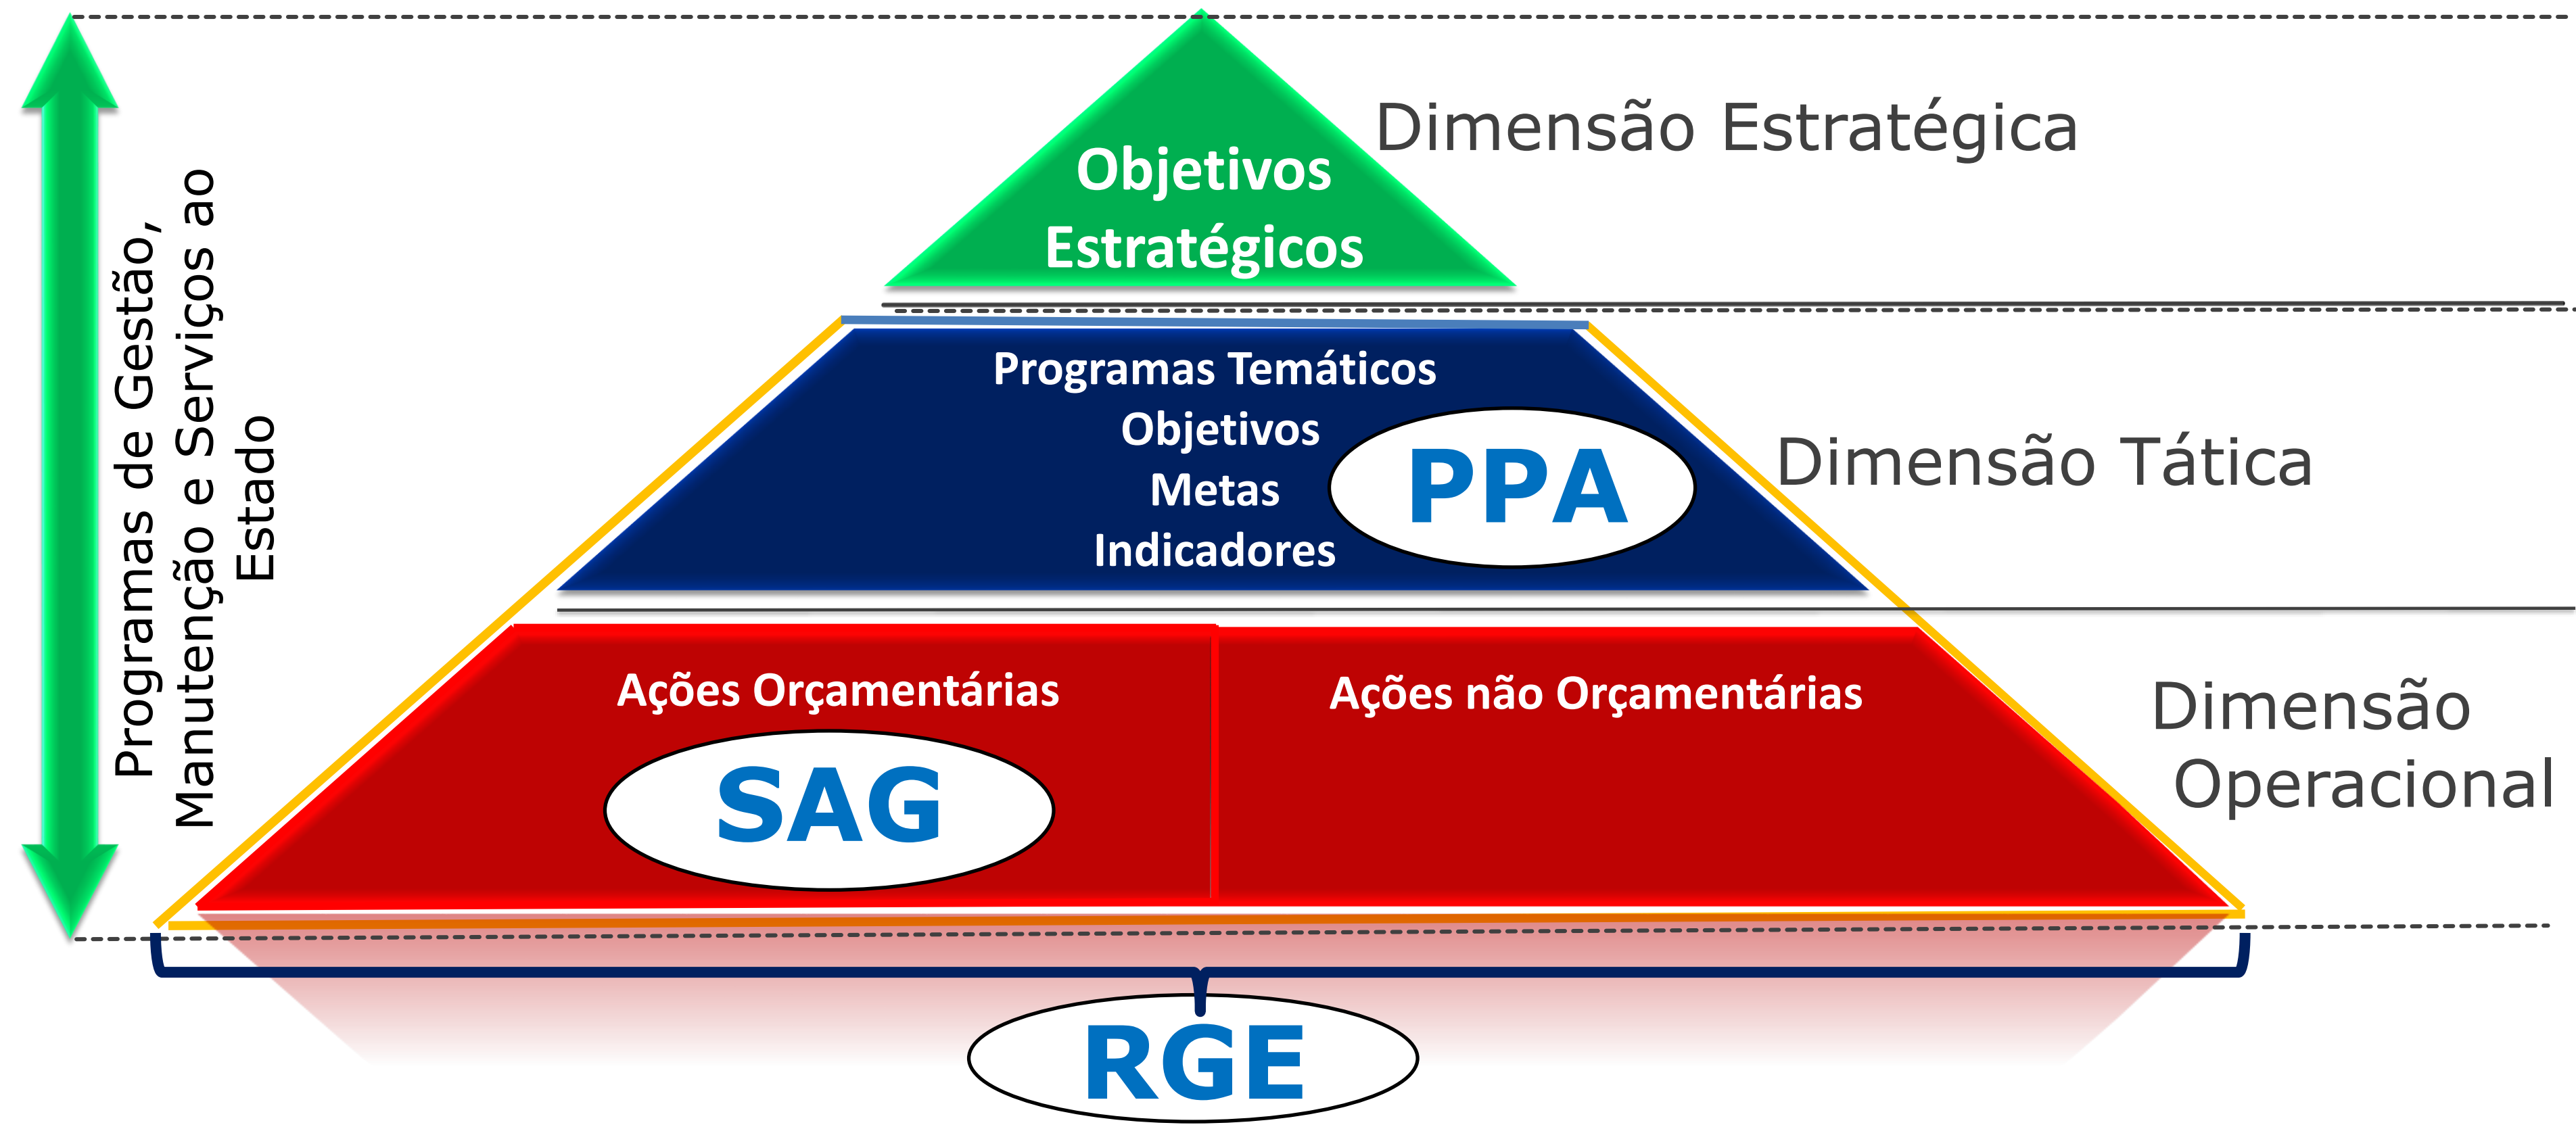

# PLANEJAMENTO

## e Execução Governamental

### Etapas do ciclo PDCA

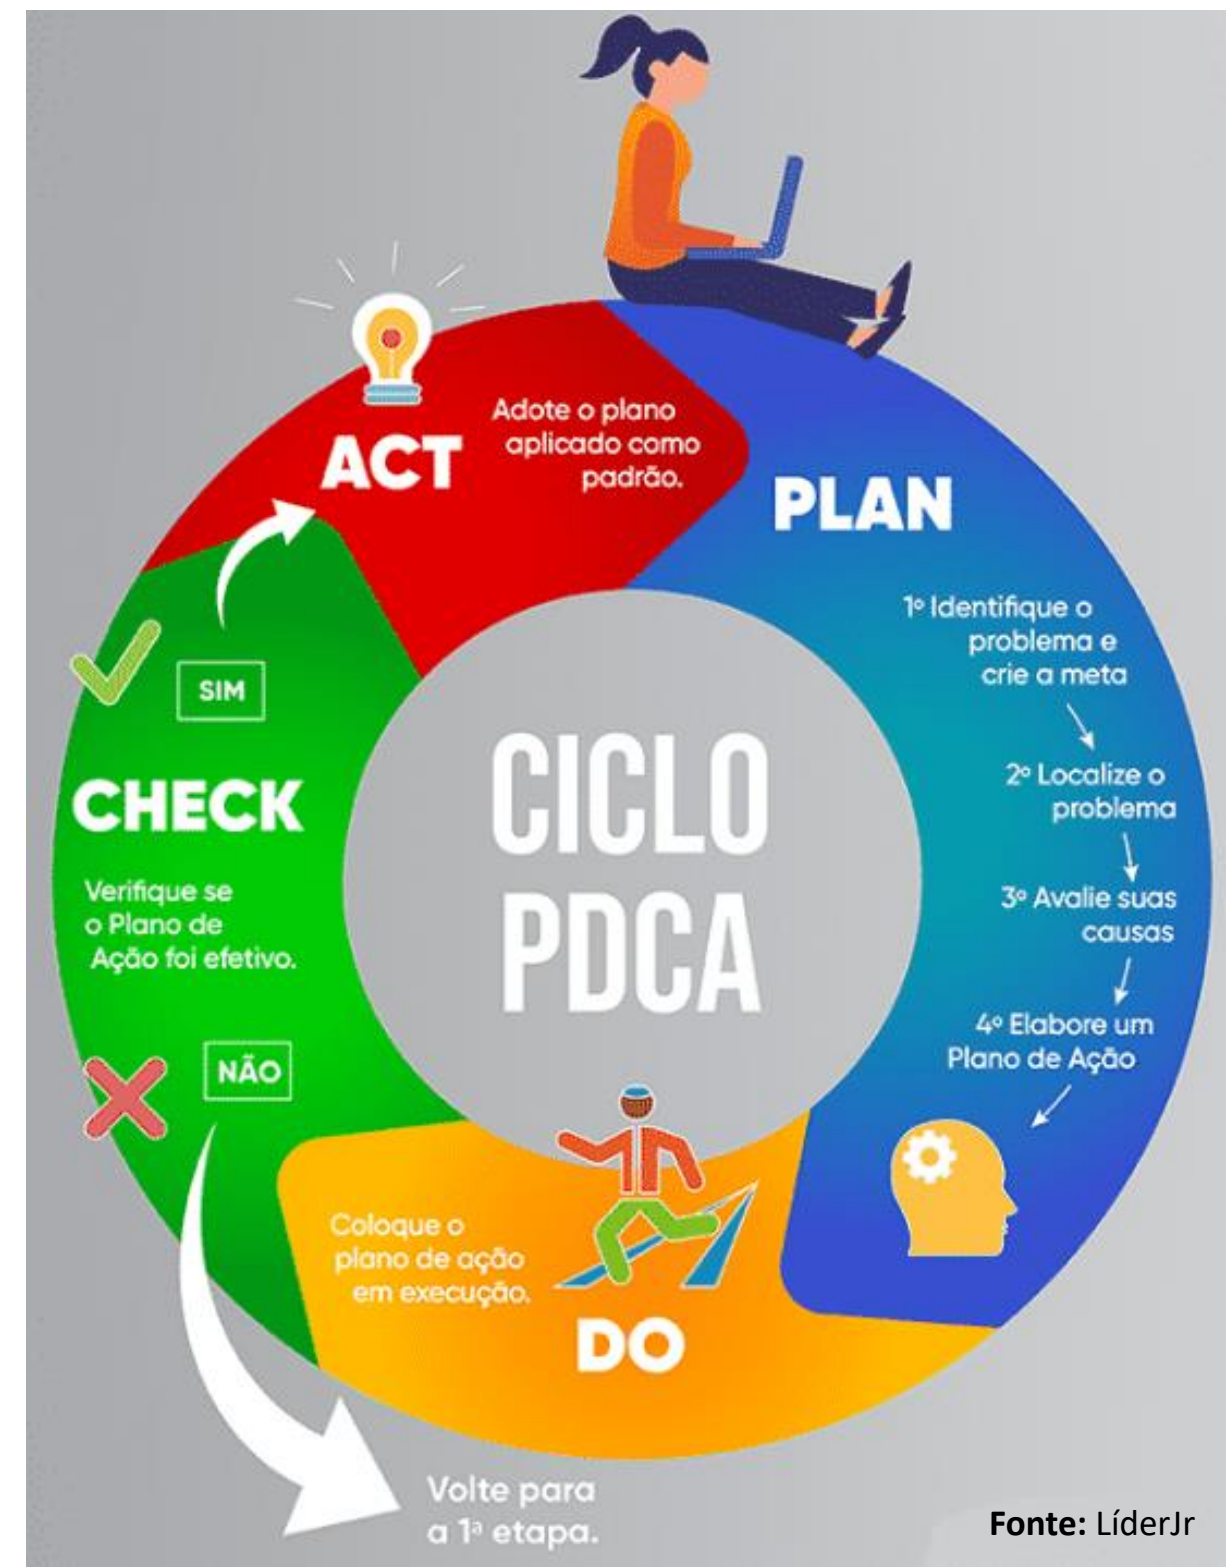

# DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO

## Acompanhamento da Execução Físico-Financeira

O acompanhamento da execução físico-financeira das ações governamentais, consubstanciado no relatório de Desempenho Físico-Financeiro – composto pelo Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho, pelo Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa e pelo Relatório das Etapas Programadas em Desvio, cujo apoio técnico e operacional à elaboração, a análise crítica, a consolidação e a publicação se encontram sob gestão da SUPLAN, órgão central de planejamento governamental, é um importante instrumento de planejamento que possibilita aos dirigentes das unidades orçamentárias do GDF demonstrarem aos **órgãos de controle**, às demais **unidades do governo** e à **sociedade**, o andamento das ações de governo durante o exercício, além de dar **publicidade e transparência** à execução físico-financeira dos recursos públicos.

## **Apresentação**

Disponível no site [www.economia.df.gov.br](http://www.economia.df.gov.br)

## **Manual com orientações**

Disponível no site [www.economia.df.gov.br](http://www.economia.df.gov.br)



## **Atendimento às UOs – Equipe técnica da SUPLAN**

Telefone (chamadas de voz ou mensagens de texto)

Atendimento nas dependências da SUPLAN ou visita técnica à UO, ambos mediante agendamento.

# APOIO TÉCNICO

✓ **Lei Orgânica do DF - art. 153, inciso III**

Art. 153. O Poder Executivo publicará, até o trigésimo dia após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, do qual constarão:

I - as receitas, despesas e a evolução da dívida pública da administração direta e indireta em seus valores mensais;

II - os valores realizados desde o início do exercício até o último bimestre objeto da análise financeira;


III - relatório de desempenho físico-financeiro.

✓ **Decreto nº 39.118, de 13/06/2018**

Disciplina a implantação e utilização do Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG do Distrito Federal à estrutura dos programas de trabalho aprovados na Lei Orçamentária Anual, revoga o Decreto nº 18.075, de 07 de março de 1997, e dá outras providências.


✓ **Decreto 32.598, de 15/12/2010, art. 89 a 92.**

Aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e dá outras providências.

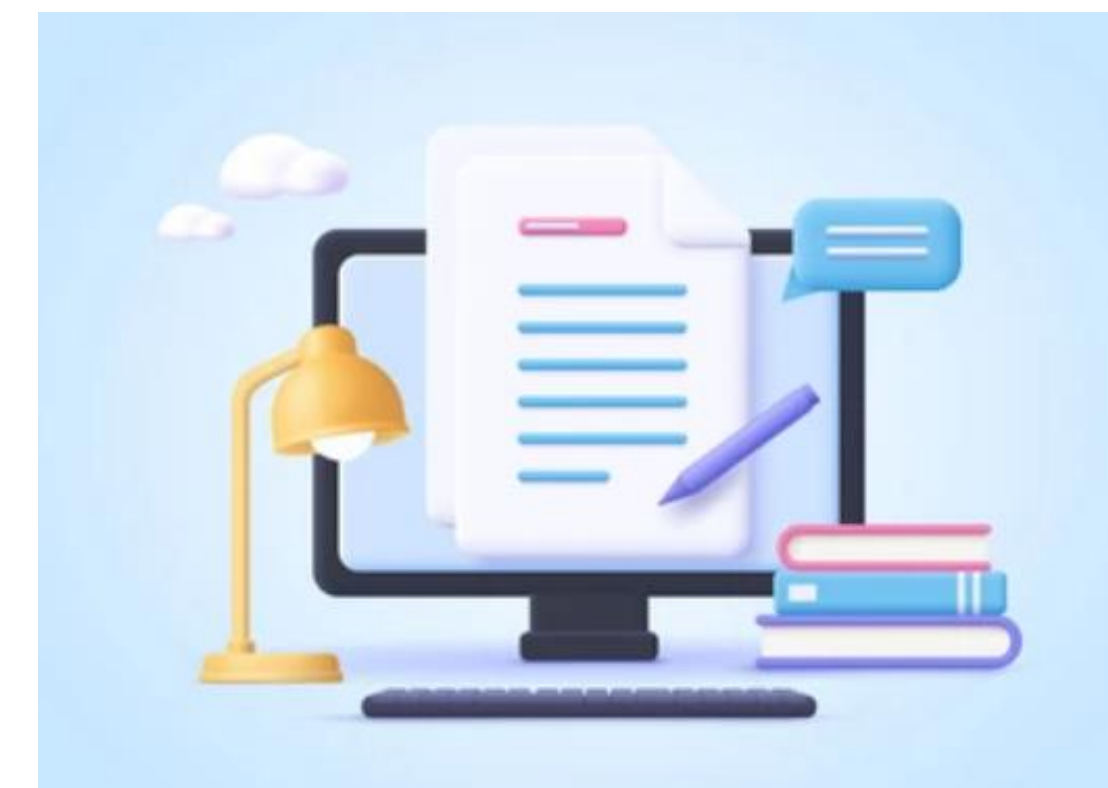



- ✓ QDD ou execução estatal relativo ao *bimestre em análise*
- ✓ LOA do *exercício em análise*
- ✓ Relatório de etapas programadas para execução relativo ao *exercício em anterior (6º bimestre)*, caso se trate do 1º bimestre do exercício em análise.
- ✓ Relatório de etapas programadas para execução relativo ao *bimestre em análise*
- ✓ Relatório de etapas programadas em desvio: relativo ao *bimestre em análise*
- ✓ Informações da execução oriundas das áreas técnicas da Unidade Orçamentária relativas ao *bimestre em análise*.

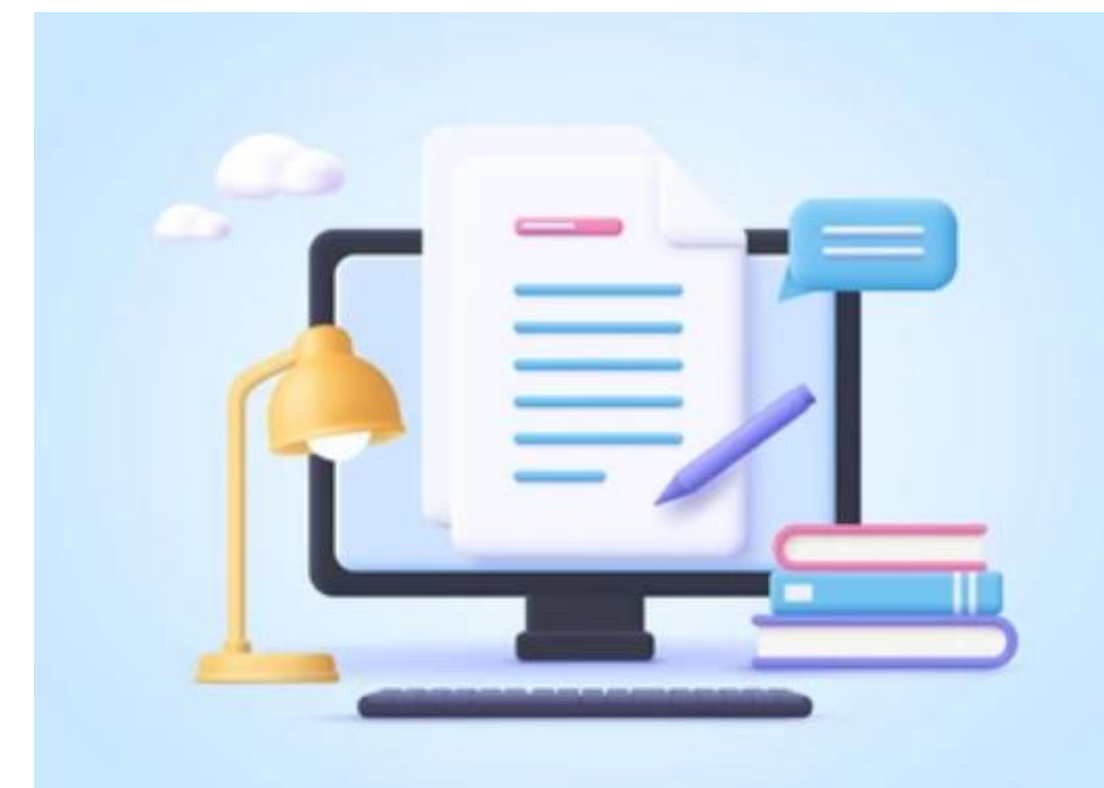

# SUBSÍDIOS

**Cadastramento, alteração e atualização de etapas 1º ao 5º Bimestre**

# CONCEITOS SAG

SAG  
Novo

## Acompanhamento da Execução Físico-Financeira Governamental via sistema SAG WEB

Bimestres	Período para cadastramento e atualização de etapas		Período para análise, cadastramento e alteração de etapas		Envio para publicação	Data limite publicação no DODF/site	
	Início	Término	Início	Término			
<b>1º Bim</b> 01/01/2024	29/02/2024	23/02/2024	18/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	27/03/2024	28/03/2024
Datas de início e término de cada bimestre	Período em que o SAG fica aberto, à disposição dos Agentes de Planejamento para cadastramento, atualização e alteração de etapas vinculadas aos Programas de Trabalho (PTs) contidos na LOA da Unidade Orçamentária.		Na data de início do período de análise, o SAG é bloqueado para atualizações. Os técnicos do Órgão Central então procedem à análise das informações prestadas e, caso haja pendências de cadastramento de etapas ou de prestação de informações, reabrem o sistema pontualmente, ou seja, apenas para as unidades que necessitam realizar ajustes.		Remessa de minuta de portaria de publicação do Relatório de Desempenho Físico Financeiro ao gabinete do Secretário da SEPLAD.		Publicação da Portaria no DODF e do Relatório no site da SEPLAD.

# CONCEITOS

## Acompanhamento da Execução Físico-Financeira Governamental via sistema SAG WEB

SAG  
Novo

As ações orçamentárias dos programas previstos no Plano Plurianual (PPA) desdobram-se em subtítulos na LOA e seus créditos, os quais devem ser acompanhados ***bimestralmente*** por meio do SAG.

# CONCEITOS

## Ações orçamentárias

SAG Novo

O programa e a ação orçamentária são elementos de integração entre o PPA, a LOA e o SAG e viabilizam a alocação de recursos para execução das políticas públicas.

### PROGRAMA DE TRABALHO (PT)

15.122.6001.1984.9818

**FUNÇÃO**

15

Urbanismo

**SUBFUNÇÃO**

122

Administração  
geral

**PROGRAMA**

6001

Gestão,  
manutenção e  
serviços ao  
estado

**AÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1984

Construção de  
prédios e próprios

**SUBTÍTULO**

9818

Construção de  
prédios e próprios  
Distrito Federal

# CONCEITOS

## Tipos de ações orçamentárias

SAG Novo

**Projeto:** conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a **expansão ou o aperfeiçoamento** da ação de Governo.

**Atividade:** conjunto de operações que se realizam de modo **contínuo e permanente**, do qual resulta um produto necessário à **manutenção da ação de Governo**.

**Operação Especial:** despesa que não contribui para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta, sob a forma de bens ou serviços.

# CONCEITOS

SAG Novo

## Tipos de ações orçamentárias

### PROGRAMA DE TRABALHO (PT)

99.9999.99999.39999.99999



**1, 3, 5 ou 7**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TIPO  
**PROJETO**

99.9999.99999.29999.99999



**2, 4, 6 ou 8**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TIPO  
**ATIVIDADE**

99.9999.99999.99999.99999



**9**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TIPO  
**OPERAÇÃO ESPECIAL**

# CONCEITOS

## Etapas procedentes - Evolução

SAG Novo

### Descritor da etapa:

0022 - Construir escola em Ceilândia com 20.000m<sup>2</sup>.  
Unidade de medida: m<sup>2</sup>  
Produto: 20.000

### Datas previstas:

Etapa nº 22/2015  
Início: 01/05/2015  
Término: 31/12/2019

Etapa nº 10/2016  
Início: 01/01/2016  
Término: 01/05/2019



2015: a etapa 22/2015 (original) não pode dar origem a etapa procedente, pois expirou por não ter havido liquidação no exercício de sua criação.  
Execução=0%

2016: Nova etapa criada para o mesmo objeto. Liquidação diferente de zero, logo etapa original=Etapa precedente=Etapa 10/2016.  
Execução=40%

2017: as obras evoluíram até julho, sendo paralisadas a seguir em decorrência de problemas técnicos. Liquidação diferente de zero.  
Execução: 60%

2018: as obras evoluíram a partir de maio, quando os problemas técnicos foram solucionados. Liquidação diferente de zero.  
Execução: 80%

2019: as obras evoluíram até sua conclusão. Liquidação diferente de zero.  
Execução: 100%

# EXECUÇÃO

## Execução física

### Identificação de execução

- ✓ Quantitativo físico executado informado pela UO, após ateste, mesmo sem liquidação ou execução.

## QDD

### Identificação de execução

- ✓ Valor liquidado

Liquidado
30.750,00
0,00
30.750,00

**QDD**

## Execução Estatal


### Identificação de execução

- ✓ Executado no mês
- ✓ Executado até o mês

**Execução  
Estatal**

Executado no Mês	Executado até o Mês
1.273.327,20	5.954.033,58
0,00	0,00



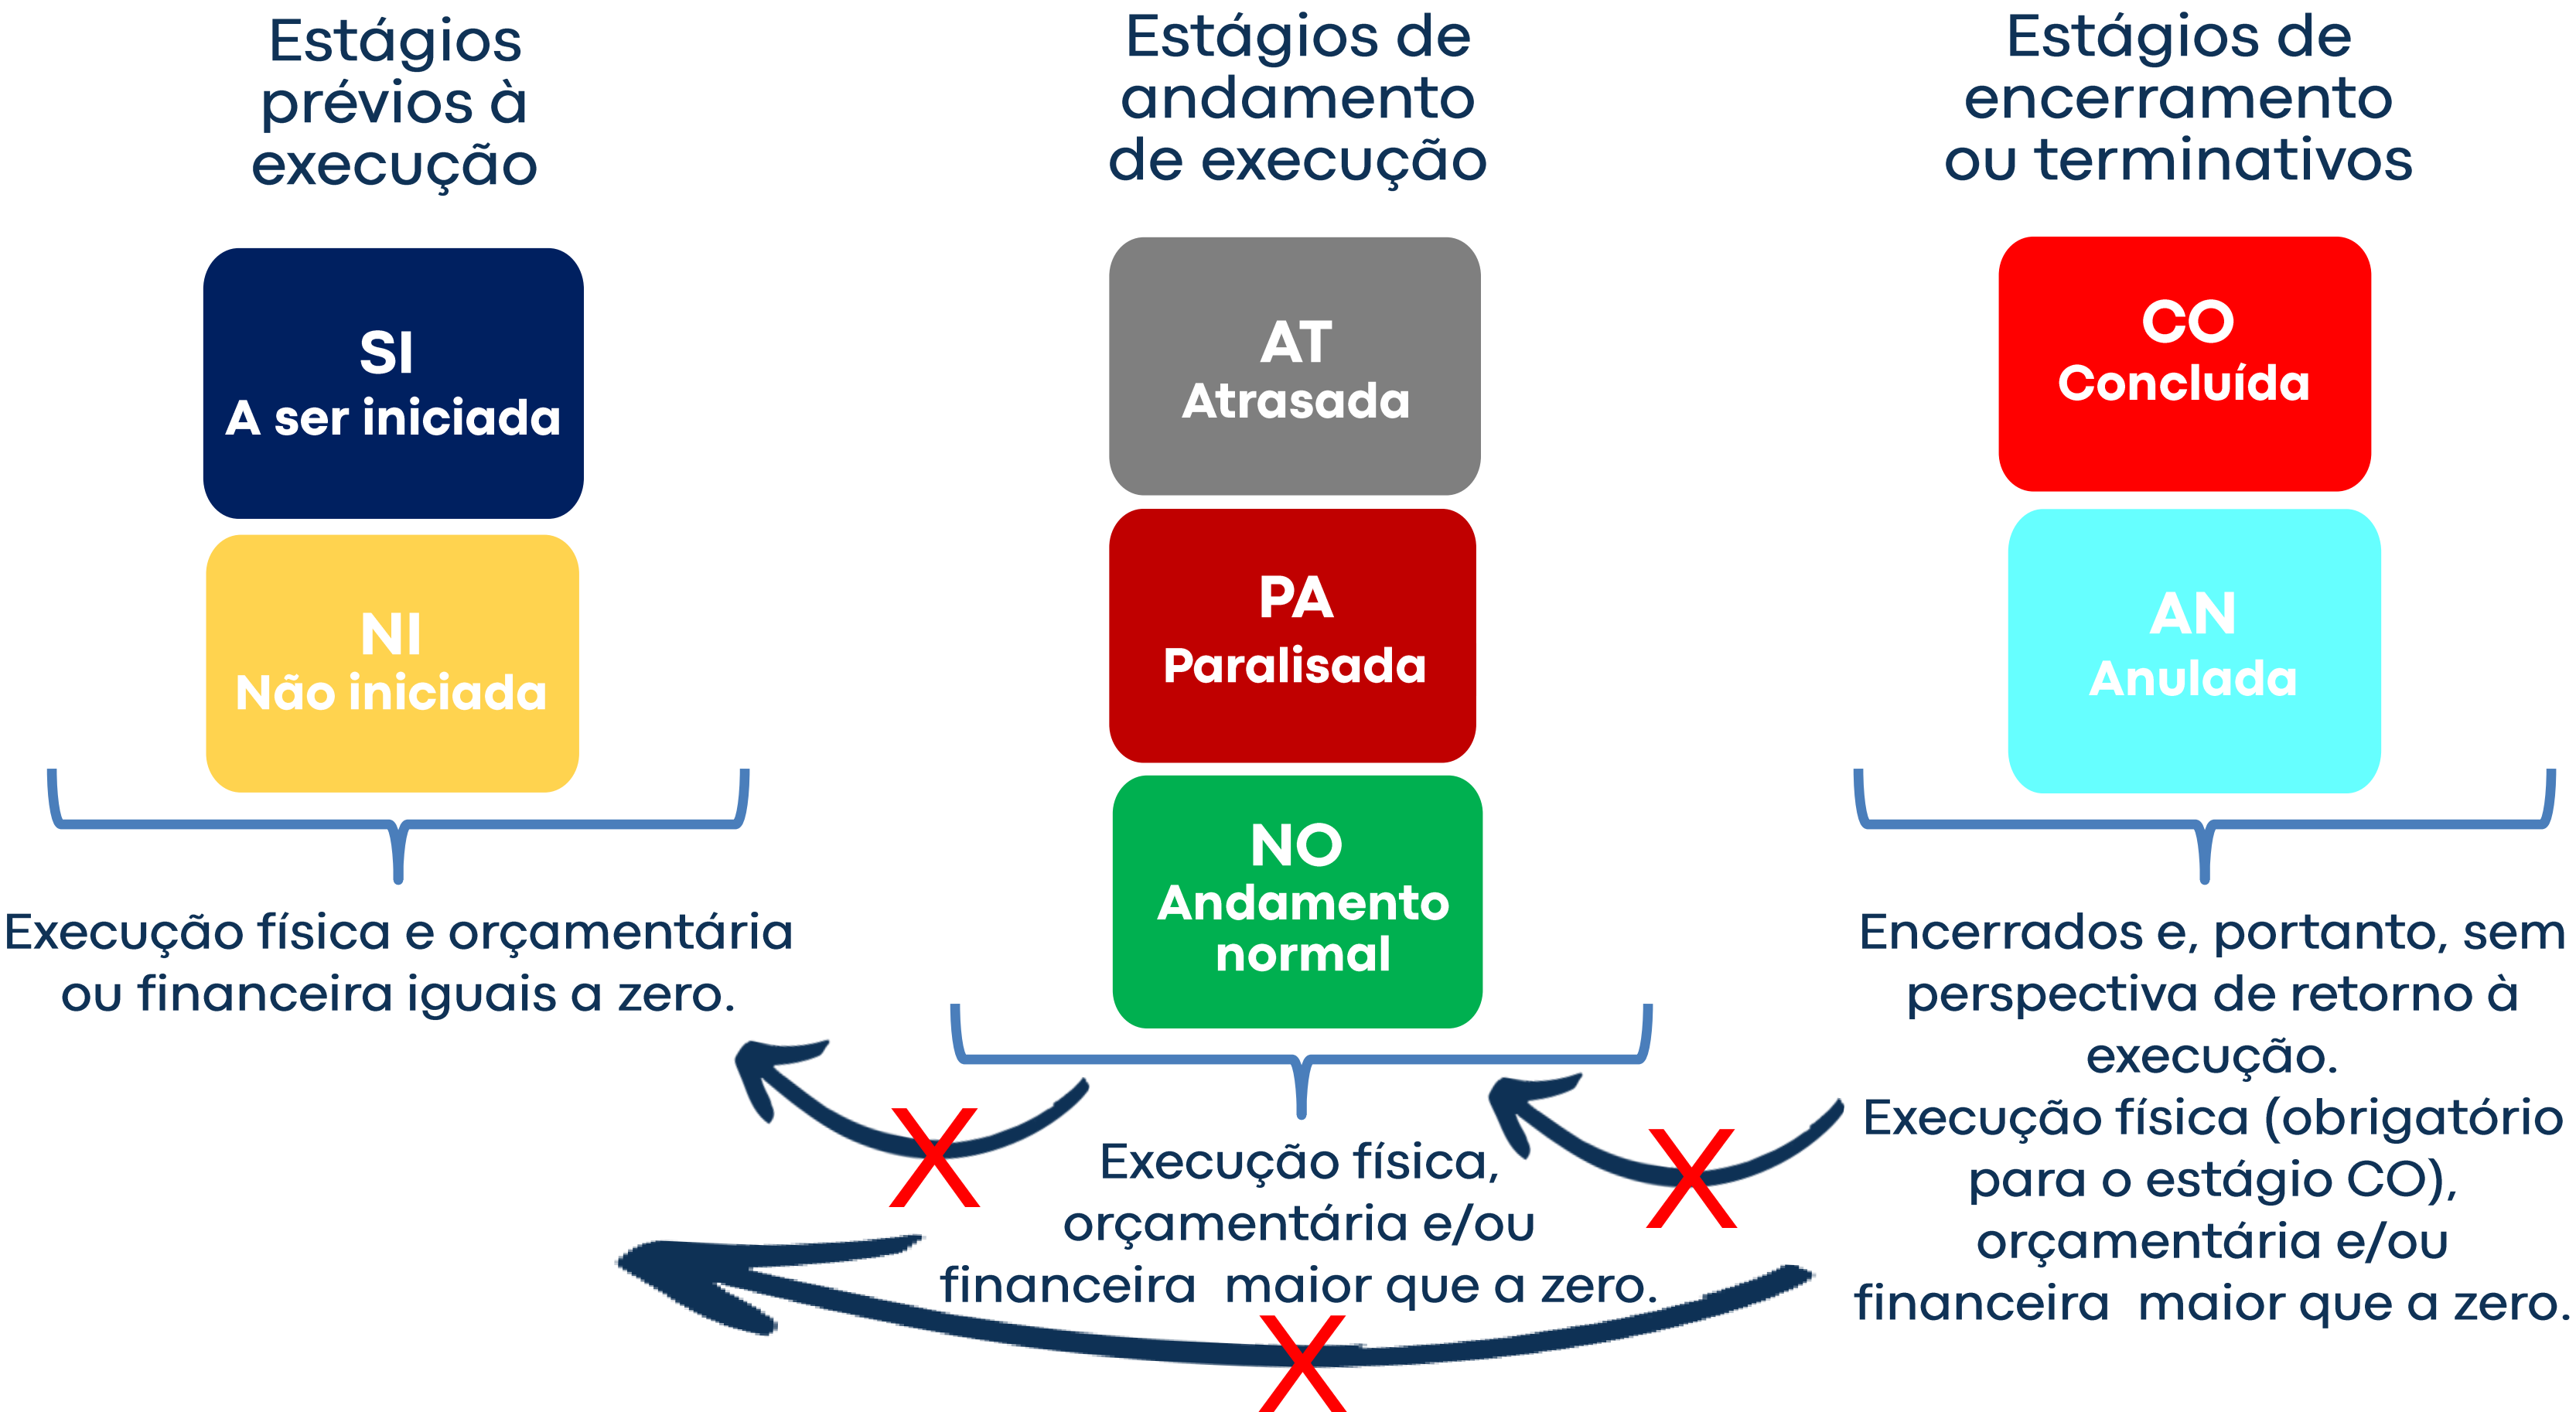

As setas indicam regressões de estágios vedadas ao Agente de Planejamento, exceto quando a transição ocorrer no bimestre em análise (antes da publicação do relatório correspondente, portanto), limitada ao estágio com que encerrou o bimestre anterior.

Fluxo regular de execução da etapa



Estágios que fogem ao fluxo regular de execução da etapa




Estágios regulares

Estágios não-regulares

Tipos: quanto à regularidade

## Cadastramento de desvios

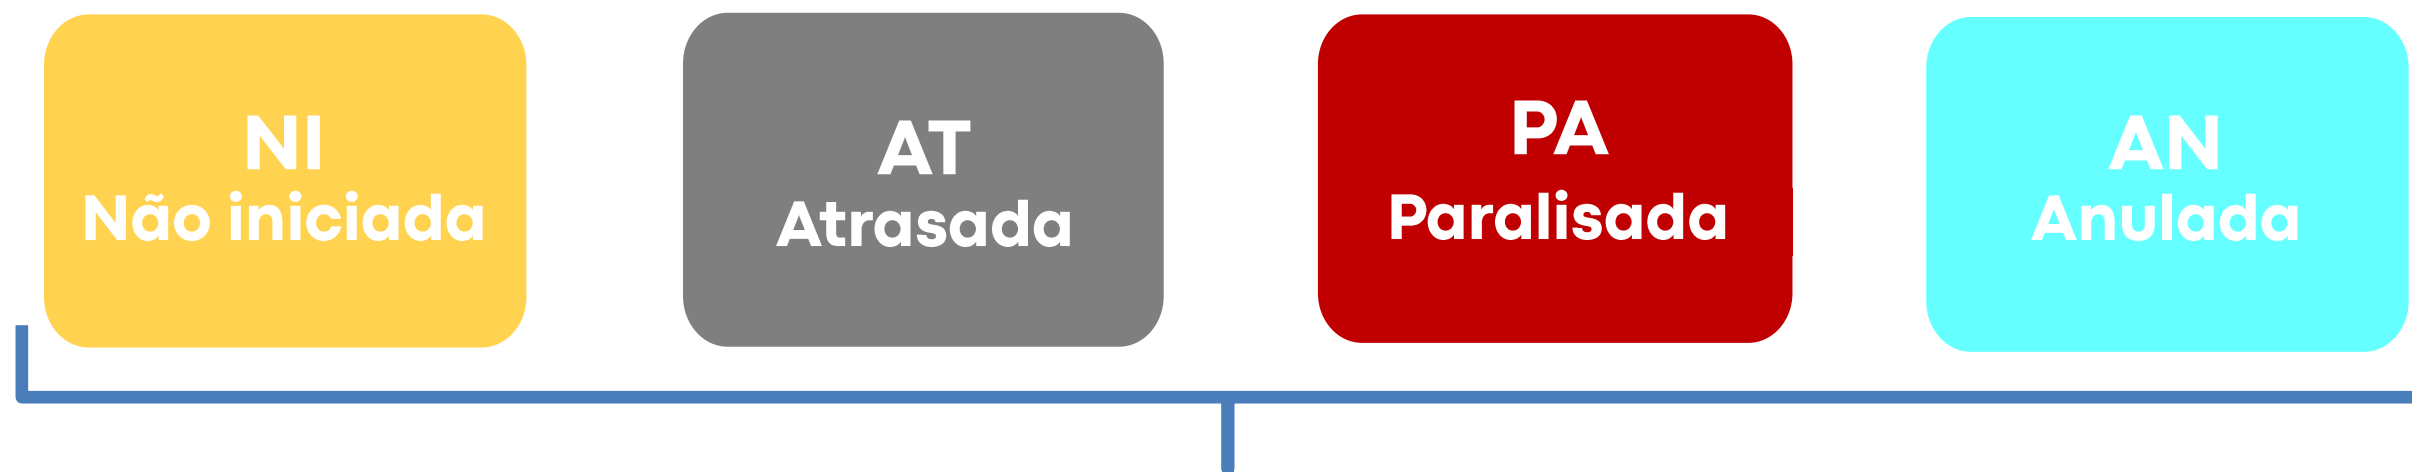

Estágios não-regulares  
Ensejam o cadastramento de desvios

A unidade orçamentária deve informar os **parâmetros de desvio**, ou seja: a **causa**, a **natureza**, o **detalhamento** e a **origem** do desvio, que devem ser compatíveis entre si e devem estar atualizados.



# Causas de desvio

APU – Alteração da programação da unidade executiva  
CCA – Crédito cancelado  
CCB – Crédito contingenciado ou bloqueado  
ICO – Insuficiência de créditos orçamentários  
IPT – Indefinição/reavaliação de projeto técnico  
IRF – Insuficiência de recursos financeiros  
IRH – Insuficiência de recursos humanos  
IRM – Insuficiência de recursos materiais  
MPA – Morosidade em procedimentos administrativos  
NOO – Necessidade de ação de outros órgãos  
OCD – Outras causas de desvio  
PD – Pendência de decisão  
PPL – Pendência ou morosidade no processo licitatório

Compatibilidade obrigatória

Naturezas de desvio

- 1 – Administrativa
- 2 – Técnica
- 3 – Financeira
- 4 – Jurídica
- 5 – Política
- 6 – Orçamentária
- 7 – Fenômenos naturais

# Detalhamento da causa de desvio



Informar de forma **clara e objetiva** o que causou o desvio, citando, de preferência, algum **documento da origem** que ampare o desvio.



## Origem do desvio



Informar o(s) local(is), setor(es) ou UO(s) causador(es) do desvio

# SACG



# Novo

**Sistema de Acompanhamento Governamental**


## Propostas

- ✓ **Acesso à base de dados pregressa:** permitir a consulta à base de dados de outros exercícios a partir de login no exercício em análise;
- ✓ **Informação online e “sob medida”:** prover a informação de que o usuário necessita online e de acordo com a necessidade do processo em andamento, eliminando a necessidade de geração e consulta a relatórios (LOA, REPE, QDD, Execução Estatal, REPE Desvios);
- ✓ **Acesso ao sistema:** permitir que o usuário habilitado no SCA em uma dada Unidade Orçamentária possa ser autorizado no SAG Novo a acessar outras Unidades Orçamentárias para as quais tenha sido formalmente indicado;
- ✓ **Carga de dados:** carga automatizada de dados disponíveis em formato digital. Ex.: informações da área de recursos humanos e etapa padronizadas;
- ✓ **Aplicação do Poka Yoke (Shigeo Shingo, 1960 – Sistema Toyota de Produção):** mitigação/ eliminação de equívocos.

**Elementos-chave da estrutura do sistema**

## Exemplos práticos do Poka Yoke:

- ✓ Equipamentos plug&play
- ✓ Sistema de segurança de micro-ondas
- ✓ Bloqueio de partida por omissão do uso do cinto de segurança

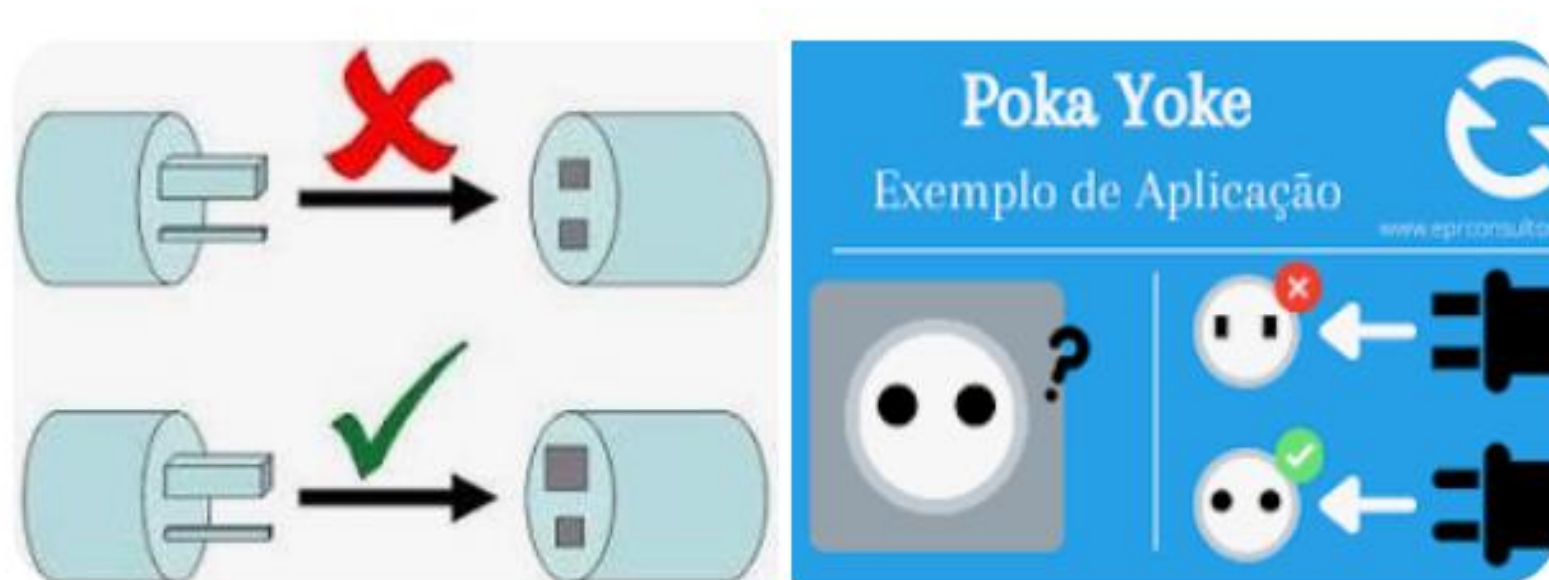

Fonte: EPR Consultoria



Fonte: Samsung Electronics




# Inovação? Inovação!

1-Inovação radical: mudanças drásticas em produtos, serviços e processos da organização, passando a atender novos usuários ou transformando o comportamento dos usuários atuais.

2-Inovação incremental: oferta de melhorias facilmente perceptíveis a curto prazo.


3-Inovação disruptiva: processo em que uma solução é substituída por uma outra superior que modifica o comportamento do usuário.

## TIPOS DE INOVAÇÃO:




Fonte: Jacoby, R., & Rodriguez, D. (2007). Innovation, growth and getting to where you want to go. Design Management Review.





**SAG NOVO**  
Elementos-chave da estrutura do sistema

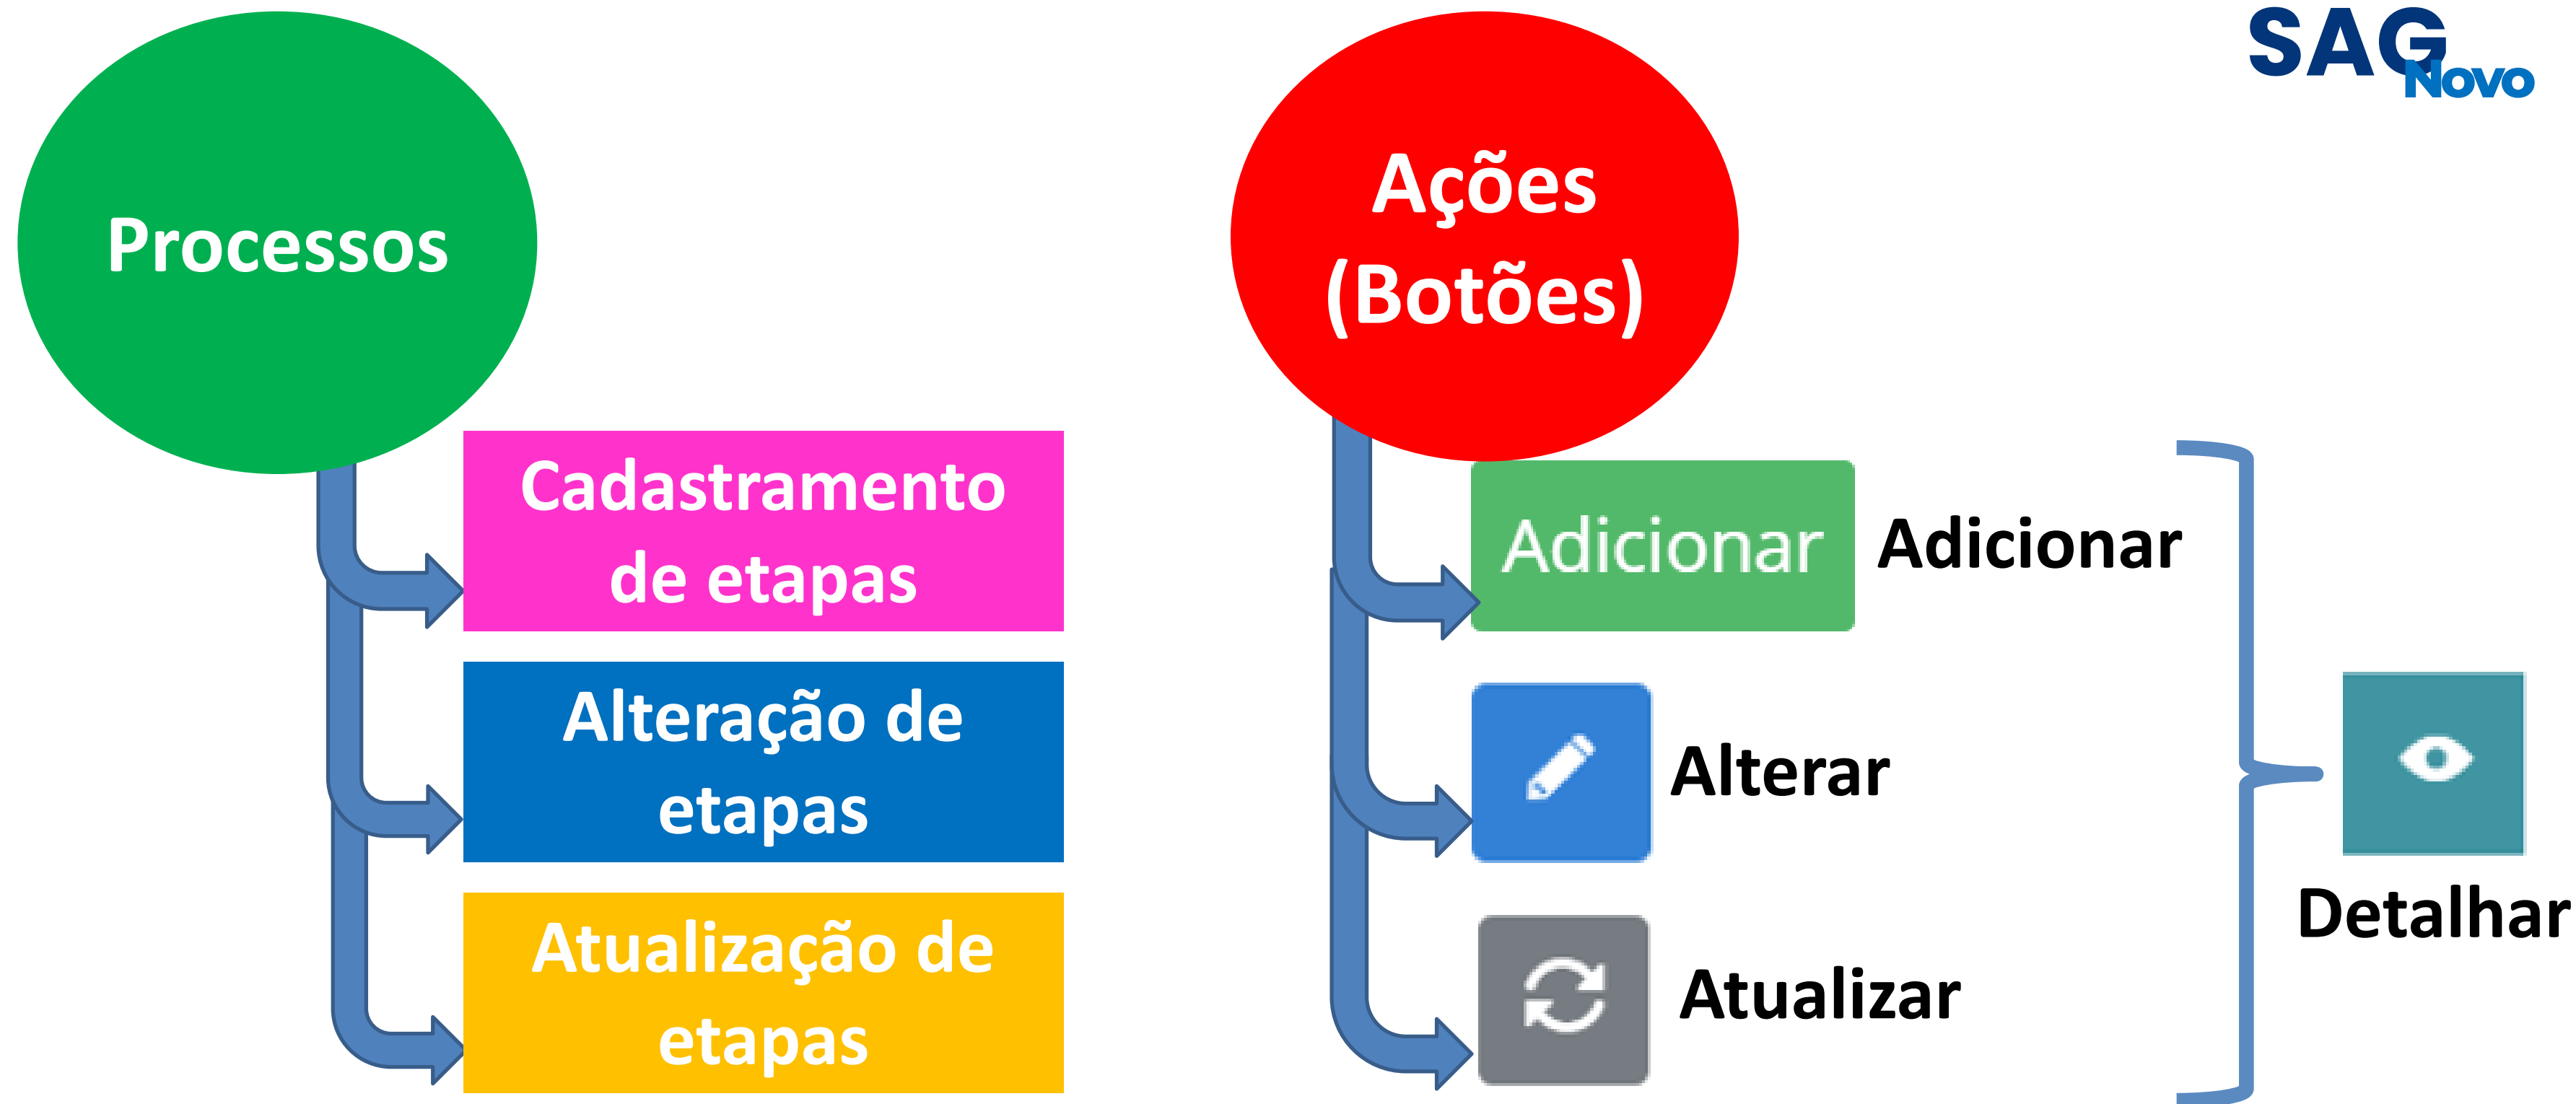

# SAG NOVO

**Aspectos técnicos e operacionais**

## SIGGO

CPF

Senha

Ano

[Trocar Senha](#)

[Esqueci minha senha](#)

**Acessar**

**SAG NOVO**

**Login: siggo.fazenda.df.gov.br**

SAG NOVO



SAG

Sistema de Acompanhamento  
Governamental

SAG NOVO

Botão: SAG



- Meus Sistemas
- Caixa de Mensagens
- SAG
- Cadastro <
- Relatórios <

SIGGO / SAG



**SIGGO 2024**

- Meus Sistemas
- Caixa de Mensagens
- SAG
- Cadastro <
- Relatórios <

SIGGO / SAG

# SAG NOVO

Tela inicial



Meus Sistemas

Caixa de Mensagens

SAG

Cadastro ▾

Manter Etapa Programada

Relatórios &lt;

SIGGO / Etapa Programada / Listar

Listar Etapa Programada

Adicionar

Exercício:

2024

Unidade Orçamentária:

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Número da Etapa:

🔍

Procedência:

Localização:

Status:

Selecione ▾

Data Início Previsão:

Data Fim Previsão:

Limpar

Pesquisar

\*Filtro Avançado

Exercício	Etapa	Programa de Trabalho	Localização	Procedência do Recurso	Data Início Previsão	Data Fim Previsão	Status	Ações
Nenhum resultado encontrado.								
Exibindo 0 até 0				1		10 ▾		Total de 0 registros

# CADASTRAMENTO de Etapas

SAG Novo

**Critérios: para quais subtítulos cadastrar etapas e quando cadastrá-las**

## Regra geral

Todos os subtítulos constantes da Lei Orçamentária Anual devem ter **ao menos uma etapa cadastrada no SAG**, observando-se o que foi planejado, **exceto** os relativos à emenda parlamentar (IDUSO=6) **sem empenho**, da seguinte forma:

### 1º Bimestre

- ✓ Programas de trabalho com **empenho** ou **execução** (física, orçamentária ou financeira);
- ✓ Etapas procedentes do ano anterior, ou seja, **projetos** que encerraram o exercício anterior nos estágios **NO, AT** ou **PA**.

### A partir do 2º Bimestre

- ✓ Novos subtítulos institucionais;
- ✓ Programas de trabalho remanescentes, **independentemente** da ocorrência de **empenho**;
- ✓ Emendas parlamentares que tiveram **empenho**.



**Incluir Etapa Programada**

[← Voltar](#)

Exercício:

2024

Unidade Orçamentária: ?

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Programa de Trabalho: ?

Produto: ?

Unidade de Medida: ?

Localização: ?

Obra ou Serviço de Engenharia: ?

Procedência da Etapa: ?

Quantidade Prevista: ?

Valor Estimado: ?

0,00

Data Início Previsão: ?

Data Fim Previsão: ?

Descrição: ?

[Incluir](#)

[Limpar](#)

**Botão Adicionar = Tela Incluir Etapa Programada**




Listar Etapa Programada

Adicionar

Exercício: 2024  
Unidade Orçamentária: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO  
Número da Etapa: 5  
Procedência:   
Localização:   
Status: Ativo  
Data Início Previsão:   
Data Fim Previsão:

Limpar Pesquisar Exportar

\*Filtro Avançado

Exercício	Etapa	Programa de Trabalho	Localização	Procedência do Recurso	Data Início Previsão	Data Fim Previsão	Status	Ações
2024	0005	15.782.6216.3054.0002	03 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01 - Institucional	01/05/2023	30/08/2023	Ativo	  

Exibindo 1 até 1 1 10 Total de 1 registros

Alterar Etapa Programada: seleção de etapa na tela Listar etapa programada

# CADASTRAMENTO de Etapas

SAG Novo

Dados de cadastramento (consultar etapas padronizadas nas Instruções)

## Dados preliminares a informar

**Unidade Orçamentária:** preencher com o código da UO.

**Programa de Trabalho:** informar subtítulo presente na LOA da UO, ou obtê-lo mediante consulta ao QDD ou a Execução Estatal.

## Dados da LOA – carga do sistema

### Não editáveis

**Produto**

**Unidade de medida**

### Editáveis

**Quantidade:** deverá ser compatível com o PPA e com a LOA.

**Regionalização:** quando possível, regionalizar.

**Valor estimado:** valor total da obra ou serviço de engenharia.

## Dados complementares a informar

**Descrição da etapa prevista na LOA:** deve ser iniciada com verbo no infinitivo e estar em consonância com os dados carregados da LOA. Exemplo: Remunerar servidores ativos da SEPLAD-DF. Caso seja uma etapa procedente do ano anterior, acrescentar o número da etapa anterior.

**Obras e serviços de Engenharia:** a ser preenchido quando se tratar de ação orçamentária do tipo projeto relativa a obras ou serviços de engenharia (elementos de despesa 51 e 39\*, respectivamente).

**Procedência do recurso:** 1-Institucional, 2-Emenda parlamentar ou 3- Parcerias”.

**Data prevista:** data de início e término de execução previstas pela Unidade Orçamentária.

(\*) O elemento de despesa 39 refere-se a serviços de terceiros em geral, podendo ou não se tratar de serviços de engenharia.

# CADASTRAMENTO

## de Etapas

SAG  
Novo

### Dados de cadastramento – Obras e Serviços de Engenharia

#### Parâmetros de liberação de opções (\*)

Somente elemento de despesa **51** (Obras);

Somente elemento de despesa **39** (Serviços executados por terceiros);

Elemento de despesa **39 e 51**, com prevalência do elemento de despesas 51 sobre o 39.

#### Tipos de obras e serviços

01-Obras no sistema de Saneamento

02-Obras de energia elétrica e iluminação pública

03-Obras de urbanização

04-Obras e edificações públicas

05-Obras para fins desportivos e de lazer

06-Obras para fins culturais

07-Obras para fins de educação

08-Obras para fins de saúde

09-Obras para fins de segurança

10-Obras para fins de assistência social

11-Obras de transporte

12-Obras para fins de segurança de trânsito

13-Obras para fins habitacionais.

14-Obras para fins de preservação do meio ambiente

15-Obras para fins de agricultura

16-Obras para fins de desenvolvimento econômico

17-Serviços de Engenharia

(\*) O elemento de despesa 39 refere-se a serviços de terceiros em geral, podendo ou não se tratar de serviços de engenharia.

# CADASTRAMENTO

## de Etapas

SAG  
Novo

### Datas de início e término previstas

#### Etapas vinculadas a PT com ação orçamentária do tipo **Atividade** ou **Operação especial**

As etapas com ação orçamentária do tipo **atividades** e **operações especiais** seguem ciclos de execução anual que acompanham o exercício fiscal. Deste modo, respeitados os critérios de cadastramento estabelecidos, a data de início e término para tais tipos de ação orçamentária devem pertencer ao exercício no qual a execução se dará e, a depender da necessidade da permanência de sua execução, serão recadastradas a cada ano. Validação: data de início < data e término, ambas pertencentes ao mesmo exercício.

#### Etapas vinculadas a PT com ação orçamentária do tipo **Projeto**

As etapas com ação orçamentária do tipo **projeto** possuem **períodos definidos de execução** que podem ou não ultrapassar o exercício.

Quando ultrapassam, a data de início prevista das etapas procedentes deverá, nos exercícios subsequentes, ser necessariamente igual à data de início prevista ou reprogramada da etapa original, ou seja, aquela informada no exercício em que foi identificada a primeira execução (execução física, execução orçamentária ou execução estatal maior que zero).

Validação: data de início < data de término, com data de início prevista igual à data de data de início prevista ou reprogramada.

Atenção: a data de início de etapas procedentes **não é reprogramável**.

**Atenção:** na vigência do período de cadastramento e atualização de etapas e do período de análise e alteração de etapas, o Agente de planejamento poderá livremente alterar as datas de início e término previstas, à exceção da data de início de etapas procedentes.

# CADASTRAMENTO **de Etapas**

**SAG**  
Novo

Parâmetros de cadastramento a omitir

## Não cadastrar

- ✓ **Número da Etapa:** preenchimento automático;
- ✓ **Diretriz de Governo:** preenchimento automático – corresponde aos Eixos Temáticos do PPA;
- ✓ **Objetivo Específico;**
- ✓ **Meta;**
- ✓ **UO anterior;** e
- ✓ **Número da Etapa Anterior.**






**Detalhar Etapa Programada**

[← Voltar](#)

<b>Etapa:</b> 0005	<b>Exercício:</b> 2024	<b>Unidade Orçamentária:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO
<b>Programa de Trabalho:</b> 15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-		
<b>Elemento de Despesa:</b> 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Produto:</b> 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	<b>Unidade de Medida:</b> 1 - UNIDADE	
<b>Localização:</b> 3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	<b>Obra ou Serviço de Engenharia:</b> 12 - Obras para fins de segurança de trânsito	
<b>Procedência da Etapa:</b> 1 - Institucional	<b>Quantidade Prevista:</b> 1	<b>Valor Estimado:</b> 1.005.000,00
<b>Data Início Previsão:</b> 01/05/2023	<b>Data Fim Previsão:</b> 30/08/2023	
<b>Unidade Orçamentária Anterior:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	<b>Nº Etapa Anterior:</b> 0082 2023	
<b>Descrição:</b> Fornecer e instalar tela metálica antiofuscante .....		



**Tela: Listar etapa programada: botão Detalhar**






Listar Etapa Programada

Adicionar

Exercício: 2024  
Unidade Orçamentária: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO  
Número da Etapa: 5  
Procedência:   
Localização:   
Status: Ativo  
Data Início Previsão:   
Data Fim Previsão:

Limpar Pesquisar Exportar

\*Filtro Avançado


Exercício	Etapa	Programa de Trabalho	Localização	Procedência do Recurso	Data Início Previsão	Data Fim Previsão	Status	Ações
2024	0005	15.782.6216.3054.0002	03 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01 - Institucional	01/05/2023	30/08/2023	Ativo	  

Exibindo 1 até 1

1 10

Total de 1 registros

Alterar Etapa Programada: seleção de etapa na lista + Botão Alterar





# Alterar Etapa Programada

[← Voltar](#)

<b>Etapa:</b> 0005	<b>Exercício:</b> 2024	<b>Unidade Orçamentária:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO
<b>Programa de Trabalho:</b> 15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-		
<b>Elemento de Despesa:</b> 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Produto:</b> 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	<b>Unidade de Medida:</b> 1 - UNIDADE	
<b>Localização:</b> 3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	<b>Obra ou Serviço de Engenharia:</b> 12 - Obras para fins de segurança de trânsito	
<b>Procedência da Etapa:</b> 1 - Institucional	<b>Quantidade Prevista:</b> 1	<b>Valor Estimado:</b> 1.005.000,00
<b>Data Início Previsão:</b> 01/05/2023	<b>Data Fim Previsão:</b> 30/08/2023	<b>Essa Etapa é Procedente?</b> <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
<b>Unidade Orçamentária Anterior:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	<b>Nº Etapa Anterior:</b> 0082 2023	
<b>Descrição:</b> Fornecer e instalar tela metálica antiofuscante .....		

[Alterar](#)



## Tela Alterar Etapa Programada

## Listar Etapa Programada

Adicionar



















Exercício: 2024 Unidade Orçamentária: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Procedência: Localização: Número da Etapa: Status: Selezione

Data Início Previsão: Data Fim Previsão:

Limpar Pesquisar Exportar

\*Filtro Avançado

Exercício	Etapa	Programa de Trabalho	Localização	Procedência do Recurso	Data Início Previsão	Data Fim Previsão	Status	Ações
2024	0001	15.451.6208.1968.0018	99 - DISTRITO FEDERAL	01 - Institucional	01/01/2023	21/12/2026	Ativo	  
2024	0002	15.451.6209.1110.0147	99 - DISTRITO FEDERAL	01 - Institucional	01/07/2022	30/12/2024	Ativo	  
2024	0003	17.512.6209.3855.0001	99 - DISTRITO FEDERAL	01 - Institucional	01/06/2023	30/12/2024	Ativo	  
2024	0004	15.451.6209.1110.0147	99 - DISTRITO FEDERAL	01 - Institucional	01/02/2022	30/12/2024	Ativo	  
2024	0005	15.782.6216.3054.0002	03 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01 - Institucional	01/05/2023	30/08/2023	Ativo	  
2024	0006	04.122.8209.8504.7003	99 - DISTRITO FEDERAL	01 - Institucional	02/02/2024	30/11/2024	Ativo	  

Exibindo 1 até 6

1 10

Total de 6 registros

Tela Listar Etapa Programada + Botão Atualizar



# Atualizar Acompanhamento da Etapa

[← Voltar](#)

<b>Etapa:</b>	<b>Exercício:</b>	<b>Período de Referência:</b>	<b>Data de Referência:</b>
0005	2024	1	18/02/2024

**Unidade Orçamentária:**

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

**Programa de Trabalho:**

15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA

**Descrição da Etapa:**

Fornecer e instalar tela metálica antiofuscante .....

**Tela Atualizar Acompanhamento da Etapa : dados gerais**

## Acompanhamento

Estágio: ?

AT - Atrasada

Etapa Realizada: ?

Obras em andamento.

365 - TÚNEL CONSTRUÍDO: [jan: 1,00; fev: 2,00;]

Execução Física: ?

Janeiro:

1,00

Fevereiro:

2,00

Março:

Abril:

Maio:

Junho:

Julho:

Agosto:

Desvio:

Causa Desvio: ?

ICO - Insuficiência de créditos orçamentários

Natureza do Desvio: ?

06 - Orçamentária

Origem do Desvio: ?

SEEC/SEFIN/SUOP

Detalhamento: ?

Decreto 99.999/2022

## Reprogramação

Data Início Previsão:

01/05/2023

Data Fim Previsão:

30/08/2023

Data Início Reprogramação: ?

Data Fim Reprogramação: ?

Atualizar

# ATUALIZAÇÃO

## de Etapas

**Execução mensal, informada bimestralmente**

Dados preliminares a informar para carga da etapa

**Unidade Orçamentária:** informar o código da UO.

**Número da etapa:** informar número da etapa a atualizar.

### Carga do sistema

**Descrição da Etapa:** carregamento automático, conforme cadastramento prévio efetuado pelo Agente de Planejamento.

**Período de Referência:** carregamento automático. Refere-se ao bimestre cujas etapas estão em cadastramento/atualização.

**Data de Referência:** carregamento automático. Refere-se ao último dia do bimestre cujas etapas estão em cadastramento/atualização.

### Dados complementares a informar

**Sigla do Estágio:** selecionar um dos seguintes estágios, conforme a situação da etapa:

SI – A ser iniciada;

NO – Andamento Normal;

NI – Não Iniciada;

CO – Concluída;

AT – Atrasada;

PA – Paralisada;

AN – Anulada

# ATUALIZAÇÃO

## de Etapas

Execução mensal, informada bimestralmente

Etapa realizada

### Execução Física

**Produto:** informar o produto vinculado ao PT/subtítulo.

**Quantitativo físico-financeira executado:** informar a quantidade de produto executada no bimestre, mediante o registro da execução nas células mensais.

#### Exemplos:

Sistema mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00].

Ação realizada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 120,00; mai: 120,00].

Servidores remunerados: [jan: 344,00; fev: 321,00; mar: 289,00; abr: 323,00; mai: 330,00; jun: 331,00].

Área urbanizada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 114.501,00] m<sup>2</sup>.

### Número do processo envolvido na execução da etapa

#### Processo único

**Exemplo:** Processo SEI nº 04033-00028941/2023-02.

#### Processo principal acrescido da indicação da existência de processos adicionais

**Exemplo:** Processo SEI nº 04033-00028941/2023-02 e outros.



# ATUALIZAÇÃO

## de Etapas

Execução mensal, informada bimestralmente  
Etapa realizada

### Informações complementares

#### Exemplo 1:

Participação de 120 servidores do DF nos Jogos Mundiais Public Agent World Games 2023, realizados na cidade de Austin, Texas – Estados Unidos, no período 26/04/2023 a 20/05/2023.

#### Exemplo 2:

Realizado no período: restauração de pavimento flexível (6.816m<sup>2</sup>) e sinalização viária (2.186m<sup>2</sup>).

Acumulado até 2023: demolições/ retiradas/ remanejamentos (107.886m<sup>2</sup>), restauração pavimento flexível (40.282m<sup>2</sup>), árvore ornamental (500unid.) e sinalização viária (4.773m<sup>2</sup>). Executado até 2023: 100% dos serviços.

Realizado em 2022: demolições/ retiradas/ remanejamentos (95.962m<sup>2</sup>), grama (8.448m<sup>2</sup>), árvore ornamental (450unid.), calçadas concreto (36.325m<sup>2</sup>), estacionamento em intertravado (17.216m<sup>2</sup>), restauração pavimento flexível (10.665m<sup>2</sup>), sinalização viária (902m<sup>2</sup>) e drenagem (2.342m).

Executado em 2022: 70,00% dos serviços.

CT.: 001/2022 (DLM VA).

# EXEMPLO

## Acompanhamento de Etapas

### Cadastramento/Alteração de etapa

#### Programa de trabalho com ação orçamentária do tipo projeto – Tela de Inclusão/Alteração

Unidade Orçamentária: 99999

Programa de Trabalho: 99.999.9999.1110.9999

Número da etapa: 0006

Descrição da etapa: Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá (Procedente da etapa nº 0008/2022).

Produto: 28-Área urbanizada

Quantidade prevista: 114.501

Unidade de medida: m<sup>2</sup>

Valor estimado: 16.044.000,00

Regionalização/localização: 7-Região VII - Paranoá

Obra ou serviço de engenharia: 3-Obra de Urbanização

Procedência do recurso: 1-Institucional

Quantidade prevista: 114.501

Valor estimado: 16.044.000,00

Datas previstas: Data de início: 01/02/2022

Data de término: 30/10/2023

# EXEMPLO

## Acompanhamento de Etapas

### Atualização

Execução mensal, informada bimestralmente

Programa de trabalho com ação orçamentária do tipo projeto – Tela de Atualização

**Unidade Orçamentária:** 99999

**Programa de trabalho:** 99.999.9999.1110.9999

**Número da etapa:** 9999

**Descrição da Etapa:** Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá (Procedente da etapa nº 0008/2022).

**Período de Referência:** 5

**Data de Referência:** 31/10/2023

**Estágio:** CO – Concluída

#### Etapa realizada

##### Execução física

Área urbanizada: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 114.501,00] m<sup>2</sup>.

##### Informações complementares

Realizado no período: restauração de pavimento flexível (6.816m<sup>2</sup>) e sinalização viária (2.186m<sup>2</sup>).

Acumulado até 2023: demolições/ retiradas/ remanejamentos (107.886m<sup>2</sup>), restauração pavimento flexível (40.282m<sup>2</sup>), árvore ornamental (500unid.) e sinalização viária (4.773m<sup>2</sup>). Executado até 2023: 100% dos serviços.

Realizado em 2022: demolições/ retiradas/ remanejamentos (95.962m<sup>2</sup>), grama (8.448m<sup>2</sup>), árvore ornamental (450unid.), calçadas concreto (36.325m<sup>2</sup>), estacionamento em intertravado (17.216m<sup>2</sup>), restauração pavimento flexível (10.665m<sup>2</sup>), sinalização viária (902m<sup>2</sup>) e drenagem (2.342m). Executado em 2022: 70,00% dos serviços.

CT.: 001/2022 (DLM VA).

##### Processo

Processo SEI nº 04033-00028941/2023-02 e outros.

# ATUALIZAÇÃO

## de Etapas

Reprogramação de datas de início e término de etapas

SAG  
Novo

### Critérios de reprogramação de etapas

- 1- Cada etapa poderá ser objeto de reprogramação apenas **uma vez ao ano**.
- 2- A **data de início** de etapas **precedentes não pode ser reprogramada**;
- 3- As datas de início e término **reprogramadas de atividades e operações especiais** devem estar restritas ao exercício de cadastramento, obedecidos os mesmos critérios de validação das datas de início e término previstas.
- 4- A única operação de reprogramação anual autorizada poderá contemplar **uma ou mais dentre as possibilidades** abaixo, desde que simultâneas:
  - a. Antecipação da data de início;
  - b. Antecipação ou postergação da data de término.

## Relatórios disponíveis

- ✓ Relatório de Etapas Programadas para Execução
- ✓ Relatório de Etapas Programadas em Desvio

## Relatórios PPO

- ✓ QDD
- ✓ Execução Estatal
- ✓ LOA

## *Importante*

- ✓ O login em 2024 permite consultas e geração de relatórios relativos a 2023

- Meus Sistemas
- Caixa de Mensagens
- SAG
- Cadastro <
- Relatórios <

SIGGO / SAG

SIGGO 2024

- Meus Sistemas
- Caixa de Mensagens
- SAG
- Cadastro <
- Relatórios <

SIGGO 2024

- Meus Sistemas
- Caixa de Mensagens
- SAG
- Cadastro ▾
- Relatórios ▾
- Relatório das Etapas Programadas em Desvio
- Relatório Etapas Programadas

SAG NOVO  
Tela inicial



### Relatório Etapas Programadas

Exercício:

Período Referência:

Estágio:

Unidade(s) Orçamentária(s)	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Unidade(s) Orçamentária(s) Seleccionada(s)	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

- Exibir somente Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA
- Exibir somente Orçamento do Anexo de Metas e Prioridades - LDO

Limpar < Gerar



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
<b>04.122.8209.8502.0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL</b>											
0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	190		3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/01/2023	31/12/2023			7 - A Ser Iniciada		8502 - Atividade
<b>04.122.8209.8504.7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL</b>											
0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	190		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2023			4 - Não Iniciada		8504 - Atividade

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio



## Relatório das Etapas Programadas em Desvio

Exercício:

2023 ▾

Período Referência:

6 ▾

Procedência Recurso:

Localização:

Causa Desvio:

Natureza Desvio:

## Unidade(s) Orçamentária(s)



## Unidade(s) Orçamentária(s) Seleccionada(s)

 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO Exibir somente Orçamento do Anexo de Metas e Prioridades - LDO Exibir somente Projeto em Andamento Exibir somente Conservação de Patrimônio

Limpar

Gerar



Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas em Desvio

6º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência	Desvio				Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Região
	Causa	Detalhamento	Natureza	Origem	Início	Término	Início	Término			
04.122.8209.8504.7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL											
0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.  1 - Institucional	IPT - Indefinição / reavaliação de projeto técnico	Pendências de engenharia	2 - Técnica	SODF	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada		99 - DISTRITO FEDERAL

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Economia**

**SAG**  
Novo

Relatório de Acompanhamento da Execução Físico-Financeira Governamental

[https://www.seplad.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2022\\_SAG-6o-Bim.pdf](https://www.seplad.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2022_SAG-6o-Bim.pdf)

LOAs

<https://www.seplad.df.gov.br/loa/>

links



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Economia**  
**Secretaria Executiva de Finanças**  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

**SAG**  
Novo



**Ed. Anexo do Palácio do Buriti**  
**10º andar, sala 1018**



[suplan@economia.df.gov.br](mailto:suplan@economia.df.gov.br)  
[unag@economia.df.gov.br](mailto:unag@economia.df.gov.br)



[valeria.pais@economia.df.gov.br](mailto:valeria.pais@economia.df.gov.br)

Auditora de Controle Interno

Product Owner



**CONTATO**
